

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	1 / 103

Revizyon İzleme Tablosu

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
01	27.06.2021	Kamuya Duyurulacak PKP
02	28.05.2022	Muhtar ve Hane halkı Anketleri
03	03.08.2022	İçerikte güncelleme yapılmıştır.
04	29.08.2022	Genel güncelleme yapılmıştır.
05	22.02.2023	Eklerde genel güncelleme ve iletişim numaraları.
06	13.03.2023	Eklerde genel güncelleme yapılmıştır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Hazırlayan : Çevre ve Sosyal İşler Müdürü Reyhan EYRİCE YILDIRIM
Kontrol Eden : Yönetim Sistemleri Şefi Güneş ÇAVUŞ
Bölüm Onayı : Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Müdürü Ufuk Yaşar ODABAŞI

Onaylayan
Genel Müdür
Serhat YAĞCI

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	2 / 103

İçindekiler

1. AMAÇ	4
2. KAPSAM	4
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR	4
4. YETKİ VE SORUMLULUK	5
4.1. İşveren Sorumlulukları	5
4.2. ANİYHT (Yüklenici) Sorumlulukları	6
5. UYGULAMA	6
5.1. Yönetici Özeti	6
5.2. Giriş	13
5.2.1. Demiryolu Güzergahı	15
5.2.1.1. Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerleri	17
5.2.1.2. Arazi Edinimi	22
5.2.2. Proje Tesisleri ve Faaliyetleri	23
5.2.3. İşgücü	26
5.2.4. Tahmini Yolcu Sayısı	27
5.2.5. Proje Takvimi	27
5.3. Yönetmelikler ve Gerekliklikler	28
5.3.1. Ulusal Mevzuat	28
5.3.1.1. T.C. Anayasası	28
5.3.1.2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 sayılı Kanun, 2003)	29
5.3.1.3. Dilekçe Hakkının Kullanımıyla ilgili Kanun (3071 sayılı Kanun, 1984)	29
5.3.1.4. Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı Kanun, 1983)	29
5.3.1.5. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği	30
5.3.2. Uluslararası ÇS Standartları ve Kılavuzları	32
5.3.2.1. Ekvator Prensipleri 4 (2020)	32
5.3.2.2. Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Ç&S Sürdürülebilirliği Politikası ve Performans Standartları (2012)	33
5.3.2.2.1. IFC'nin COVID-19 Bağlamında Güvenli Paydaş Katılımı Konusunda IFC Müşterilerine Yönelik Ara Bilgilendirmesi (Mayıs 2020)	34
5.3.2.3. OECD Ortak Yaklaşımlar (2016)	34
5.3.2.4. UK Export Finance Çevre, Sosyal ve İnsan Hakları Politikası	35
5.4. Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özet Bilgileri	36
5.4.1. ÇSED Öncesi Aşama	36
5.4.2. ÇSED Dönemi	39
5.5. Proje Paydaşları	44
5.6. Paydaş Katılım Programı	50
5.6.1. ÇSED Bilgilendirme Aşaması	50
5.6.2. ÇSED Sonrası Aşaması	51
5.7. Kaynaklar ve Sorumluluklar	56
5.8. Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması	60
5.8.1. Talep Yönetim Mekanizması	61
5.8.2. Proje Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması	61

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	3 / 103

5.8.3. Çalışan Şikayet (İç Paydaş) ve Geri Bildirim Mekanizması	67
5.8.4. ÇSED ve YYEP Anketleri Sırasında Topluluklar Tarafından İleri Sürülen Geriye Dönük Konular/Endişeler.....	71
5.9. İzleme ve Raporlama	74
5.10. Paydaşlar için İletişim Bilgileri	77
6. İLGİLİ DOKÜMANTE BİLGİLER.....	78
Ek A Proje ile İlgili Arsa Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerlerinin Listesi.....	79
Ek B İnşaat Çalışmaları Öncesi Etkilenen Yerleşim Yerlerinde Yapılmış Proje Bilgilendirme Toplantıları	87
Ek C Örnek Toplantı Kayıt Formu	89
Ek D Paydaş İstişare Kayıt Formu	90
Ek E Dış Paydaş Şikayet ve Geri Bildirim Formu	91
Ek F Çalışan (İç Paydaş) Şikayet ve Geri Bildirim Kapatma Formu	93
Ek G Talep Yönetim Adımları	95
Ek İ Proje Bilgilendirme Broşürü	99
Ek J Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Fotoğrafları ve Şikayet Mekanizması Bilgilendirme Afış Asılması	101
EK K Fotoğraflar ve HİU'ların İletişim Bilgilerinin Duyurulması/Şikayet Süreci Bilgi Posterleri.....	102

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	4 / 103

1. AMAÇ

Bu planın nihai amacı, ANİYHT projesi ile yerel topluluklar, diğer paydaşlar ve ilgili gruplar arasında çevresel ve sosyal etkilerin başarılı yönetimi için gerekli olan yapıcı diyalogu kurmak ve sürdürmektir.

2. KAPSAM

PKP, Projenin paydaşlarla katılımı için bir yol haritası sağlar ve şeffaf, kapsayıcı, duyarlı ve iş birliğine dayalı bir şekilde proje hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. PKP ayrıca, projenin potansiyel ve gerçekleşen etkilerini ve paydaşların projeye ilgili endişelerini belirleyerek, bu etki ve endişelerin etkin çözümünü kolaylaştırarak ÇSED ve proje yönetimine katkıda bulunur.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Proje PKP, temel olarak;

- Projeden doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilenen veya Proje üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi/etkisi olan tüm paydaşları (bireyler, gruplar veya kuruluşlar) tanımlar.
- Nihai amaç, halka danışma ve bilgi paylaşımı yoluyla yapıcı bir ilişki kurmak ve sürdürmek amacıyla, Projenin ömrü boyunca her bir paydaş grubuyla uygun katılım için mekanizmalar ve araçlar tanımlamaktır.
- Şikayetlerin ve alınan geri bildirimlerin yönetimi için eylemlerin zamanında ve uygun şekilde uygulanmasını sağlayacak dış ve iç mekanizmalar kurar.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

ADHOMP	Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Planı
ANİYHT	Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi
AYGM	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
CİMER	Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
ÇED	Çevresel Etki Değerlendirme
Ç&S	Çevresel ve Sosyal
ÇSED	Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
ÇSEP	Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
ÇSG	Çevre, Sağlık ve Güvenlik
ÇSİH	Çevre ve Sosyal İnsan Hakları Politikaları
ÇSİM	Çevre ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ÇSYİÇP	Çevre ve Sosyal Yönetim ve İzleme Çerçeve Planı
ÇSYS	Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
ÇŞB	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DLH	Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü (1 Kasım 2011 tarihi itibarıyla AYGM adı altında yeniden yapılandırılmıştır)
DSİ	Devlet Su İşleri
EBRD	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
ECA	İhraç Kredisi Kuruluşu
EP	Ekvator Prensipleri

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	5 / 103

ERG İnşaat

FC

GEM

HHA

HİU

IESC

IFC

İK

İşletmeci

İşveren

KGKKM

KPI

OECD

OEKB

OG

PEK

PKP

PS

PTD

PY

SACE

SEÇ

SERV

SSB

STK

TCDD

TDA

TOÖ

UAB

UK

UKEF

WBG

YHT

YP

Yüklenicinin Adı

YYEP

YYPÇ

ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Mali Kapanış

GEM Sürdürülebilirlik Servisi ve Danışmanlık Şirketi

Hane Halkı Anketi

Halkla İlişkiler Uzmanı

Bağımsız ÇS Danışmanı

Uluslararası Finans Kurumu

İnsan Kaynakları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Müdürlüğü

Anahtar Performans Göstergesi

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü

Oesterreichische Kontrollbank AG

Ortak Girişim

Projeden Etkilenen Kişiler

Paydaş Katılım Planı

Performans Standartları

Proje Tanımlama Dosyası

Proje Yöneticisi

SACE Simerst

Sağlık Emniyet Çevre

Swiss Export Risk Insurance

Sauerwein & Schaefer Bau AG

Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Topluluk Düzeyinde Anket

Teknik Olmayan Özet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Birleşik Krallık

UK Export Finance

Dünya Bankası Grubu

Yüksek Hızlı Tren

Yönetim Planı

Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı

Yeniden Yerleşim Eylem Planı

Yeniden Yerleştirme Politikası Çerçevesi

**KONTROLLÜ
KOPYA**

4. YETKİ VE SORUMLULUK

4.1. İşveren Sorumlulukları

- Yüklenici ile ilişkili süreçler için ilgili koordinasyonu sağlamak,
- Gerekmesi durumunda, AYGM Halkla İlişkiler Birimi ile Şikâyet Yönetimi Süreçleri dahil tüm ilgili tarafların gerek yazılı gerek sözlü bildirimlerini almak, yorumlayarak belli süzgeçlerden geçirip; ilgili konuları PY ile paylaşmak,
- Paydaş şikayetleri ile ilgili acil aksiyon alınması gerektiğinde, ilgili kurumlar aracılığıyla hızlı aksiyon, önlem ve tedbirleri almak, aldirmek,

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	6 / 103

- Konu ile ilgili gerekmesi durumunda iş emri talimatını yazılı olarak yükleniciye bildirmek,
- İlgili kurum ve kuruluşlara durum bildirimini yapmak, ilgili birimlerden destek almak. (Halkla İlişkiler, vs.)

4.2. ANİYHT (Yüklenici) Sorumlulukları

Proje Yönetimi (PY), Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Müdürlüğü (KGKKM), İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Taşeron Yönetim Müdürlüğü, Çevre ve Sosyal İşler Müdürlüğü (ÇSİM), Şantiye Şefliği, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü sorumluluğundadır.

- Paydaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi Prosedürü'nü etkin yönetmek,
- Öneri ve Şikayet Takip Formu aracılığıyla gelen şikayetleri doğru ilgililere yönlendirmek, sürecin başından sonuna kadar yönetimini sağlamak,
- Proje yönetimi ve ilgili bölümler ile koordinasyonu sağlamak,
- Paydaş şikayetleri ile ilgili acil aksiyon alınması gerektiğinde, proje yönetimi koordinasyonunda, ilgili bölümler aracılığıyla hızlı aksiyon, önlem ve tedbirleri almak, aldirmek,
- Çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak,
- Gerekli hallerde ekibi toplantıya çağırarak,
- Paydaş şikayetlerini aylık olarak raporlamak,
- Şikayetleri iyileştirme ve azaltılması adına gerekli durumda aksiyonları almak.

5. UYGULAMA

5.1. Yönetici Özeti



Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi (bundan böyle Ankara-İzmir YHT Projesi, ANİYHT Projesi veya Proje olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün (AYGM¹) Türkiye'nin başkenti Ankara'yı üçüncü büyük şehir olan (nüfusça) İzmir'e bağlayan önemli bir ulusal ulaşım projesidir.

Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı (Yüklenici), ERG International UK Ltd., ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ERG İnşaat) ve SSB Sauerwein & Schaefer Bau AG (SSB) olmak üzere üç kardeş şirketten oluşan bir ortak girişimdir (OG) (ERG Grup Ortaklığı veya Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı veya ERG OG). Yüklenici, AYGM'nin Ankara-İzmir YHT Hattının Yapım Sözleşmesi (FIDIC Kırmızı Kitap 1999 1. Basım) + Finans modeli ("Yapım Sözleşmesi") Şartları uyarınca yapılması işi (altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon, yapı işleri dahil) için açtığı ihaleyi kazanmıştır. Projenin yatırım maliyeti 2,16 milyar avro tutarındadır.

¹ Eski Demiryolları, Limanlar ve Havalimanları (DLH) İnşaat Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihi itibarıyla Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü – AYGM adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	7 / 103


Ankara'dan (Polatlı ilçesi) İzmir'e (Menemen ilçesi) kadar YHT güzergâhının tamamı toplam 503,2 km uzunluğunda olup, dört (4) kesimden oluşmaktadır. Projede Ankara-İzmir YHT Hattını diğer YHT Hatlarına veya konvansiyonel hatlara bağlayacak ek hatlar da bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, ERG OG'nin Yapım Sözleşmesi dışında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) muhtelif zamanlarda yaptığı farklı sözleşmeler kapsamında Kesim 3a, Kesim 3b, Kesim 4a ve Kesim 4d'de (tabloda tanımlandığı gibi) devam eden altyapı işlerini yürüten başka taraflar bulunmaktadır. Altyapı işlerinin diğer yükleniciler tarafından tamamlanmasının ardından bu hat kesimleri, YHT güzergâhı boyunca üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve bina/tesis işlerinin yürütülmesi için İşveren tarafından Yükleniciye (ERG OG) teslim edilecektir (bkz. Şekil 1).

Sorumluluk							
Kesim	Alt Kesim	Başlangıç KM	Bitiş KM	Hat Kesimi Toplam Uzunluğu (km)	Alt Kesim Uzunluğu (km)	Altyapı	Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Binalar, Tesisler
Kesim 1	-	Polatlı-Afyon	0+000.000	151+500.000	151,2	151,2	Yüklenici (ERG OG)
Kesim 2	(2a)	Afyon-Hatıpler Geçidi	151+500.000	230+370.612	90,3	78,8	Yüklenici (ERG OG)
	(2b)	Hatıpler Geçidi	267+156.053	278+632.464		11,5	Yüklenici (ERG OG)
Kesim 3	(3a)	Banaz-Esme	279+000.000	364+600.000	159,9	85,6	AGA Enerji (altyapı çalışmaları devam ediyor)
	(3b)	Esme-Salihli	364+600.000	438+918.726		74,3	Bayburt Grup + Kolin OG ² (altyapı çalışmaları devam ediyor)
Kesim 4	(4a)	Salihli-Manisa	439+000.000	456+500.000	101,8	17,5	NAS+ Budakyol OG (altyapı çalışmaları devam ediyor)
	(4b)		456+500.000	501+000.000		44,5	Yüklenici (ERG OG)
	(4c)	Manisa Kuzey Geçidi	501+000.000	514+983.302		14,0	Yüklenici (ERG OG)
	(4d)	Manisa- Menemen	522+100.000	547+805.481		25,8	AGA Enerji (altyapı çalışmaları devam ediyor)
Toplam				503,2	503,2		

² OG, başlangıçta Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kolin İnş.Tur. San. ve Tic. A.Ş., Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş., Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Bayburt Grup İnş. Nak. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. olarak kurulmuş olup, Proje sürecinde Bayburt Grup ve Kolin OG'ye devredileceği bildirilmiştir.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	8 / 103

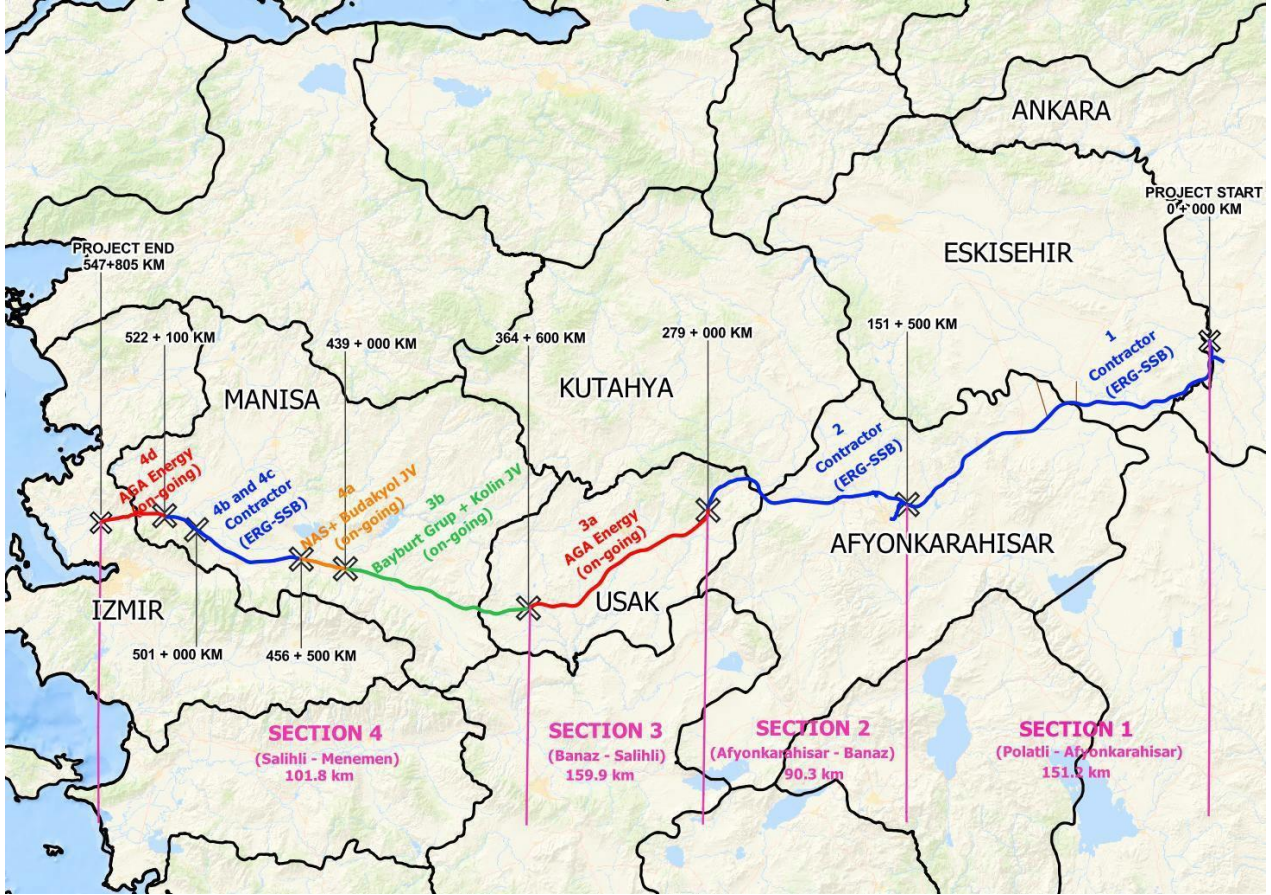


Şekil 1. Proje Yerleşim Planı ve Altyapı İşlerinden Sorumlu Taraflara (ERG Ortak Girişimi ve Diğer Yükleniciler) Göre Proje Kesimlerinin Dağılımı

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	9 / 103

FIDIC sözleşme modeli aşağıdaki gibi basitleştirilmiş bir şekilde sunulmuştur:

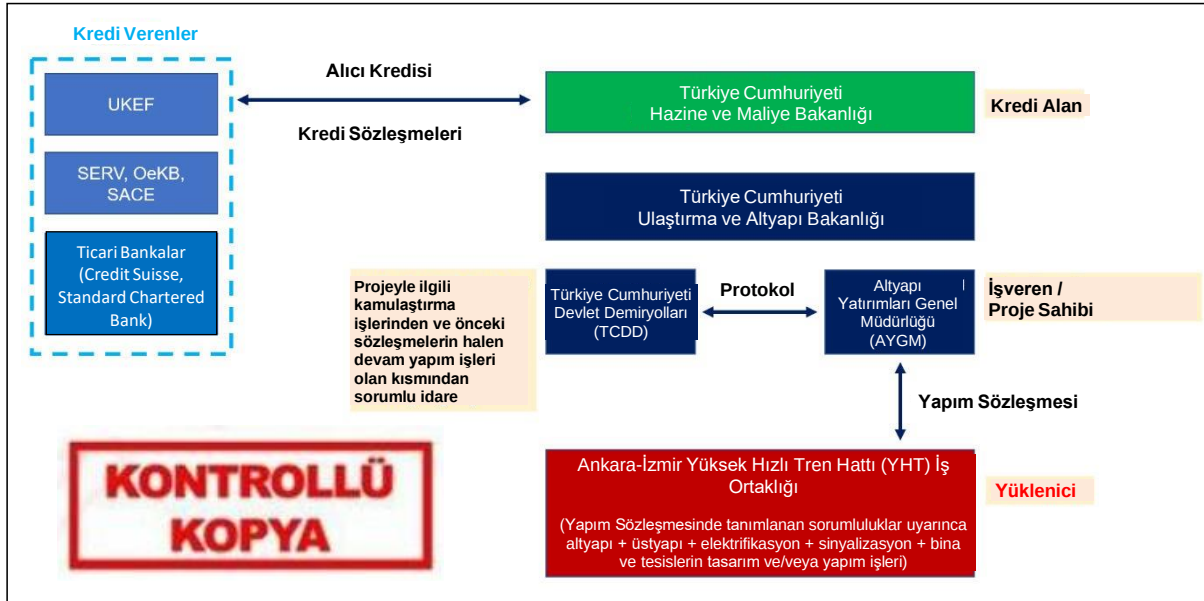

Projenin Yapım Sözleşmesi Yüklenici ile AYGM arasında 23 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır. Yapım Sözleşmesinin başlaması, diğer hususların yanı sıra, Finansal Kapanışa (FC) bağlıdır. Yapım Sözleşmesine göre işlerin tamamlanması için toplam süre 42 aydır. Yüklenicinin sorumluluğu, Projenin Proje Sahibi (İşveren) tarafından geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl daha sürer (kusur sorumluluk süresi). Kredi Süresi, İşveren tarafından Devir Teslim Belgesinin düzenlenmesini takiben yaklaşık 14 yıl boyunca devam eder.

Ankara-İzmir YHT inşaatı tamamlandıktan sonra, işletme aşaması için, demiryolu aşamalı olarak işletmeye alınacak ve ilgili tüm bileşenler ve altyapı ile AYGM tarafından UAB'nin bağlı kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD)³ (bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır) devredilecektir. İşletme ve bakım faaliyetlerinin ayrıntılı planlaması, İşveren ve İşletmeci tarafından kendi kurumsal sistemleri ve mekanizmaları ile tutarlı olarak zamanında yapılacaktır.

29 Haziran 2020 tarihinde, TCDD'nin merkezi ve yerel kuruluşları, il valilikleri ve Projede görev alan yükleniciler ve alt yükleniciler de dahil olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarının, Projeyle ilgili tüm süreçlere (örneğin Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin vb.) herhangi bir kesinti olmaksızın yeterince öncelik vermesini gerektiren bir Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

³ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Proje den sorumlu olmuştur. Özellikle Projenin belirli bölümlerindeki altyapı inşaat işleri TCDD tarafından ihale edilmiş ve şu anda (Mart 2021 itibarıyla) Projenin bazı bölümlerindeki inşaat işleri bu sözleşmeler kapsamında devam etmektedir. Ayrıca Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) gereği Proje için yapılan kamulaştırma işlemlerinden TCDD sorumlu olmuştur. Gelecekteki kamulaştırma işlerinin sorumluluğu AYG ve TCDD arasında dahili olarak açıklığa kavuşturulacaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	10 / 103

Ankara-İzmir YHT Hattı, İç Anadolu Bölgesini Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir olmak üzere yedi (7) ilden geçerek Ege Bölgesine bağlayacaktır.

Toplam uzunluğu 503,2 km olan YHT hattı aşağıdaki dört (4) kesimden oluşmaktadır:

- Kesim 1: Polatlı (Ankara)-Afyonkarahisar
- Kesim 2: Afyonkarahisar-Banaz (Uşak)
- Kesim 3: Banaz (Uşak)-Salihli (Manisa)
- Kesim 4: Salihli (Manisa)-Menemen (İZMİR)



Kesim 1 ve Kesim 2'nin inşaat işleri ilk olarak 2012 - 2016 yılları arasında başlamıştır. Sonrasında 2018 yılında yüklenicilerin bu kesimlerdeki inşaat (altyapı) işleri askıya alınmıştır. 2021 yılı ikinci çeyreği itibariyle, Kesim 3a (Banaz-Eşme), Kesim 3b (Eşme-Salihli), Kesim 4a (Salihli-Manisa hattının KM 439+000 ile 456+500 arasındaki başlangıç bölümü) ve Kesim 4b'deki (KM 522+100 ile 547+805 arasındaki Manisa-Menemen kesimi) inşaat (altyapı) işleri, ulusal mevzuatın gereklilikleri uyarınca daha önce TCDD'nin sözleşme akdettiği diğer yüklenicilerin uhdesinde devam etmektedir.

Yüklenicinin Yapım Sözleşmesi çerçevesindeki iş kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

- Tüneller, köprüler, viyadükler ve menfezler dahil olmak üzere Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 4'teki (Manisa- Menemen hariç) eksik altyapı çalışmalarının tamamlanması.
- Kesim 1'den Kesim 4'e kadar olan güzergah boyunca üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinin tamamı

Projenin finansmanı, UK Export Finance kurumundan (Birleşik Krallık resmi İhracat Kredi Kurumu (ECA)) alınan bir Alıcı Kredisi ile birlikte SERV, OeKB ve SACE'den alınan bir miktar reasürans ile desteklenmektedir. Kredileri sağlayan ticari bankalar Credit Suisse ve Standard Chartered Bank'tır. Bu birleşik finansman tarafları bundan böyle "Kredi Verenler" olarak ifade edilecektir.

Bankaların çevresel ve sosyal (Ç&S) gerekliliklerini karşılamak için, GEM Sürdürülebilirlik Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. (GEM), uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar ve aşağıdaki uluslararası standartlar dahil olmak üzere ulusal çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) mevzuatı doğrultusunda bir Ç&S Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması yapmak üzere Yüklenici tarafından tutulmuştur:

- Ekvator Prensipleri (EP) 4 (2020)
- Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ortak Yaklaşımları (2016)
- UK Export Finance Çevre, Sosyal ve İnsan Hakları Politikası
- Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (PS) (2012)
- IFC/Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İşçilerin Konaklaması: Süreçler ve Standartlar (2009)

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	11 / 103

- Dünya Bankası Grubu (WBG) Genel ÇSG Kılavuzları (2007)
- WBG ÇSG Demiryolu Kılavuzları (2007)
- Yapı Malzemeleri Çıkarma için WBG ÇSG Kılavuzu (2007)

Proje için 2005 yılında ulusal bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması yapılmış ve Mart 2006'da ÇED Olumlu Kararı alınmıştır.

Uluslararası Ç&S standartları doğrultusunda, Proje "Kategori A" olarak kabul edilmektedir ve ÇSED çalışması aşağıdaki çıktıları içerecek şekilde tasarlanmıştır:

- Boşluk Analizi ve Kapsamı
- Aşağıdakileri içeren ÇSED Bilgilendirme Paketi:

- ÇSED Raporu
- Paydaş Katılım Planı (PKP) (bu plan)
- Teknik Olmayan Özet (TOÖ)
- Proje Çevre ve Sosyal Yönetim ve İzleme Çerçeve Planı (ÇSYİÇP) (İşverenin (AYGM), İşletmecinin (TCDD) ve Yüklenicinin İşveren/İşletmeci ve Yüklenici arasında kararlaştırılacak yapım ve işletme aşaması Ç&S konularının yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlendiği doküman)



ÇSED Bilgilendirme Paketi gözden geçirilmiş ve ÇSEP Eylem Planı (ÇSEP), Kredi Verenler adına hareket eden Bağımsız Ç&G Danışmanı (IESC) tarafından hazırlanmıştır.

ÇSED Bilgilendirme Paketi, Yüklenici (İşveren adına) ve Kredi Verenler tarafından kamuya açıklanmıştır. Uluslararası standartların ilgili gereklilikleri uyarınca, TOÖ ve PKP de uygun açıklama yöntemleri kullanılarak Türkçe dilinde açıklanmıştır.

Mevcut durumda 3a, 3b, 4a ve 4d Hat Kesimlerindeki altyapı çalışmaları, TCDD tarafından atanan üç farklı yüklenicinin uhdesinde yürürlükteki ulusal mevzuat doğrultusunda devam ettiğinden, Projenin bu kesimlerinin üstyapı işleri için Yükleniciye (ERG OG) teslim edileceği zaman IFC Performans Standartlarına (2012) uygun şekilde bir Ç&S Denetimi⁴ yapılacaktır. Bu denetimi takiben, Projenin söz konusu kesimleri için bir Yönetim ve Düzeltici Faaliyet Planı geliştirilip uygulanacaktır.

Bu Paydaş Katılım Planı (PKP), ÇSED ekibi tarafından yürütülen kapsamlı sosyal araştırmalara ve Genel Proje Yönetim Ekibinden ilgili makamlar ve diğer paydaşlarla yapılan etkileşim hakkında alınan bilgi ve belgelere (örn. resmi yazışmalar) ve ayrıca 2013 yılına kadar uzanan arazi edinimi sürecinde geçmiş paydaş katılım faaliyetlerine ilişkin belge/bilgilere ve 2006 yılında tamamlanan ulusal ÇED

⁴ Bu Ç&S Denetimi, IFC GN30 hedefleri doğrultusunda tasarlanıp uygulanacaktır. Buna göre, Ç&S Denetimi Kesim 3 ile Kesim 4a ve 4d'deki bekleyen/devam eden/geriye dönük konuları, etkileri, riskleri ve/veya şikayetleri ofis çalışması ve saha etütleri yaparak belirleyecek ve uygulanması gereken yönetsel önlemleri veya düzeltici faaliyetleri tanımlayacaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	12 / 103

çalışmasına dayanarak ÇSED sürecinin bir parçası olarak bağımsız bir Proje belgesi olarak hazırlanmıştır.

Bu PKP'nin nihai amacı, YHT projesi ile yerel topluluklar, diğer paydaşlar ve çevresel ve sosyal etkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan ilgili gruplar arasında yapıcı bir diyalog kurmak ve sürdürmektir. Yüklenici, Projenin inşaat aşaması boyunca PKP'nin uygulanmasında İşverene yardımcı olacak ve İşveren ile iş birliği yapacaktır. Projenin işletme aşamasında PKP'nin uygulanması, İşverenin/İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır.

PKP, Projenin paydaşlarla etkileşimi için bir yol haritası sağlar ve şeffaf, kapsayıcı, duyarlı ve işbirlikçi bir şekilde proje hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunur. PKP ayrıca, projenin ve paydaşların proje hakkındaki endişelerinin potansiyel ve gerçekleşen etkilerini belirleyerek, ÇSED'e katkıda bulunacak ve böylece bu etkilerin ve endişelerin etkili bir şekilde çözümünü kolaylaştıracaktır.

Proje PKP, diğer hususların yanı sıra:

- Projeden doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilenen veya Proje üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi olan tüm paydaşları (bireyler, gruplar veya kuruluşlar) tanımlar.
- Halk ile istişare ve halkı bilgilendirme yoluyla yapıcı ilişki kurmak ve sürdürmek nihai amacı ile, Proje ömrü boyunca her bir paydaş grubu ile uygun katılım için mekanizmaları ve araçları tanımlar.
- Alınan şikayet ve geri bildirimlerin yönetimi için eylemlerin zamanında ve uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacak dış ve iç mekanizmalar oluşturur.

PKP şu şekilde yapılandırılmıştır:

- Proje Tanımı
- Yönetmelikler ve Koşullar
- Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özet Bilgileri
- Proje Paydaşları
- Paydaş Katılım Programı
- Kaynaklar ve Sorumluluklar
- Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması
- Talep Yönetim Mekanizması
- İzleme ve Raporlama
- Paydaşlar için İletişim Bilgileri
- Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerlerinin Listesi
- Örnek Paydaş Katılım Kayıt Listesi
- Kurumsal Paydaş Katılım Formu
- Proje Şikayet ve Geri Bildirim Formu

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	13 / 103

- Çalışan Şikayet (İç Paydaş) ve Geri Bildirim Formu
- Örnek Şikayet ve Geri Bildirim Kayıt Listesi

5.2. Giriş

Proje ilk olarak 2004 E 010 010 numaralı Proje ile 2004 Yılı Yatırım Programı kapsamında Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaat Genel Müdürlüğü (1 Kasım 2011 itibarıyla Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü – AYGM veya İdare – adı altında yeniden yapılandırılmıştır) tarafından planlanmıştır. 2021 yılı Yıllık Yatırım Programında Proje, ayrı ayrı AYGM'nin (Proje no: 2020E01-154316; 2020-2025) ve TCDD'nin (Proje No: 2007E01-154124; 2007-2023) yatırım listelerine alınmıştır.

Proje, 2006 yılında yürürlükte olan ulusal ÇED Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporuna sahiptir. Projenin kamulaştırma koridoru⁵ içerisinde yer alan parsellerin kamulaştırılması 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (Kanun) uyarınca çoğunlukla Proje güzergahı boyunca Proje ile ilgili kamulaştırmadan sorumlu devlet kurumu (TCDD) tarafından tamamlanmıştır. Güzergah yerinin değiştirilmesi düşünülen sahalar (Afyonkarahisar-Bayat ilçesi, Hatipler köyü yakınlarındaki Hatipler geçidi) için kamulaştırma işleminin henüz kesinleşmediği sahalar (örneğin Manisa Kuzey Geçidi ve Ankara-Konya YHT bağlantısına karşılık gelen yerleşim yerleri ve güzergahın diğer kısımları boyunca bazı ilave⁶ yerleşim yerleri vb.) ve ocaklar, malzeme temin sahaları, kamp alanları, enerji iletim altyapısı vb. gibi saha dışı/ilişkili Proje tesislerine karşılık gelen parsellerin/arazi kullanım haklarının edinimi Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) gereği devlet tarafından ayrıca tamamlanacaktır.

Projenin önemli ara hedeflerinden bazıları Şekil 1'de gösterilmektedir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Proje, zayıf ray bağlantısı ve çevresel alternatif ulaşım yollarının eksikliğini ele alarak bölgedeki ulaşım sisteminin verimliliğini ve yeterliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Karayolu trafik sıkışıklığını hafifletmek ve İzmir'de turizmi ve şehirlerarası iş ve büyüme fırsatlarını güvenli ve iyileştirilmiş bir gidiş geliş hizmetiyle desteklemek için sosyoekonomik gelişmeyi teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. YHT, halihazırda konvansiyonel trenlerde kullanılan daha yüksek bir kirletici olan dizel yakıtın ithalatının azaltılmasından dolayı ülkeye sağlam para tasarrufu sağlayan elektrikli ve düşük karbonlu bir alternatif olarak ayrıca avantaj sağlar.

Bu hat Ankara'yı Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar ile bölgesel/şehirlerarası bağlantının yanı sıra cazip bir turizm destinasyonu olan İzmir'e yaklaştırmak için özellikle önemlidir. Tamamlandığında YHT seyahat süresi, mevcut dolaylı demiryolu güzergahlarıyla süren 14 saatten yaklaşık üç buçuk saate düşürülecektir. Ankara-İzmir arası karayolu ile 587 km olup, seyahat süresi yaklaşık 9 saattir.

⁵ YHT için kamulaştırma koridoru, YHT güzergahı boyunca en az 30 metre genişliğe sahiptir. Kamulaştırma genişliği, kazı ve dolgu alanlarının tasarımına, istasyonların yerleşim alanı vb. dayalı olarak 100 metreye kadar genişletilmiştir.

⁶ Yüklenici tarafından Mart 2021'de sağlanan Kamulaştırma Güzergahına göre bu, Afyonkarahisar, Merkez'de (Kesim 1) dört yerleşim yerini, Uşak, Banaz'da (Kesim 2) bir yerleşim yerini ve Manisa, Şehzadeler'de (Bölüm 4) üç yerleşim yerini içermektedir.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	14 / 103


Havaalanı transferleri ile Ankara-İzmir arası operasyon ve bekleme süresi uçak yolculuğu yaklaşık üç buçuk saattir. YHT seyahat süresindeki ciddi düşüş, iki şehir arasında seyahat ederken YHT'yi en iyi seçenek haline getirecektir.

Mevcut ulusal yüksek hızlı demiryolu ana planının son aşaması olan Ankara-İzmir YHT Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) için bir önceliktir. YHT, saat başına karayolu ve havayolunun toplamından çok daha fazla yolcuyla çok daha az maliyetle sağlar. Yolcular, hedeflerine hızlı, verimli ve zamanında ulaşacaklardır. Tek bir YHT hattı, 10 şeritli bir karayolunun eşdeğerini taşıyabilir, çok daha düşük maliyetle inşa edilebilir, işletmesi daha ucuzdur ve enerjinin bir kısmını geleneksel fosil yakıtlardan değil elektrikten kullanır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	15 / 103

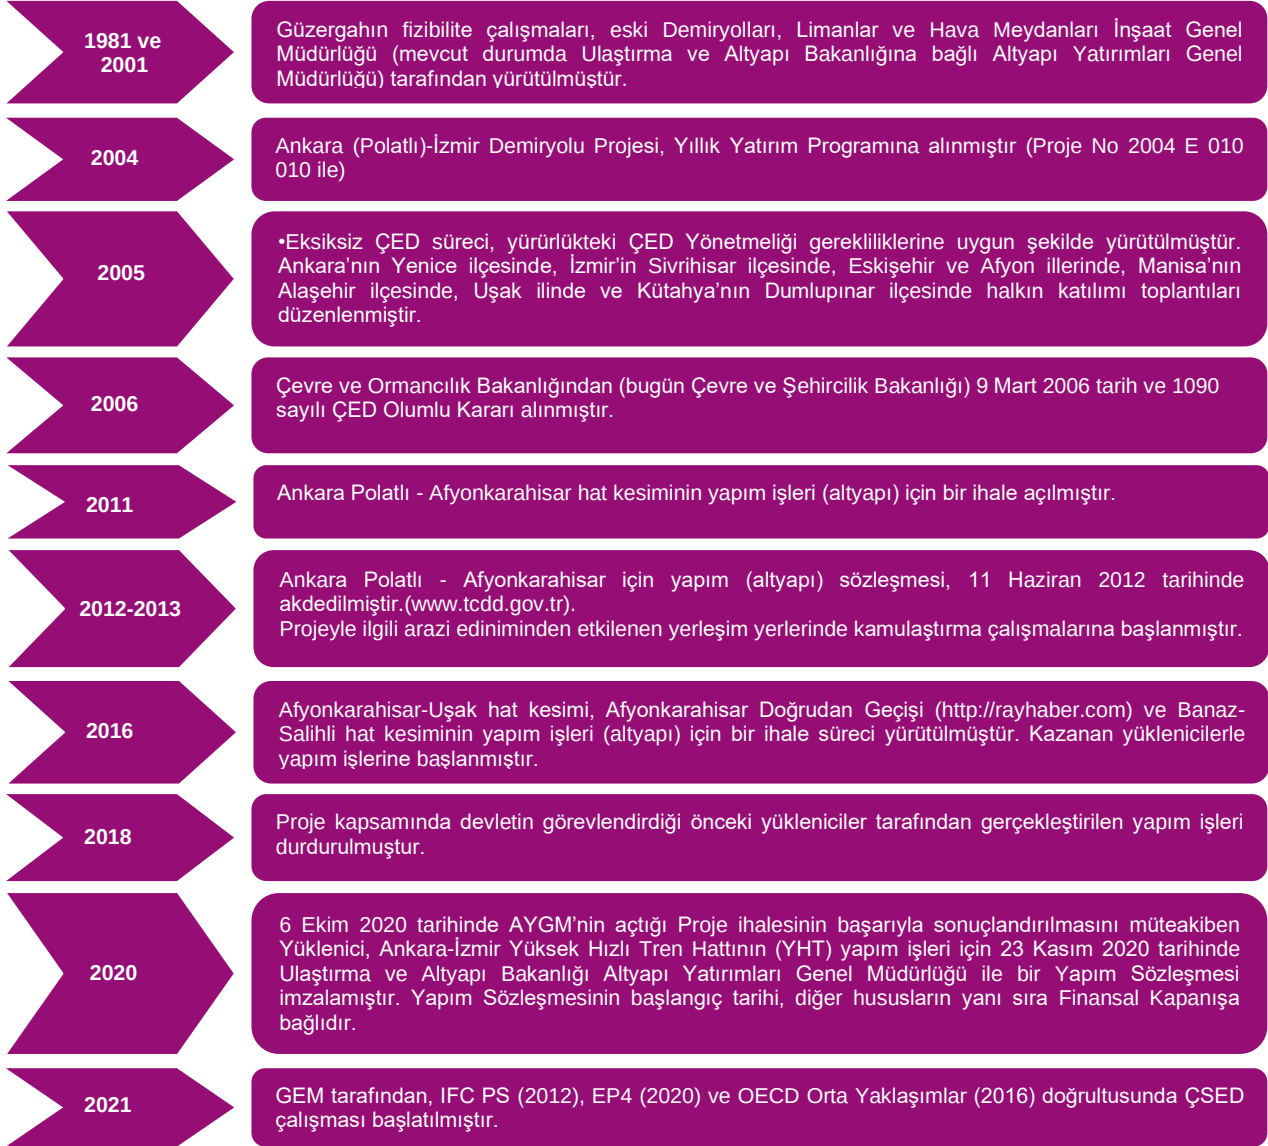

Şekil 1. Projenin Başlıca Ara Hedefleri

**KONTROLLÜ
KOPYA**

5.2.1. Demiryolu Güzergahı

Demiryolu güzergahı Tablo 1'de belirtildiği gibi dört kesime ayrılmıştır. Her bir kesim Şekil 2 ile Şekil 1-5'teki haritalarda gösterilmektedir. Projeyi diğer YHT'lere veya konvansiyonel demiryollarına bağlayan hatlar da vardır. Demiryolu güzergahı tarım, mera ve orman parsellerinden geçmektedir. Bazı kesimlerde kentsel alanların yakınından geçmektedir (örneğin Manisa'da).

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	16 / 103

Tablo 1. Demiryolu Hat Kesimleri

Kesim	Alt kesim	Başlangıç KM (*)	Bitiş KM	Alt Kesimlerin Toplam Uzunluğu (m)	Kesimin Toplam Uzunluğu (m)	(km)
Kesim 1	(-) Polatlı-Afyon	0+000.000	151+500.000	151,170.39	151,170.39	151.2
Kesim 2	(2a) Afyon-Hatıpler Geçidi	151+500.000	230+370.612	78,870.61	90,347.02	90.3
	(2b) Hatıpler-Geçidi	267+156.053	278+632.464	11,476.41		
Kesim 3	(3a) Banaz-Esme	279+000.000	364+600.000	85,600.00	159,918.73	159.9
	(3b) Esme-Salihli (**)	364+600.000	438+918.726	74,318.73		
Kesim 4	(4a) Salihli-Manisa (**)	439+000.000	456+500.000	17,500.00	101,790.26	101.8
	(4b) Salihli-Manisa (**)	456+500.000	501+000.000	44,500.00		
	(4c) Manisa Kuzey Geçidi	501+000.000	514+983.302	14,113.56		
	(4d) Manisa-Menemen	522+100.000	547+805.481	25,676.70		
Toplam Güzergâh Uzunluğu (***)					503,226.40	503.2

(*) Hat kesimlerinin başlangıç ve bitiş kilometreleri arasındaki fark, varsa, farklı bölümlerin tasarımının farklı firmalar tarafından yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Güzergâh kesintisiz bir hattır ve farklı kesimler arasında fiziksel boşluk yoktur.

(**) Yaklaşık olarak Demiryolu KM 430+000.000-458+800.000 arasında YHT hattına paralel giden konvansiyonel demiryolu hattı Salihli Geçişi olarak anılır.

(***) Kesim 3 (Banaz-Salihli) ve Kesim 4'ün bir kısmına (Salihli-Manisa kesiminin KM 439+000 ile 456+500 arasındaki başlangıç kısmı ve KM 522+100 ile 547+805 arasındaki Manisa-Menemen kesimi) altyapı işleri, İdari Özetle belirtildiği üzere başka Yüklenicinin kapsamındadır.

Altyapı çalışmalarının Yüklenici sorumluluğunda olduğu güzergâh kısımlarının bazılarında daha önceki yükleniciler tarafından 2012-2016 yılları arasında Proje yapım çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar 2018 yılında askıya alınmıştır. 2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, altyapı işlerinin sorumluluğu diğer yüklenicilere ait olan Kesim 3 ve Kesim 4'ün bazı kısımları (KM 439+000-456+500 arasındaki başlangıç kısmı ile KM 522+100-547+805 arasındaki Manisa-Menemen kesimi) dışında güzergâh üzerinde devam eden herhangi bir inşaat çalışması bulunmamaktadır. Tablo 2'de dört kesimin tamamı için kazı ve dolgu işlerinin ilerleyişi gösterilmektedir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Tablo 2. Kazı ve Dolgu İşlerinin İlerleyişi

Kesim	Alt Kesim	Kesimin Toplam Uzunluğu (km)	Fiziksel İşlerin (**) Genel İlerleyişi (*) (%) (Aralık 2020 itibarıyla)	Kazı ve Dolgu İşlerinin İlerleyişi (*) (Aralık 2020 İtibarıyla) (%)	
				Kazı	Dolgu
Kesim 1	(-) Polatlı-Afyon	151.2	65.2	68.7	38.3
Kesim 2	(2a) Afyon-Banaz	90.3	31.8	70.0	16.0
Kesim 3	(3a) Banaz-Esme	159.9	27.4 (***)	49.6 (***)	13.2
	(3b) Esme-Salihli		27.4 (***)	78.8 (***)	0.0
Kesim 4	(4a-4b-4c) Salihli-Manisa	101.8	5.2	9.0	0.3

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılmış kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	17 / 103

(4d) Manisa-Menemen	30.0 (***)	N/A	N/A
---------------------	------------	-----	-----

(*) Yüklenici, Aralık 2020. Proje Bilgi Notu.

(**) Fiziksel işler güzergâh ve ocak kazılarını, dolgu işlerini, alt geçit, üst geçit, menfez, tünel ve köprü/viyadük yapım işlerini ifade eder.

(***) Bu kesimlerde diğer yüklenicilerin altyapı işleri bu verilerin derlendiği tarihten (Aralık 2020) sonra da ilerlemeye devam etmiştir. Bu ÇSED Raporunun derlenmesi sırasında Yüklenicinin elinde fiziksel işlerin en son durumunu yansıtan resmi veriler mevcut değildi. Dolayısıyla, 2021 yılı 2. çeyreği itibarıyla fiziksel işler daha ileri bir seviyededir. Uydü görüntüsünün analizi ve Yüklenicinin saha gözlemlerine dayanarak, arazi bozulmasının Kesim 3a'da yaklaşık %80 seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Her bir Proje alt kesimindeki ilerleme seviyelerinin belirlenmesi için İşverenin daha fazla doğrulama yapması gerekmektedir.

5.2.1.1. Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerleri

Demiryolu güzergahının geçtiği il ve ilçeler Tablo 3'te listelenmiştir. Tablo ayrıca, demiryolunun her bir kesimi için Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen mahalle/köy sayısını da göstermektedir. Demiryolunun her kesiminde Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen yerleşim yerleri Ek A'da sunulmuştur.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Tablo 3. Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerlerinin Özeti

Kesim	İli	Mahallesi	Belediye Türü	Proje ile İlgili Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerlerinin Sayısı
Kesim 1	Ankara	Polatlı	Büyükşehir	47
	Eskişehir	Günyüzü	Büyükşehir	
		Sivrihisar		
	Afyonkarahisar	Emirdağ	Şehir	
		Bayat		
		İscehisar		
Merkez				
Kesim 2	Afyonkarahisar	Merkez		47
		Sinanpaşa		
	Kütahya	Dumlupınar	Şehir	
Uşak	Banaz	Şehir		
Kesim 3 (*)	Uşak	Banaz		71
		Merkez		
		Ulubey		
	Esme			
	Manisa	Alaşehir	Büyükşehir	
		Kula		
Salihli				
Kesim 4 (*)	Manisa	Salihli		42
		Ahmetli		
		Turgutlu		
		Şehzadeler		
		Yunus Emre		
	İzmir	Menemen	Büyükşehir	
Toplam				207

(*) Kesim 3 (Banaz-Salihli), Kesim 4'ün bir kısmı (KM 439+000 ile 456+500 arasındaki Salihli-Manisa başlangıç kısmı) ve Kesim 4d'ye (KM 522+100 ile 547+805 arasındaki Manisa-Menemen kesimi) ait altyapı çalışmaları, başka yüklenicilerin sorumluluğundadır.

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.


Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	18 / 103

Bu doküman, GEM tarafından sadece Müşterinin kullanımı için ve genel olarak kabul edilen danışmanlık ilkeleri, GEM ile Müşteri arasında kararlaştırılan ücret bütçesi ve iş tanımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Üçüncü tarafların sağladığı burada yer verilen bilgiler, aksi dokümanda açıkça belirtilmedikçe GEM tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmamıştır. Üçüncü taraflar, GEM'in önceden yazılı izni olmadan bu dokümana istinad edemez.

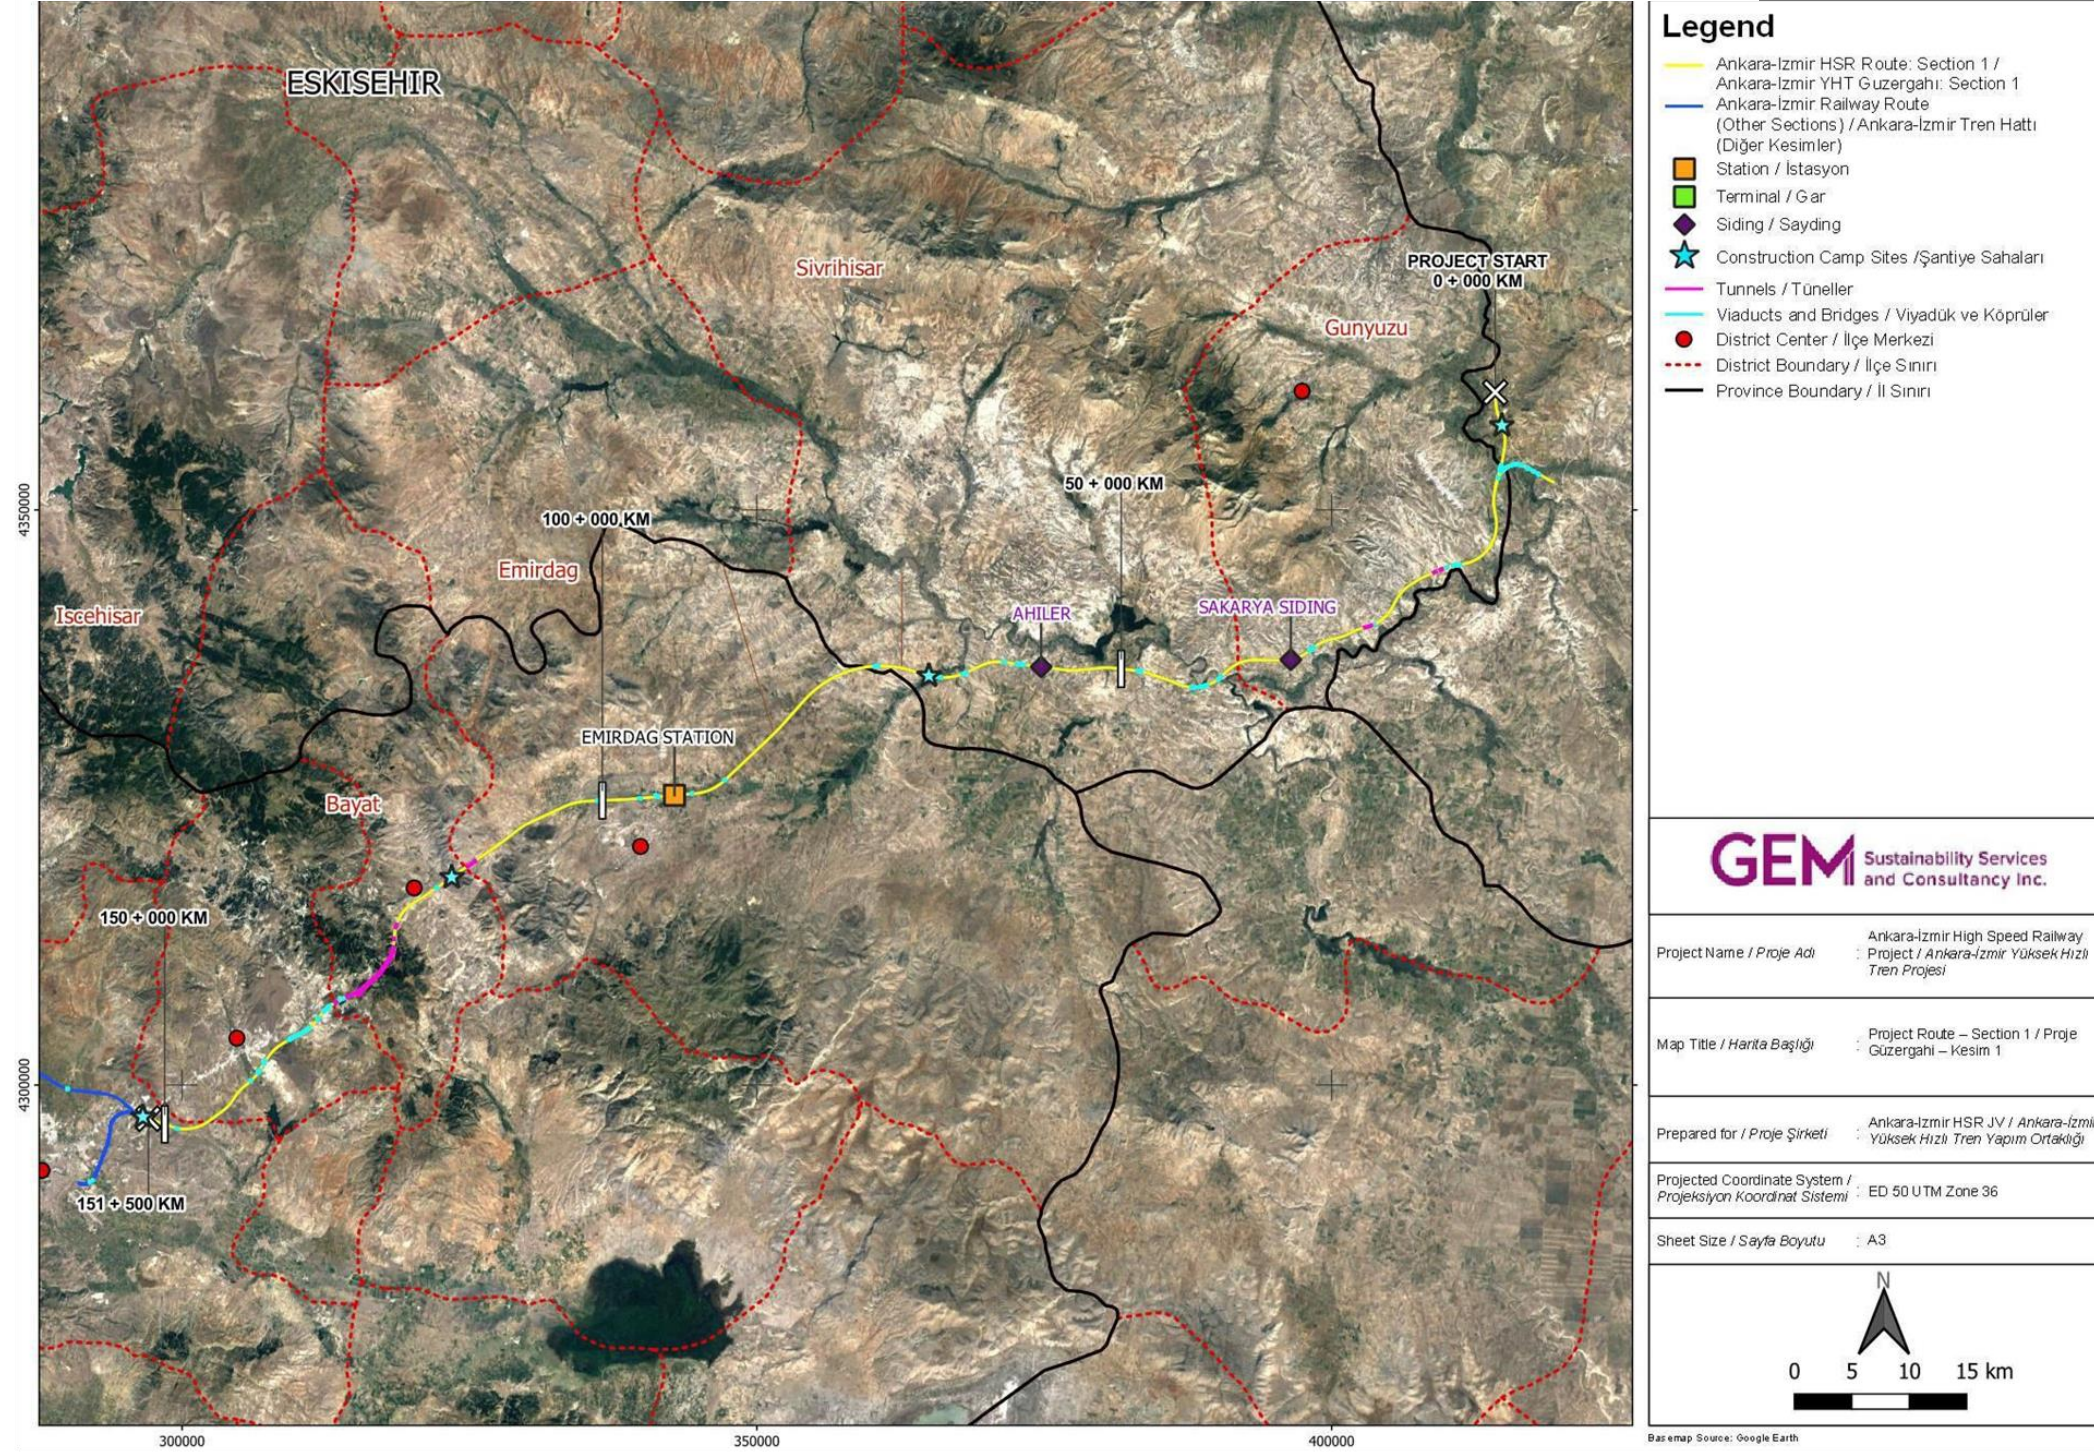

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Şekil 2. Proje Güzergahı (Kesim 1: Polatlı-Afyon)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.


Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	19 / 103

Bu doküman, GEM tarafından sadece Müşterinin kullanımı için ve genel olarak kabul edilen danışmanlık ilkeleri, GEM ile Müşteri arasında kararlaştırılan ücret bütçesi ve iş tanımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Üçüncü tarafların sağladığı burada yer verilen bilgiler, aksi dokümanda açıkça belirtilmedikçe GEM tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmamıştır. Üçüncü taraflar, GEM'in önceden yazılı izni olmadan bu dokümana istinat edemez.

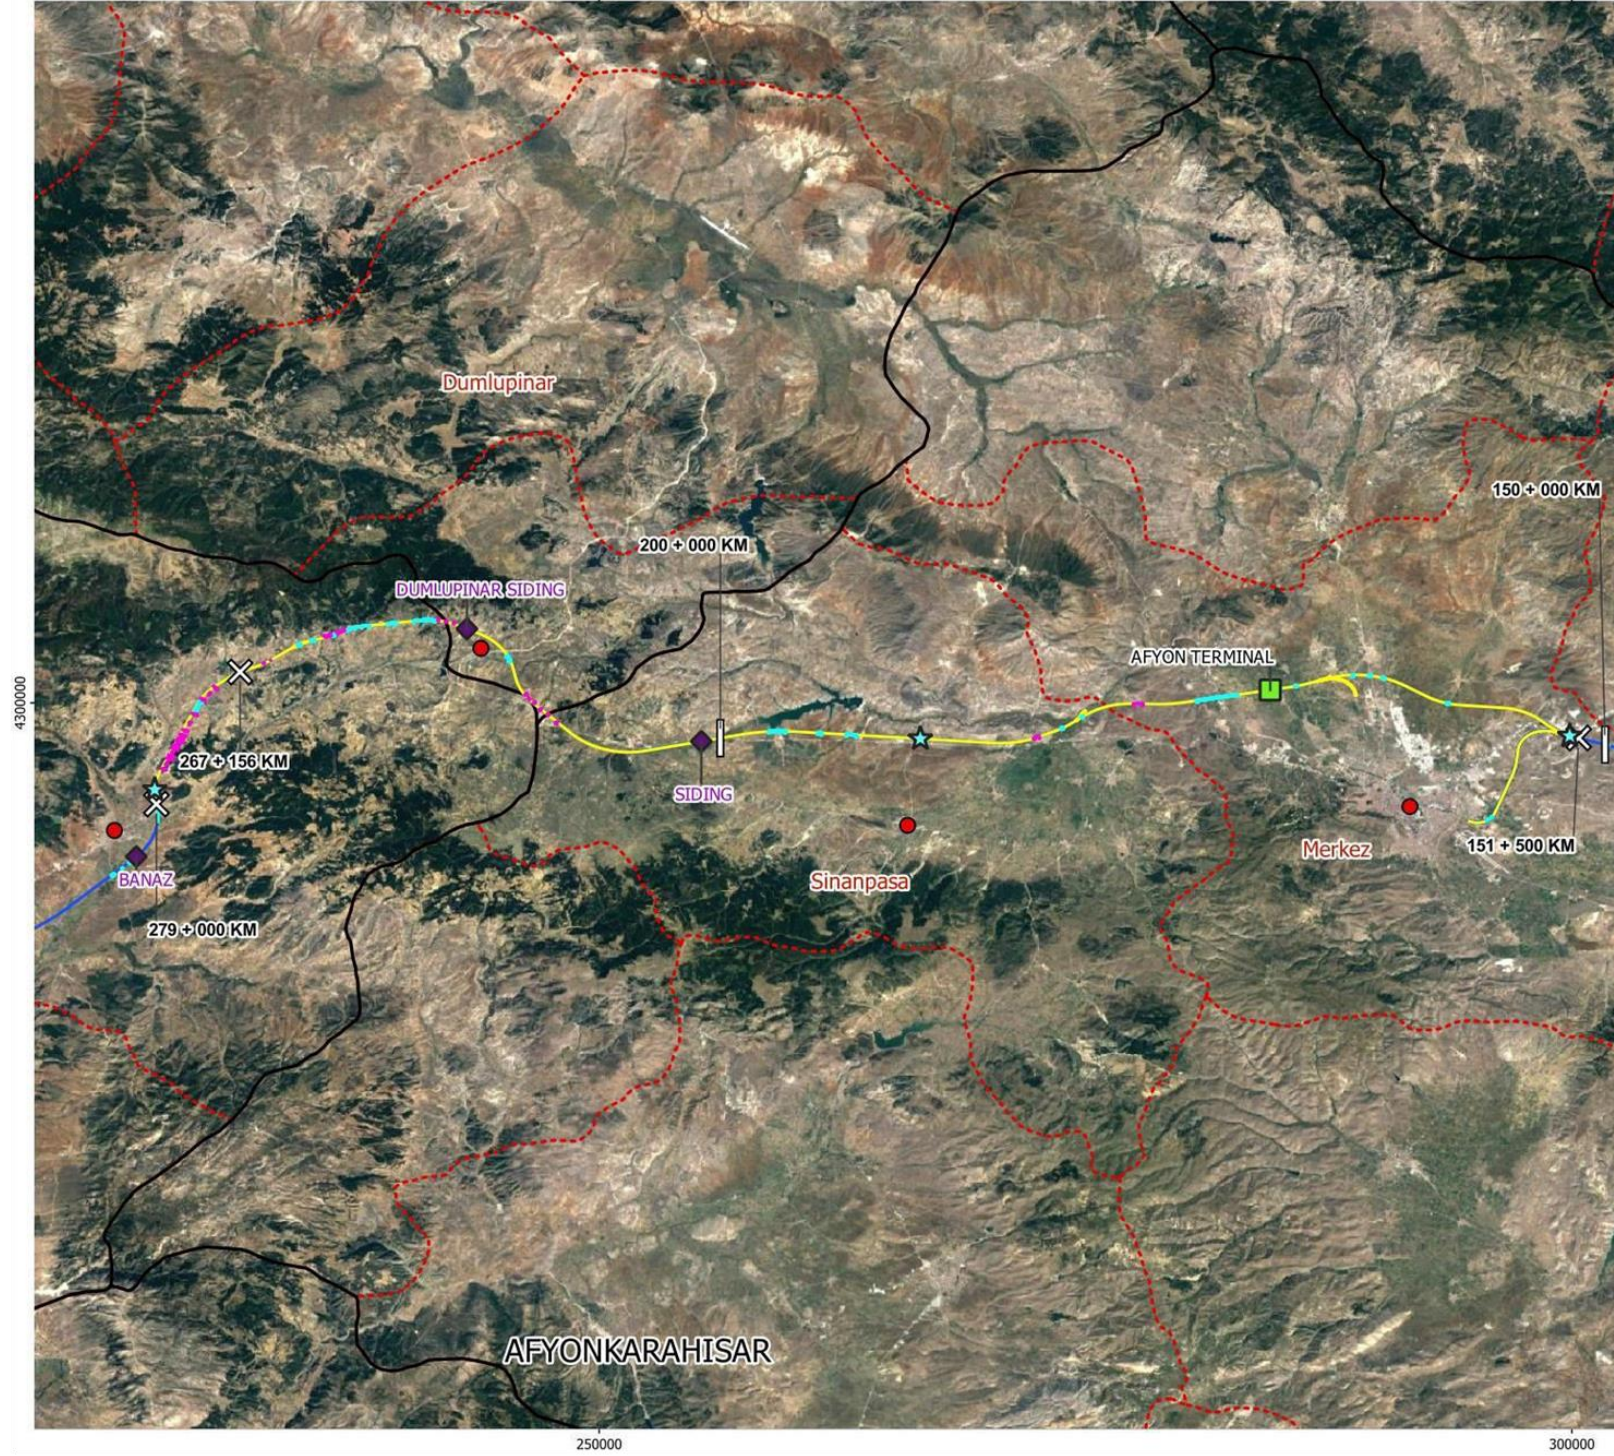

Legend

- Ankara-Izmir HSR Route: Section 2 / Ankara-Izmir YHT Guzerghı: Section 2
- Ankara-Izmir Railway Route (Other Sections) / Ankara-Izmir Tren Hattı (Diğer Kesimler)
- Station / İstasyon
- Terminal / Gar
- Siding / Sayding
- Tunnels / Tüneller
- Viaducts and Bridges / Viyadük ve Köprüler
- Construction Camp Sites / Şantiye Sahaları
- District Center / İlçe Merkezi
- District Boundary / İlçe Sınırı
- Province Boundary / İl Sınırı

GEM Sustainability Services and Consultancy Inc.


Project Name / Proje Adı : Ankara-Izmir High Speed Railway
Project / Ankara-Izmir Yüksek Hızlı Tren Projesi

Map Title / Harita Başlığı : Project Route – Section 2 / Proje Guzerghı – Kesim 2

Prepared for / Proje Şirketi : Ankara-Izmir HSR JV / Ankara-Izmir Yüksek Hızlı Tren Yapım Ortaklığı

Projected Coordinate System / Projeksiyon Koordinat Sistemi : ED 50 UTM Zone 36

Sheet Size / Sayfa Boyutu : A3



Base map Source: Google Earth

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Şekil 3. Proje Güzergahı (Kesim 2: Afyon-Banaz)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.


Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	20 / 103

Bu doküman, GEM tarafından sadece Müşterinin kullanımı için ve genel olarak kabul edilen danışmanlık ilkeleri, GEM ile Müşteri arasında kararlaştırılan ücret bütçesi ve iş tanımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Üçüncü tarafların sağladığı burada yer verilen bilgiler, aksi dokümanda açıkça belirtilmedikçe GEM tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmamıştır. Üçüncü taraflar, GEM'in önceden yazılı izni olmadan bu dokümana istinat edemez.

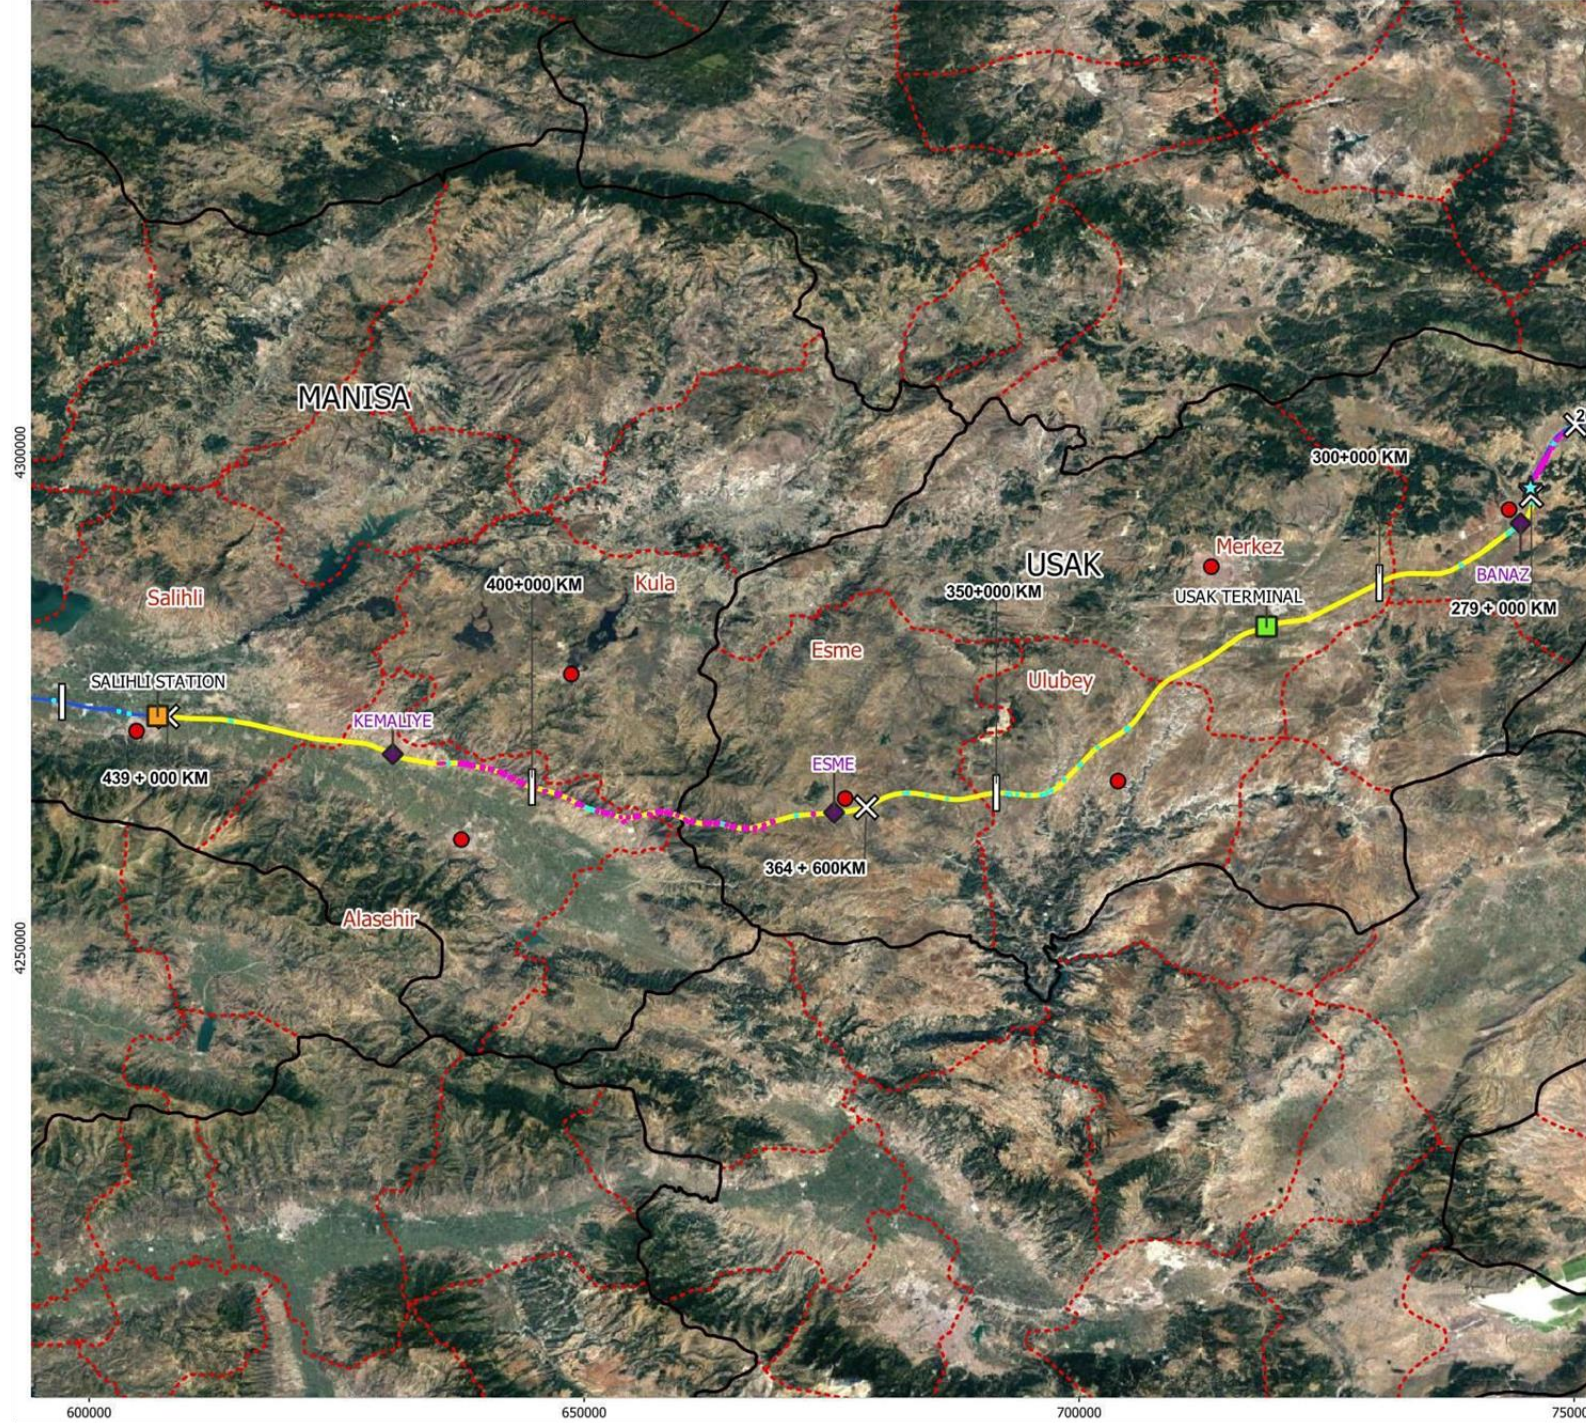

Legend

- Ankara-Izmir HSR Route: Section 3 / Ankara-Izmir YHT Güzergahı: Section 3
- Ankara-Izmir Railway Route (Other Sections) / Ankara-Izmir Tren Hattı (Diğer Kesimler)
- Station / İstasyon
- Terminal / Gar
- Siding / Sayding
- Construction Camp Sites / Şantiye Sahaları
- Tunnels / Tüneller
- Viaducts and Bridges / Viyadük ve Köprüler
- District Center / İlçe Merkezi
- District Boundary / İlçe Sınırı
- Province Boundary / İl Sınırı

GEM Sustainability Services
and Consultancy Inc.


Project Name / Proje Adı : Ankara-Izmir High Speed Railway
Project / Ankara-Izmir Yüksek Hızlı
Tren Projesi

Map Title / Harita Başlığı : Project Route – Section 3 / Proje
Güzergahı – Kesim 3

Prepared for / Proje Şirketi : Ankara-Izmir HSR JV / Ankara-Izmir
Yüksek Hızlı Tren Yapım Ortaklığı

Projected Coordinate System /
Projeksiyon Koordinat Sistemi : ED 50 UTM Zone 35

Sheet Size / Sayfa Boyutu : A3



Basemap Source: Google Earth

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Şekil 4. Proje Güzergahı (Kesim 3: Banaz-Salihli)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.


Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	21 / 103

Bu doküman, GEM tarafından sadece Müşterinin kullanımı için ve genel olarak kabul edilen danışmanlık ilkeleri, GEM ile Müşteri arasında kararlaştırılan ücret bütçesi ve iş tanımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Üçüncü tarafların sağladığı burada yer verilen bilgiler, aksi dokümanda açıkça belirtilmedikçe GEM tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmamıştır. Üçüncü taraflar, GEM'in önceden yazılı izni olmadan bu dokümana istinad edemez.

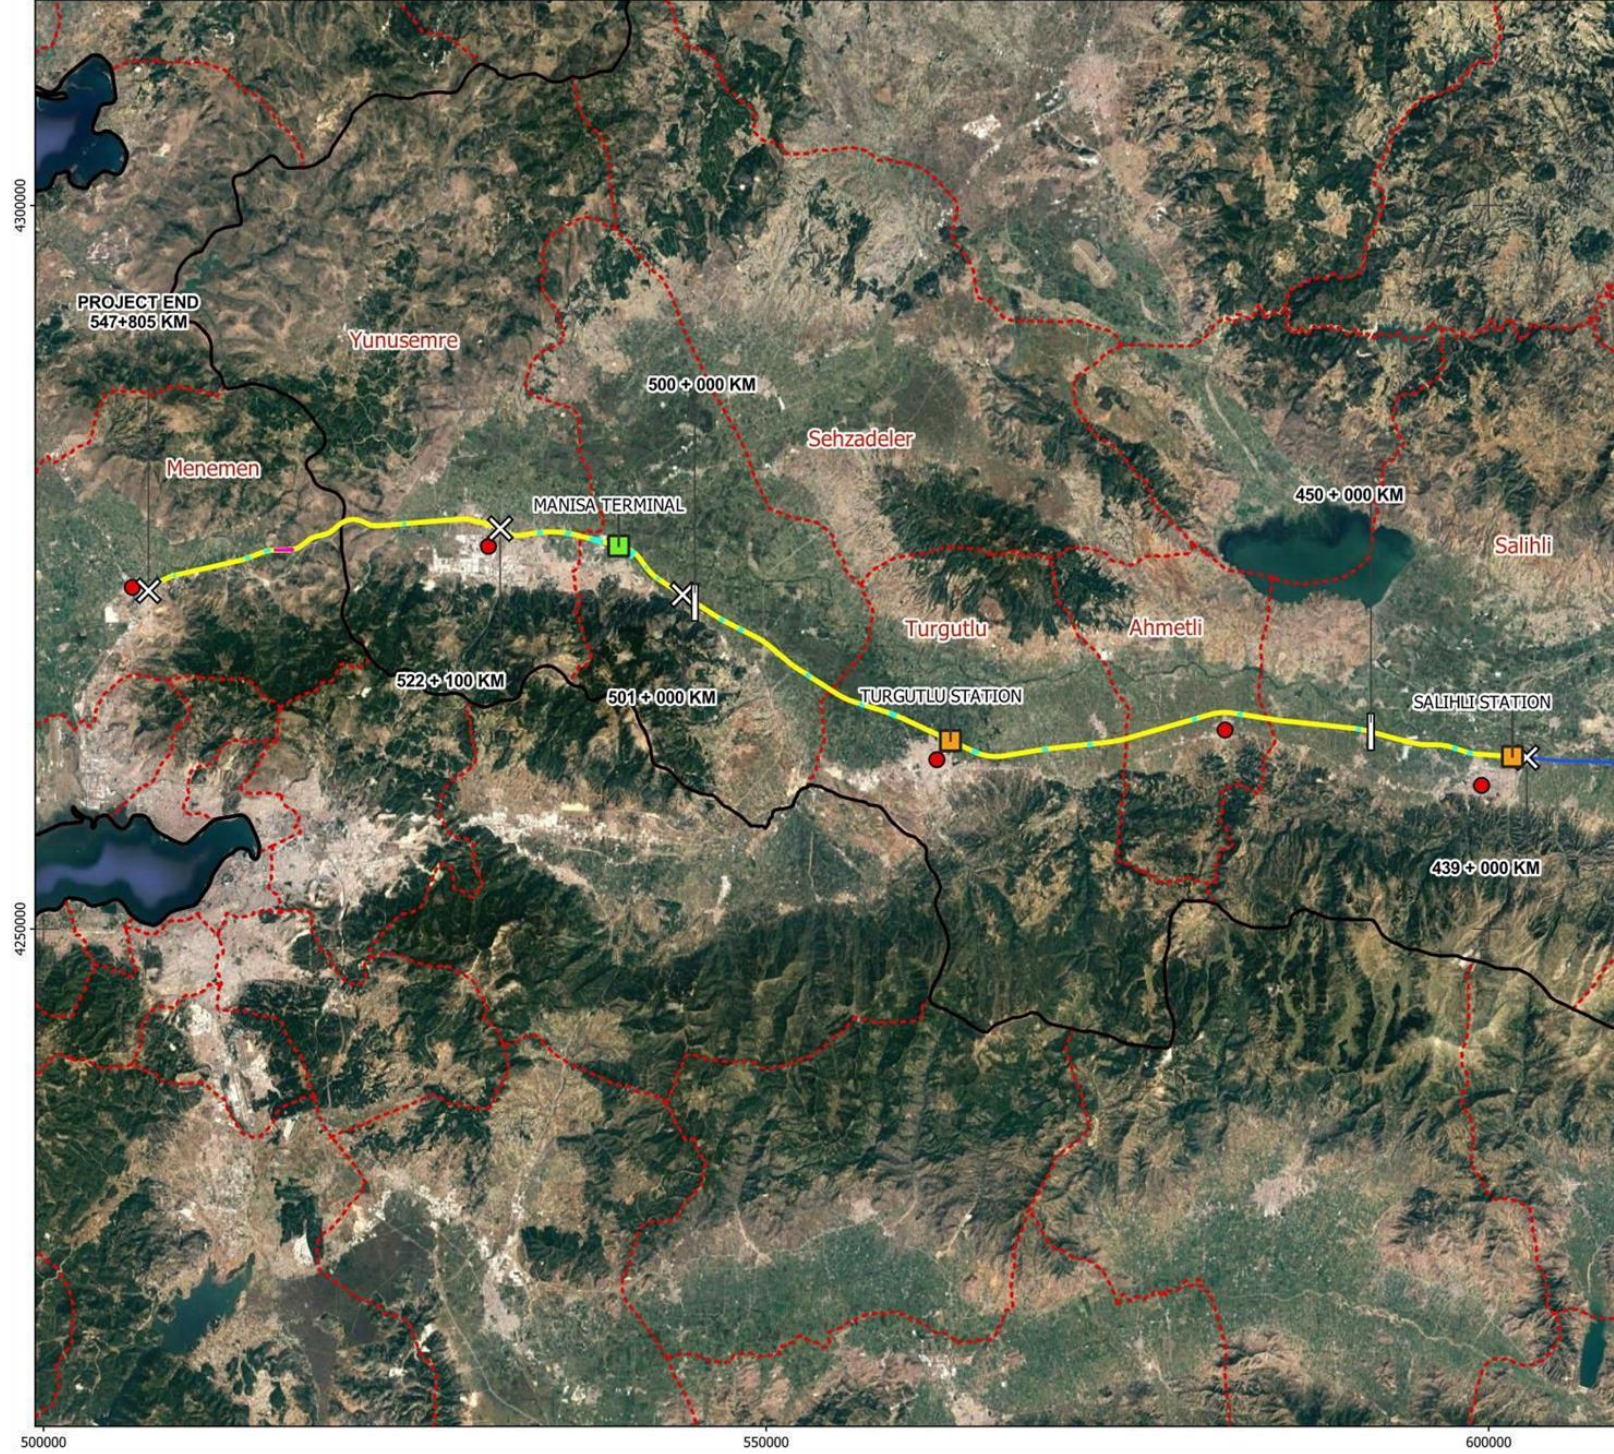

Legend

- Ankara-Izmir HSR Route: Section 4 / Ankara-Izmir YHT Guzergahi: Section 4
- Ankara-Izmir Railway Route (Other Sections) / Ankara-Izmir Tren Hattı (Diğer Kesimler)
- Station / İstasyon
- Terminal / Gar
- Siding / Saydın
- Construction Camp Sites / Şantiye Sahaları
- Tunnels / Tüneller
- Viaducts and Bridges / Viyadük ve Köprüler
- District Center / İlçe Merkezi
- District Boundary / İlçe Sınırı
- Province Boundary / İl Sınırı

GEM Sustainability Services and Consultancy Inc.

Project Name / Proje Adı : Ankara-Izmir High Speed Railway
Project / Ankara-Izmir Yüksek Hızlı Tren Projesi

Map Title / Harita Başlığı : Project Route – Section 4 / Proje Guzergahi – Kesim 4

Prepared for / Proje Şirketi : Ankara-Izmir HSR JV / Ankara-Izmir Yüksek Hızlı Tren Yapım Ortaklığı

Projected Coordinate System / Projeksiyon Koordinat Sistemi : ED 50 UTM Zone 35

Sheet Size / Sayfa Boyutu : A3

Basemap Source: Google Earth

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Şekil 5. Proje Güzergahı (Kesim 4: Salihli-Menemen)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güncellenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	22 / 103

5.2.1.2. Arazi Edinimi

Tablo 4'te ilgili TCDD bölge müdürlükleri tarafından tutulan kamulaştırma ilerleme verilerine dayanarak demiryolunun kamulaştırma koridoru içerisinde toplam etkilenen parsel sayısını ve kamulaştırmaya tabi parsellerin alanını özetlemektedir. Etkilenen parsellerin ve sahiplerinin/hissedarlarının ayrıntılı analizi ÇSED raporuna dahil edilmiştir.

YYEP 1 Kamulaştırması önceki yıllarda TCDD tarafından yapılmış arazilere ilişkin kamulaştırmaların etkilerini iyileştirmeye ilişkin bir eylem planıdır. YYEP 2 ise kamulaştırması gelecekte yapılacak veya kamulaştırması şimdi yapılmakta olan araziler için kamulaştırmaların etkilerini iyileştirmeye ilişkin bir eylem planıdır.

YYEP 1 kapsamında belirlenmiş olan aksiyonların saha uygulamaları başlatılmıştır. YYEP 2 kapsamında yapılacak olan güncellemeler kamulaştırma süreçleri ile paralel olarak güncellenecektir.

Tablo 4. Arazi Edinimi (Kamulaştırma) Özeti

Kesim	YYEP	Parsel Sayısı			Kamulaştırma Alanı (ha)			Özel Arazi Malik/ Hissedar Sayısı
		Özel Parsel Sayısı	Kamu Parseli Sayısı	Toplam Parsel Sayısı	Özel Arazi (ha)	Kamu Arazisi (ha)	Toplam (ha)	
Kesim 1 (Polatlı-Afyon)	YYEP 1	2119	848	2967	574,68	734,03	1308,69	3370
	YYEP 2 Konya Müselles	64	31	95	25,611	4,579	30,190	257
	YYEP2 Bayat Ripaj	58	32	90	29,619	13,612	43,231	**
Kesim 2 (Afyon-Banaz)	YYEP1	2123	614	2717	395,18	164,44	559,62	4286
	YYEP2 Hatipler Ripaj	246	79	325	34,268	10,123	44,391	**
Kesim 3 (Banaz-Salihli)	Kapsam Dışı	2576	768	3344	806,87	353,02	1159,89	3413
Kesim 4 (Salihli-Manisa)	YYEP1	1829	449	2278	470,71	57,57	528,28	3352
	YYEP2*							
Toplam		9015	2821	11816	2336,938	1337,374	3674,292	14678

Kaynak: Kamulaştırma Koridoru içindeki Parseller için Hazırlanan Kamulaştırma Planları (TCDD onaylı), 2012-2018.

(*) Kesim 3a, Kesim 3b, Kesim 4a ve Kesim 4d altyapı işleri, İdari Özetle belirtildiği gibi diğer yüklenicilerin kapsamındadır. Ankara-Konya YHT Bağlantı Hattı (KM 7+800; 0+000-6+683.120), Hatipler Ripajı (KM267+156.053-278+632.464) ve Manisa-Menemen kesiminin bir bölümüne (KM 531+517-539+100) ait kamulaştırma planları hazırlanacak/yeniden hazırlanacak olduğundan dolayı, sunulan bu verilere dahil edilmemiştir.

* Proje Aşamasında henüz belirlenemedi.

** Malik tespit çalışması devam ediyor.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Proje kamulaştırma koridoru içerisinde istimlak edilmesi gereken arazilerin çoğu, TCDD tarafından Kamulaştırma Kanunu (1983 yılında çıkarılan 2942 Sayılı Kanun) uyarınca istimlak edilmiştir. YHT güzergâhında kalan kamulaştırma çalışmaları aşağıda özetlenmiştir:

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	23 / 103

- Kesim 1:
 - Kamulaştırma planlarının bu kesime ait tasarım çalışmaları başladıktan sonra hazırlanacağı, Ankara-Konya YHT Bağlantı Hattı üzerinde yer alan yerleşim yerleri (Demiryolu KM 7+800 konumundan başlayarak yaklaşık 6,5 km uzunluğunda bir güzergâh boyunca)
 - Güzergâh değişikliği ilgili makamlarca onaylandıktan sonra güzergâh ripajı nedeniyle kamulaştırma planlarının yeniden değerlendirileceği/yeniden düzenleneceği Bayat Ripajı (KM 108+740-120+520 arası) üzerinde yer alan yerleşim yerleri
- Kesim 2:
 - Güzergâh değişikliği ilgili makamlarca onaylandıktan sonra güzergâh ripajı nedeniyle kamulaştırma planlarının yeniden düzenleneceği Hatıpler Ripajı (KM 267+156.053-278+632.464 arası) üzerinde yer alan yerleşim yerleri
- Kesim 3:
 - Kesim 3a'da (Koyunbeyli ve Yavi) yasal işlemleri devam eden yerleşim yerleri
- Kesim 4:
 - Salihli-Manisa (4b) kesiminde (Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Yukarıçobanisa) yasal işlemleri devam eden yerleşim yerleri
 - Manisa Kuzey Geçidi (4c) kesiminde kamulaştırma planları hazırlanan ancak kamulaştırma çalışmalarına başlanmayan yerleşim yerleri (Yukarıçobanisa, Şehitler, 2. Anafartalar, Kuşlubahçe ve Horozköy)
 - Manisa-Menemen (4d) kesiminde yasal işlemleri devam eden yerleşim yerleri (Uzunburun, Samar, Telekler, Süleymanlı ve Değirmendere)

Proje ile ilgili arazi ediniminden, kamulaştırma koridoru içerisinde yer alan parsellerin yanı sıra aşağıdaki ilişkili/saha dışı tesislerin bulunduğu yerlere karşılık gelen parseller de etkilenecektir:

- Kamp sahaları (kamulaştırma koridoru dışında yer alıyorsa)
- Taş ocakları ve malzeme temin sahaları (bağlantı yolları dahil)
- Elektrik iletim altyapısının yer üstü tesisleri
- Hafriyat depolama sahaları (kamulaştırma koridoru dışında yer alıyorsa)

Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı Kanun, 1983) ve Yapım Sözleşmesi gereğince kamulaştırma giderleri, Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı Kanun, 1983) uyarınca kamulaştırmanın gerçekleştirilmesinden sorumlu İdare tarafından ödenecektir.

5.2.2. Proje Tesisleri ve Faaliyetleri

Ana Proje tesisleri şunlardır:

- Yüksek hızlı tren hattı (YHT)



Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılmış kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	24 / 103

- Viyadükler, tüneller, altgeçitler, üstgeçitler ve menfezler dahil olmak üzere Mühendislik Yapıları
- Elektrifikasyon ve Telekomünikasyon Altyapısı
- Tren İstasyonları
- Hafriyat Depolama Alanları
- Şantiye kamp sahaları (bkz. Tablo 5), taş ocakları ve malzeme temin sahaları ve bunların bağlantı yolları, beton santralleri dahil olmak üzere Geçici Tesisler

Proje tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi Proje ÇSED Raporunda yer almaktadır. Her bir tesiste faaliyetlere başlamadan önce Yüklenici, mevcut/önceki kararların (örneğin ulusal ÇED Yönetmeliğine uygun ÇED kararı), ruhsat, lisans ve arazi kullanım haklarının/izinlerinin ve benzeri belgelerin geçerliliğini gözden geçirip kontrol edecektir. Mevzuatta öngörülen hallerde, tesislerin işletilmesi için gereken kararlar, ruhsatlar ve lisanslar, Projenin sahibi olarak İşveren adına ilgili kurumlardan alınacaktır.

Tablo 5. İnşaat Kamp Sahaları

Kesim	Kamp Sahası	Durum	Yaklaşık Demiryolu KM	İl	Mahalle	En Yakın Mahalle/Köy	Yerleşim Yerindeki En Yakın Mesafe (m)	Gösterge Niteliğinde Konaklama Kapasitesi
Kesim 1	Gümüşyaka	Yeni	3+000	Ankara	Polatlı	Gümüşyaka	470	300
	Sığırcık	Yeni	67+000	Eskişehir	Sivrihisar	Sığırcık	1.000	100
	Bayat	Yeni	119+000	Afyonkarahisar	Bayat	Merkez	20	400
Kesim 2	Sinanpaşa (*)	Mevcut	190+000	Afyonkarahisar	Sinanpaşa	Ayvalı	1.000	508
	Halaçlar	Yeni	228+000	Uşak	Banaz	Halaçlar	1.230	200
Kesim 3	TBD							TBD
Kesim 4	TBD	Yeni	493+000	Manisa	Şehzadeler	Aşağı Çobanisa	650	TBD

(*) Projenin ana kamp sahası olarak mevcut Sinanpaşa (Doğu) Şantiye Kamp Sahasının kullanılması planlanmaktadır.

Proje, demiryolu ve mühendislik yapıları dahil, AYGM ile imzalanan İnşaat Sözleşmesinde belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanacak ve inşa edilecektir.

İnşaat işlerinin tamamlanmasının ardından, YHT güzergahı ve tesisler (örneğin istasyonlar) uygun malzemelerle (örneğin tel örgü, beton paneller vb.) çevrilecektir.

İnşaat işlerinin kapsamı, Tablo 6'da kısaca verilmiştir.



PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	25 / 103

Tablo 6. Yapım İşlerinin Kapsamı

İş Aşaması	İş Kapsamı
Altyapı	- Toprak işleri (kazi, dolgu, vb.) - Viyadükler, köprüler, tüneller, altgeçitler, üstgeçitler, menfezler, istinat duvarları dahil olmak üzere çeşitli sanat yapıları - Drenaj işleri - Altyapı aktarma/deplasman işleri
Üstyapı	Hat üstyapı işlerinin inşası ve işletmeye alınması, aşağıdakiler dahil: - Beton transversli balastlı ray ve tüm bağlantılar - Tüm bağlantılarıyla birlikte plakalı hat rayı - Makaslar - Kaynak ve taşlama dahil tüm tamamlama işleri
Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon	- Tüm elektromekanik ve sinyalizasyon ve iletişim sistemlerinin tasarımı, temini, kurulumu, test edilmesi ve devreye alınması - Garanti ve servis hizmet sağlamak - TCDD personelinin eğitimi
Yapı İşleri (Bina ve Tesisler)	- Servis ve bakım deposu proje ve inşaatı - İstasyonların proje ve inşaatı

Yapım Sözleşmesi kapsamında Yüklenicinin Projenin her bir kesimindeki tasarım ve inşaat sorumluluğu, Tablo 'de kısaca verilmiştir. Gri vurgulanmış hücreler, altyapı işlerinin sorumluluğunun Yükleniciye değil, diğer yüklenicilere ait olduğu Proje kesimlerini temsil eder.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Tablo 7. Yüklenicinin İş Kapsamına İlişkin Tasarım ve İnşaat Sorumluluk Matrisi

Kesim No.	Kesims	Altyapı	Üstyapı	Elektrifikasyon	Sinyalizasyon	İnşaat & Tesisler
Kesim 1	Polatlı – Afyon	C	D + C	D + C	D + C	
	Afyon – Hatıpler Geçidi	C	D + C	D + C	D + C	
Kesim 2	Hatıpler Geçidi	D + C	D + C	D + C	D + C	
	Hatıpler Geçidi – Banaz	—	D + C	D + C	D + C	
Kesim 3	Banaz – Uşak	—	D + C	D + C	D + C	
	Uşak – Esme	—	D + C	D + C	D + C	
	Esme – Salihli	—	D + C	D + C	D + C	
Kesim 4	Salihli Geçidi	D + C	D + C	D + C	D + C	
	Salihli – Manisa	D + C	D + C	D + C	D + C	
	Manisa Geçidi	D + C	D + C	D + C	D + C	
	Manisa – Menemen	—	D + C	D + C	D + C	

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	26 / 103

Menemen–Alsancak Liman Bağlantısı	Mevcut İzban Hattı kullanılacak ve Kurum tarafından talep edilen iyileştirmeler teklif edilen Keşif Cetveli (BOQ) oranı ile yüklenici tarafından yapılacaktır.
D: Tasarım; C: İnşaat — : Kapsama dahil değildir	

Ankara-İzmir YHT hattının inşaatı tamamlandıktan sonra, demiryolu aşamalı olarak devreye alınacak olup, ilgili tüm bileşenleri ve altyapısı ile AYGM tarafından UAB'ye bağlı bir devlet kuruluşu olan TCDD'ye devredilecektir.

İnşaat sırasında kurulacak sistemlerin kullanım ömrü en az 30 yıl olacaktır.

İşletme ve bakım faaliyetlerinin detaylı planlaması AYGM ve TCDD tarafından zamanında yapılacaktır.

5.2.3. İşgücü

Yüklenici ve alt yükleniciler tarafından inşaat aşamasında her bir Proje Yönetim sahasında istihdam edilecek tahmini personel sayısı Tablo 8'de kısaca verilmiştir.

Tablo 8. Tahmini İnşaat İşgücü

		Altyüklenicinin Saha Personeli						Toplam
Proje Yönetimi	Açıklama	Yüklenicinin Yönetim Personeli (beyaz ve mavi yakalı)	Altyapı	Üstyapı	Elektrifikasyon	Sinyalizasyon, Telekomünikasyon, Destek Sistemi	Binalar ve Tesisler	
General Project Management (*)		135						135
1. Bölge Proje Yönetimi	Polatlı-Afyon	266	1,468	693	180	120	0	2,727
2. Bölge Proje Yönetimi	Polatlı-Afyon	281	1,876	576	180	120	100	3,133
3. Bölge Proje Yönetimi	Afyon-Banaz	290	2,432	647	180	120	300	3,969
4. Bölge Proje Yönetimi	Banaz-Salihli	215	0	585	180	120	300	1,400
5. Bölge Proje Yönetimi	Salihli-Menemen	284	1,535	496	180	120	800	3,415
Ara Toplam		1,471	7,311	2,996	900	600	1,500	14,778
Genel Toplam		1,471	13,307					14,778

(*) Genel Proje Yönetiminin, Projenin ana inşaat kampı olacak KM 190+000 'de bulunan mevcut Sinanpaşa (Doğuş) Kamp Sahasında kurulması planlanmaktadır.

Tablo 9'da inşaat işleri için tahmini iş gücü teşkili verilmiştir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	27 / 103

Tablo 9. Tahmini İşgücü Teşkili

İşgücü Kalifikasyonu	Yüzde (%)
Vasıflı	25
Ara eleman	8
Vasıfsız	67
Toplam	100

Bu ÇSED Raporunun derlenmesi sırasında Yüklenicinin elinde Kesim 3a, Kesim 3b, Kesim 4a ve Kesim 4d'de altyapı çalışmalarına devam eden diğer yüklenicilerin inşaat iş gücüne (doğrudan ve sözleşmeli) ilişkin bilgiler yoktu.

Projenin işletme ve bakım iş gücü (doğrudan ve sözleşmeli) gerekliliklerinin detaylı planlaması, zamanı geldiğinde AYGM ve TCDD tarafından yapılacaktır.



5.2.4. Tahmini Yolcu Sayısı

Tablo 10'da YHT hattının TCDD tarafından işletilmesine yönelik yıllık tahmini yolcu sayıları verilmiştir.

Tablo 10. YHT'nin Devlet Tarafından İşletileceği Yıllar için Yıllık Tahmini Yolcu Sayıları

Yıl	Yıllık Yolcu Sayısı (Yolcu/Yıl)
2023	6,0 milyon
2028	6,9 milyon
2033	8,0 milyon
2038	9,3 milyon
2043	10,8 milyon
2048	12,5 milyon
2052	14,1 milyon

Kaynak: Yüklenici, Aralık 2020. Proje Bilgi Notu.

5.2.5. Proje Takvimi

Projenin Yapım Sözleşmesi 23 Kasım 2020 tarihinde Yüklenici ile AYGM arasında imzalanmıştır. Yapım Sözleşmesi, 4 Mart 2022 tarihinde Yüklenici ile AYGM arasında imzalanan Yer Teslim ve İşe Başlama Tutanağı ile yürürlüğe girmiştir. Proje için Kredi Süresi, İşveren tarafından Devir Teslim Belgesinin düzenlenmesini müteakip yaklaşık 14 yıl boyunca devam edecektir.

AYGM ile imzalanan Yapım Sözleşmesine göre, Yüklenici tarafından yapılacak altyapı (Banaz-Salihli ve Manisa- Menemen bölümleri hariç), üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinin tamamlanma tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

- Kesim 1 (Polatlı-Afyon): Ağustos 2024 (Mali Kapanış tarihinden itibaren 30 ay (900 gün) içinde)
- Kesim 2 (Afyon-Banaz): Ağustos 2024 (Mali Kapanış tarihinden itibaren 30 ay (900 gün) içinde)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	28 / 103

- Kesim 3 (Banaz-Salihli) Ağustos 2025 (Mali Kapanış tarihinden sonraki 42 ay (1260 gün) içinde)
- Kesim 4 (Salihli-Menemen): Ağustos 2024 (Mali Kapanış tarihinden itibaren 30 ay (900 gün) içinde)

Yüklenicinin sorumluluğu, Projenin Proje Sahibi tarafından geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl daha sürer (kusur sorumluluk süresi).

İşletmeye alındıktan sonra ilgili tüm bileşenler ve altyapı ile YHT, işletilmek üzere AYGM (İşveren) tarafından TCDD'ye (İşletmeci) devredilecektir.

5.3. Yönetmelikler ve Gereklilikler

5.3.1. Ulusal Mevzuat

5.3.1.1. T.C. Anayasası



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşların haberleşme, düşüncenin ifade edilmesi ve yayılması ve bilgi talebi ile ilgili özgürlük ve haklarını güvence altına alan temel yasal belgedir:

- Haberleşme Hakkı (Madde 22): Herkes haberleşme hakkına sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunda açıkça tanımlanan durumlarda bir hakim tarafından usulüne uygun olarak alınan bir karar olmadıkça ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin emri olmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yukarıdaki istisnaların uygulanabileceği kamu kurum ve kuruluşları yasalarla belirlenecektir.
- Düşünce ve Kanaat Hakkı (Madde 25): Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
- Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hakkına (Madde 26): Bu hak resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
- Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı (Madde 74): Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Arazi edinimi hususunda, Anayasanın 46. maddesi, Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkili olacağını belirterek kamulaştırma sürecinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Bu itibarla, kamulaştırma tazminatı mal sahibine/sahiplerine peşin ve nakden ödenmedikçe taşınmazlara el konulamaz.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	29 / 103

5.3.1.2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 sayılı Kanun, 2003)

4882 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003) bilgi edinme hakkına ilişkin süreci tanımlamaktadır. Bu hakkı demokratik ve şeffaf yönetimin ön şartları olan eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda düzenler.

5.3.1.3. Dilekçe Hakkının Kullanımıyla ilgili Kanun (3071 sayılı Kanun, 1984)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, talep ve şikayetleri ile ilgili olarak, Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanunun 3. Maddesi (3071 Sayılı Kanun, 1984) uyarınca yazılı dilekçe ile Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamu otoritelerine başvurma hakkına sahiptir. Dilekçelerinde Türkçe dilini kullanmaları ve karşılıklılık olması şartıyla, Türkiye'de ikamet eden yabancılar da bu haktan yararlanma hakkına sahiptir.

5.3.1.4. Kamulaştırma Kanunu (2942 Sayılı Kanun, 1983)

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Türkiye'de kamulaştırma süreci Kamulaştırma Kanunu'nun gerekleri doğrultusunda yürütülmektedir (No.2942, 1983). Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesinde kamulaştırmadan etkilenen parsellerin malikleri/hissedarları ile yapılacak görüşmelere ilişkin bildirim, bilgilendirme ve ilgili görevlendirme işlemlerine ilişkin hükümler de dahil olmak üzere usuller belirlenmiştir:

- Uzlaşmaya dayalı arazi alımı, kayıtlı taşınmaz varlıkların edinilmesinde tercih edilen yöntemdir.
- Kamulaştırma kararının verilmesini müteakip, kamulaştırmadan sorumlu idare, Değerleme Komisyonu tarafından öngörülen bedel üzerinden görüşmelerin yürütülmesi için taşınmazın tahmini değerinin belirlenmesi için bir Değerleme Komisyonu ve Uzlaştırma Komisyonu görevlendirir. Gerekli hallerde Değerleme Komisyonu, Sanayi ve Ticaret odasından, emlak acentelerinden ve diğer uzman kişi veya kurum yetkililerinden bilgi alır.
- İdare, kamulaştırılacak taşınmazı, idarenin taşınmazı (taşınmaz için belirlenen kamulaştırma bedelini açıklamaksızın) edinim iradesini beyan eden resmi bir tasdikli yazı ile idareye ait başka bir taşınmazla (trampa) sulh veya takas yolu ile, peşin olarak veya taksit halinde Kanunda belirtilen şartlarla mal sahibine bildirir.
- Mülk sahibi veya mülk sahibinin yetkili temsilcisi, kamulaştırma konusu taşınmazın müzakere edilmiş uzlaşma veya takas (trampa) yolu ile satılması talebiyle idarenin bildirimini aldıktan sonra 15 gün içinde idareye müracaat eder. Buna göre Komisyon tarafından belirlenen tarihte müzakere toplantısı yapılır. Kamulaştırma bedeli üzerinde mutabakata varılması halinde (Komisyon tarafından öngörülen değer aşılamaz) sözleşme, kat maliki veya kat malikinin yetkili temsilcisi ile Komisyon üyeleri tarafından hazırlanıp imzalanan resmi tutanağa (Kanunda belirtilen içeriğe göre) kaydedilir.

Müzakere yoluyla anlaşmaya varılamayan malikler veya adresi belirsiz malikler, hazır bulunmayan malikler veya üzerinde mülkiyet uyuşmazlığı bulunan taşınmazlar için; Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi (2942 sayılı Kanun, 1983) uyarınca değerlendirme ve tescil için ilgili asliye hukuk mahkemesine dava açılır ve dava sırasında mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma tazminatı, kamulaştırılan malın sahibine ödenmek üzere bir banka hesabına yatırılır. Kimliği belirsiz taşınmazlara ilişkin

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	30 / 103

kamulaştırma tazminatı, 3 aylık vadesi olan bir vadeli hesaba yatırılır (Kamulaştırma Kanunu'nun (2942 sayılı Kanun, 1983) 10. maddesine başvurulmadan önce bildirim ve müzakere için en az iki ay gerekir). Malik sayısı ve arazi parselleri ile orantılı olarak fiili süre artışları)

5.3.1.5. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği

Çevre Kanunu'nun (2872 sayılı Kanun, 1983) 10. maddesi, Türkiye'deki ÇED prosedürünün yasal dayanağını ortaya koymaktadır. Bu maddeye göre, planlanan faaliyetleri sonucunda çevresel etkilere yol açabilecek kurum, kuruluş ve tesisler ÇED Raporu veya Proje Tanım Dosyası (PTD) hazırlamakla yükümlüdür.

Yasal dayanağını Çevre Kanunundan (2872 sayılı Kanun, 1983) alan ÇED Yönetmeliği, ilk kez 7 Şubat 1993 gün ve 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren, orijinal ÇED Yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve yeni ÇED yönetmelikleri 2008 ve 2013 yıllarında yayımlanmış ve selefleri yürürlükten kaldırılmıştır. En son ve halen yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Ankara-İzmir YHT Projesi için ÇED Olumlu Kararı, 9 Mart 2006 tarihinde 1090 sayılı Karar ile Çevre ve Orman Bakanlığından (şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ÇŞB) alınmıştır.

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin paydaş katılımı ve bilgilendirme (kamu ve makamların) gereklilikleri Şekil 6'da sunulmuştur.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	31 / 103

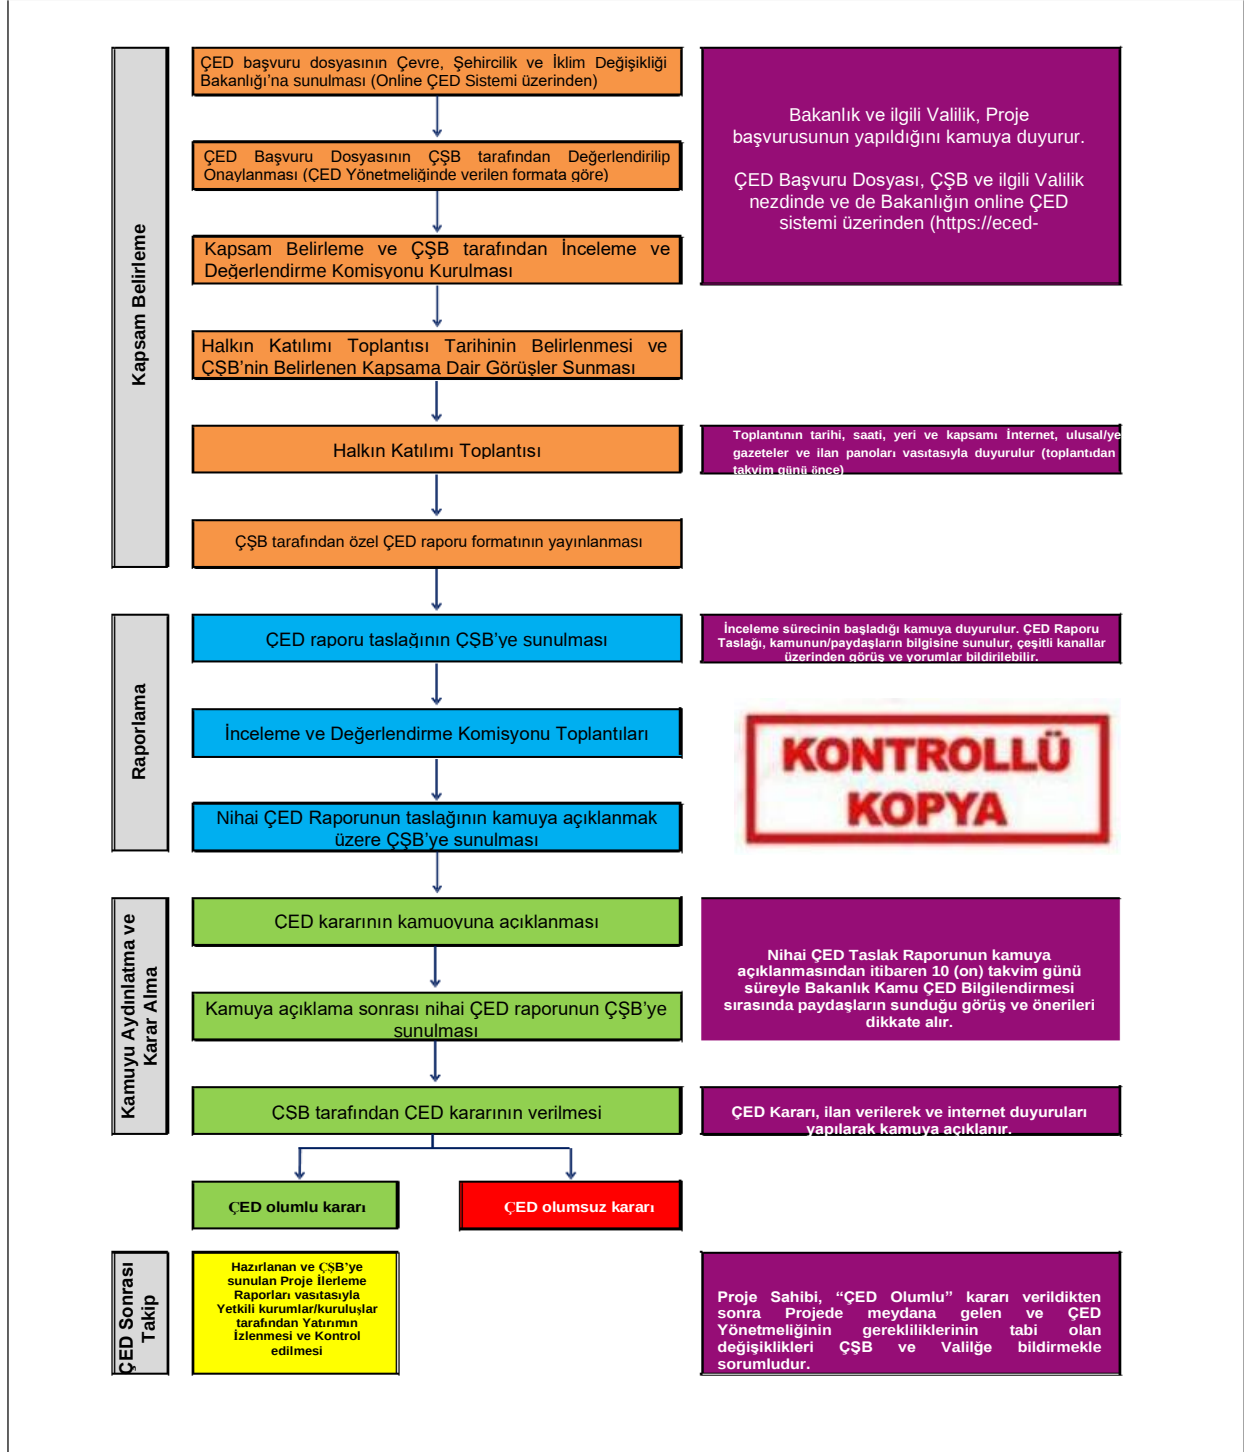

Şekil 6. Ulusal ÇED Yönetmeliği uyarınca Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Gereklilikleri

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	32 / 103

5.3.2. Uluslararası ÇS Standartları ve Kılavuzları

Proje ÇSED ve PKP için geçerli uluslararası standartlar:

- Ekvator Prensipleri (EP) 4 (2020)
- Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (PS) (2012)
- Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ortak Yaklaşımları (2016)
- UK Export Finance Çevre, Sosyal ve İnsan Hakları Politikası (2016, 2020 yılında güncellendi)

5.3.2.1. Ekvator Prensipleri 4 (2020)

Ekvator Prensipleri (EP), finansal kurumlar tarafından projelerde çevresel ve sosyal riski belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için benimsenen bir risk yönetimi çerçevesidir ve öncelikle risk kararlarının sorumlu bir şekilde alınmasını desteklemek için durum tespiti ve izleme için asgari bir standart sağlamayı amaçlamaktadır.

EP'ler küresel olarak tüm endüstri sektörleri için geçerlidir. Temmuz 2021 itibarıyla, 37 ülkedeki 118 Ekvator Prensipleri Finans Kuruluşu (EPFI), gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki uluslararası proje finansmanı borcunun çoğunluğunu kapsayan EP'leri resmen kabul etmiştir.

EP'lerin dördüncü versiyonuna göre (Temmuz 2020), tüm EPFI'lerin 1 Ekim 2020 tarihine kadar EP4'ü uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tüm EPFI'lerin 1 Ekim 2020 tarihinde/sonrasında imzalanan yeni Projelerde (ön protokoller veya yetkiler dahil) EP4'ü uygulaması gerekecektir.

EP 4, EPFI'ler tarafından finanse edilen ve tavsiye edilen Projelerin sosyal sorumluluk sahibi ve sağlam çevre yönetimi uygulamalarını yansıtacak şekilde geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan on (10) ilkeden⁷ oluşmaktadır.

Paydaş katılımı ve bilgilendirme ile ilgili ilkeler şunları içerir:

- Prensip 5: Paydaş Katılımı
- Prensip 6: Şikayet Mekanizması
- Prensip 10: Raporlama ve Şeffaflık



EP tarafından yayımlanan ve ÇSED Projesi için geçerli olan ilgili kılavuz notlar:

- EPFI Müşterileri için Biyoçeşitlilik Veri Paylaşımına İlişkin EP Kılavuz Notu (2020)
- EP'nin COVID-19 Salgını Sırasında Uygulanmasına İlişkin Rehberlik Notu (2020)

⁷ <https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf>.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	33 / 103

5.3.2.2. Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Ç&S Sürdürülebilirliği Politikası ve Performans Standartları (2012)

Ç&S Sürdürülebilirlik Politikasında IFC'nin Ç&S sürdürülebilirliği ile ilgili taahhütleri, görevleri ve sorumlulukları açıklanmaktadır. Risklerin ve etkilerin nasıl tanımlanacağı konusunda rehberlik sağlayan, müşterilere yönelik sekiz Performans Standardını (PS) içerir ve paydaş katılımı ve proje düzeyinde faaliyetlerle ilgili müşterinin ifşa yükümlülükleri de dahil olmak üzere, sürdürülebilir bir şekilde iş yapmanın bir yolu olarak risk ve etkilerden kaçınmaya, bunları azaltmaya ve yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Projeleri IFC'nin ilk kredi inceleme sürecinden geçen tüm yatırım ve danışmanlık müşterilerinin bu standartları karşılaması beklenmektedir. PS'ler, bunları uygulamak isteyen diğer finans kurumları için de geçerlidir.

Özel sektör sürdürülebilir kalkınması için uluslararası en iyi uygulama IFC'nin Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Performans Standartları tarafından yönlendirilmektedir. Performans Standartları 2012 yılında revize edilmiş ve risklerin ve etkilerin nasıl tanımlanacağı konusunda rehberlik sağlamıştır ve Proje düzeyindeki faaliyetlerle ilgili olarak Şirketin paydaş katılımı ve bilgilendirme yükümlülükleri de dahil olmak üzere risklerin ve etkilerin sürdürülebilir bir şekilde iş yapmanın bir yolu olarak önlenmesine, azaltılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

IFC'nin müşterilere yönelik, risklerin ve etkilerin nasıl tanımlanacağı konusunda rehberlik sağlayan sekiz (8) Performans Standardı vardır ve proje düzeyindeki faaliyetlerle ilgili olarak paydaş katılımı ve müşterinin bilgilendirme yükümlülükleri de dahil olmak üzere risklerin ve etkilerin sürdürülebilir bir şekilde iş yapmanın bir yolu olarak önlenmesine, azaltılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Aşağıdaki IFC Performans Standartlarının her biri, paydaş katılımı ve/veya bilgilerine ilişkin konuya özgü gereklilikleri ortaya koymaktadır:

- Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
- Performans Standardı 2: İşgücü ve Çalışma Şartları
- Performans Standardı 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi
- Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Emniyet ve Güvenlik
- Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim
- Performans Standardı 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
- Performans Standardı 7: Yerel Halkı
- Performans Standardı 8: Kültürel Miras.



PKP ile ilgili olarak IFC tarafından yayımlanan iyi uygulama/kılavuz notlar, aşağıdakileri kapsar:

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	34 / 103

- IFC Paydaş Katılımı El Kitabı: Gelişmekte Olan Piyasalarda Faaliyet Gösteren Şirketler için İyi Uygulama El Kitabı (2007)
- Projeden Etkilenen Toplulukların Şikayetlerini Ele Almaya Yönelik IFC İyi Uygulama Notu (2009)

5.3.2.2.1. IFC'nin COVID-19 Bağlamında Güvenli Paydaş Katılımı Konusunda IFC Müşterilerine Yönelik Ara Bilgilendirmesi (Mayıs 2020)

IFC'nin bu Ara Bilgilendirme ile temel amacı, IFC müşterilerinin paydaşların katılımı için alternatif yaklaşımlar ve mekanizmalar belirlemelerine, faaliyet alanlarındaki topluluklara proje ile ilgili bilgileri sunmaya devam etmelerine ve geri bildirim almalarına yardımcı olmak ve ilgili kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak için mümkün olan tüm adımları atmaktır. IFC, bu Ara Bilgilendirmede, COVID-19 koşulları nedeniyle şirketlerin normal koşullarda yapacakları gibi paydaş katılımı gerçekleştirmelerinin mümkün olmayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaçla Ara Bilgilendirmede, karar vermenin kilit yönleri ve diğer konularda tavsiyeler sunan katılım ve şikayet mekanizmalarına erişim için alternatif yaklaşımlar geliştirmek için bir çerçeve sunulmaktadır.

Ara Bilgilendirme çerçevesinde IFC, iletişimi ve bilgi paylaşımını desteklemek için sağlam bir geçici paydaş katılımı sürecinin geliştirilmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel unsurları listelemektedir.

Ara Bilgilendirme, çevrimiçi iletişim araçları, ses seçenekleri, çevrimdışı iletişim kanalları gibi sanal ve uzaktan katılım yaklaşımları olarak güvenli paydaş katılım yöntemlerine örnekler sunmaktadır.

Ayrıca, aşağıdaki IFC COVID-19 belgelerinde tamamlayıcı paydaş katılımı ile ilgili hükümler de bulunmaktadır:

- Kriz Müdahalesi Konusunda Şirket Liderliği için İpucu Formu: COVID-19 Salgını ile Yüzleşmek
- IFC Müşterilerine İşyerinde COVID-19 Kaynaklı Sağlık Risklerini Önleme ve Yönetme Konusunda Ara Bilgilendirme
- IFC Müşterilerine COVID-19 Bağlamında İşçileri Destekleme Konusunda Ara Bilgilendirme
- IFC Müşterilerine COVID-19 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Planı (ADHOMP) Geliştirme Konusunda Ara Bilgilendirme
- COVID-19 Bağlamında Artan Misilleme Riskinin Ele Alınması
- Göçmen İşçiler ve COVID-19 ile ilgili IFC ve EBRD Müşterileri için Ara Bilgilendirme

5.3.2.3. OECD Ortak Yaklaşımlar (2016)

28 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen ve 6 Nisan 2016 tarihinde OECD Konseyi tarafından revize edilen Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredileri ve Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti için Ortak

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	35 / 103

Yaklaşımlar Konseyi Tavsiyesi ("Ortak Yaklaşımlar")⁸, Üyelerin karar alma ve risk yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak resmi olarak desteklenen ihracat kredileri başvurularına ilişkin potansiyel Ç&S etkilerini ve risklerini belirlemek, değerlendirmek ve ele almak için Ç&S durum tespiti yapmaya yönelik ortak yaklaşımlar belirlemektedir.

A Kategorisi projeler için (A Kategorisi projelerin örnek listesi OECD Ortak Yaklaşımlarının I. Ekinde verilmiştir), faaliyet gösterdikleri rekabet bağlamı ve iş gizliliği kısıtlamaları dikkate alınarak, OECD Ortak Yaklaşımlarına bağlı olan üyeler ve üye olmayanlar ("Taraflar") aşağıdakileri yapmalıdır:

- Proje adı, konumu, projenin açıklaması ve bir alıcı ve/veya proje sponsoru iletişim noktası ve/veya web sitesi bağlantısı gibi ek bilgilerin (örneğin ÇSED raporu, özeti) alınabileceği yerler dahil olmak üzere kamuya açık proje bilgilerini gözden geçirme sürecinde mümkün olduğunca erken ve resmi destek verme taahhüdünden en az 30 takvim günü önce açıklamak; ve
- ÇSED etki bilgilerinin (örneğin ÇSED raporu, özeti) inceleme sürecinde mümkün olduğunca erken ve resmi destek verme taahhüdünden en az 30 takvim günü önce kamuya açık hale getirilmesini istemek. Bu bilgiler, Taraflar tarafından veya alıcı ve/veya proje sponsoru gibi projede yer alan uygun bir tarafça kamuya açık hale getirilebilir.
- Taraf ülkelerde kamuoyuna açıklanmasına ilişkin yasal hükümlere tabi olarak Taraflar, bir Tarafın gözden geçirilen bilgilerin türü ve uygulanan uluslararası standartlar da dahil olmak üzere resmi destek sağlama konusunda nihai taahhütte bulunduğu Kategori A ve Kategori B'de sınıflandırılan projeler hakkında en az yılda bir kez Ç&S bilgilerini ve ek bilgi edinmek için bir ECA irtibat noktasını kamuoyuna sunmalıdır.

5.3.2.4. UK Export Finance Çevre, Sosyal ve İnsan Hakları Politikası

UK Export Finance (UKEF), Birleşik Krallık İhracat Kredisi Kuruluşudur (ECA) ve UKEF'in yasal işlevi ihracatı desteklemektir. UKEF'in Çevresel, Sosyal ve İnsan Hakları Durum Tespiti ve İzleme⁹ Politikası ve Uygulaması, kuruluş yurtdışındaki projeleri desteklediğinde, UKEF'in çevresel, sosyal ve insan hakları (ÇSİH) risk ve etkilerinin yönetimine ilişkin politikalarını, taahhütlerini, rollerini ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır.

ÇSİH Politikasına uygun olarak UKEF;



- ÇSİH'in bireysel işlemler üzerindeki etkilerine ilişkin olarak tamamen finansal ve ilgili hükümet politikalarının ötesindeki faktörleri dikkate alır;
- ECA'ların faaliyetleri için geçerli olan tüm uluslararası anlaşmalara uygundur. Bu anlaşmalar, üye ECA'ların destek vermeleri istenen projeler ve mevcut operasyonlar için ÇSİH durum tespitini ve destek kabul edildikten sonra ÇSİH izlemesini nasıl ele alması gerektiğini bildiren OECD Ortak Yaklaşımlarını içerir;
- UKEF'in kabul ettiği Ekvator Prensiplerinin gerekliliklerine uygundur (UKEF, Ekvator Prensiplerinin (EP4) en son yinelemesini 1 Temmuz 2020 'den itibaren uygulamaya başlamıştır);

⁸ [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=tr&cote=tad/ecq\(2016\)3](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=tr&cote=tad/ecq(2016)3).

⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/uk-export-finance-environmental-social-and-human-rights-policy>

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	36 / 103

- ECA'lar veya Ekvator Prensipleri için geçerli olan uluslararası anlaşmaların ötesinde faaliyet göstermektedir ve 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren UKEF, tüm ürünlerdeki karar alma süreçlerinde iklim değişikliğini nasıl dikkate alacağını değerlendirmeyi taahhüt etmiştir. Bu husus, projelerle ve UKEF desteğiyle ilgili risk ve etkilerle orantılı olacaktır.

OECD Ortak Yaklaşımlar ve Ekvator Prensipleri doğrultusunda, UKEF;

- ESHR risklerini belirler ve projelerin yürürlükteki yerel ve ilgili uluslararası yasalara uyması ve destek sağlanmadan önce uluslararası ÇSİH standartlarına uyması gerektiğine dair gerekli özeni gösterir; ve
- Yürürlükteki yerel ve uluslararası yasalara uygun olarak inşa edildiklerinden ve işletildiklerinden ve destek sağlandıktan sonra uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uygun olduklarından emin olmak için projelerin ÇSİH performansını izler.
- Bu ÇSİH risk tespiti ve durum tespiti, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve sürdürülebilir borç vermeyi içeren ticari ve finansal sigorta ile yürütülmektedir.
- A Kategorisi projelerin proje ve Ç&S etki bilgileri, destek verme taahhüdünden en az 30 takvim önce UKEF'in web sitesinde yayımlanır¹⁰.

5.4. Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özet Bilgileri

5.4.1. ÇSED Öncesi Aşama

Projeye özgü paydaş katılım faaliyetleri ulusal ÇED süreci sırasında başlamıştır. 2005 yılında Proje için tam ölçekli bir ulusal ÇED çalışması gerçekleştirilmiş ve yürürlükteki ulusal ÇED Yönetmeliğine uygun olarak Mart 2006 'da Proje için ÇED Olumlu Kararı verilmiştir (mevcut ÇED Yönetmeliği uyarınca tam ölçekli ÇED süreci için bkz. Şekil 6).

Ulusal ÇED sürecinin bir parçası olarak, kamuoyunun resmi ÇED sürecinin kapsam belirleme aşamasına katılımını sağlamak, paydaşları Proje hakkında bilgilendirmek ve Projenin ÇED Başvuru Dosyası aracılığıyla açıklanan bilgilere dayanarak soru ve önerilerini almak için ulusal ÇED Yönetmeliğinin gerektirdiği halkın katılım toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda planlanan YHT güzergahının geçtiği illerde yedi (7) adet halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Halkın katılım toplantılarının tarihleri ve toplantı yerleri Tablo 11'de verilmiştir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

¹⁰https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/909200/ukef-eau-external-process-update-june-2020.pdf

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	37 / 103

Tablo 11. Ulusal ÇED Süreci Kapsamında Halkın Katılımı Toplantıları

Toplantı Tarihi	İl	İlçe	Konum (Mahalle/Köy veya İl/İlçe Merkezi)	Toplantı Yeri (Mahalle/Köy veya Şehir/İlçe Merkezi)
18 Temmuz 2005	Ankara	Polatlı	Yenice	Yenice Köyü Konağı
20 Temmuz 2005	İzmir	Menemen	Merkez	Menemen Düğün-Tören Salonu
20 Temmuz 2005	Eskişehir	Sivrihisar	Ahiler	Ahiler Köyü Konağı
21 Temmuz 2005	Afyonkarahisar		Merkez	Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
21 Temmuz 2005	Manisa	Alaşehir	Piyadeler	Piyadeler Köyü Kiraathanesi
22 Temmuz 2005	Uşak		Merkez	İl Özel İdare Binası
22 Temmuz 2005	Kütahya	Dumlupınar	Merkez	Dumlupınar Belediyesi Düğün-Tören Salonu

Kaynak: Ulusal ÇED Raporu, 2006.

2006 yılı ulusal ÇED Raporunda yer alan bilgilere göre, halkın katılım toplantıları hakkında paydaşları bilgilendirmek için aşağıdaki duyuru yöntemleri kullanılmıştır:

- Yerel ve ulusal gazetelere verilen ilanlar,
- İl ve ilçe valilikleri ile belediyelerin ilan panolarına asılan ilanlar



YHT güzergahından potansiyel olarak etkilenen yerleşimlerde yapılan duyurular. Halkın katılım toplantılarına katılanlara proje ile ilgili broşürler dağıtılmıştır.

Halkın katılım toplantılarında yöneltilen soruların genel konuları Tablo 12’de özetlenmiştir. Ulusal ÇED Raporunda yer alan bilgilere göre, katılımcılara halkın katılım toplantıları sırasında ilgili bilgi ve açıklamalar sağlanmıştır.

Tablo 12. Katılımcıların 2005 yılındaki Katılım Toplantılarında Sordukları Genel Sorular

Genel Konu	Özel Soru Başlıkları
Kamulaştırma	Kamulaştırma değerleri; kamulaştırmadan etkilenecek alanın kapsamı
Tarımsal Araziler	YHT hattı nedeniyle bölünecek araziler arasında insanların ve hayvanların erişimini sağlamak için planlanan geçiş yapıları
İstasyonlar	İstasyon konumları; istasyonların yerleşimlere yakınlığı, istasyonların kamu kullanımına hizmet edip etmeyeceği
Yerel altyapı tesisleri	Projenin halkın katılım toplantılarında temsil edilen diğer mevcut/planlanan altyapı tesisleri/projeleri üzerindeki potansiyel etkisi

Kaynak: Ulusal ÇED Raporu, 2006.

Ulusal ÇED sürecinde, ilgili kurumların yasal ve kurumsal gereksinimlerini Projeye dahil etmek için ilgili hükümet paydaşlarının resmi görüşleri alınmıştır. Ulusal ÇED sürecinde danışılan devlet kurumlarının listesi ve istişarelerin genel konusu Tablo 13’te verilmiştir.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	38 / 103

Tablo 13. Resmi Yazışmalar Yoluyla Ulusal ÇED Süreci Boyunca Görüşülen Devlet Paydaşları

Devlet Dairesi	Gözden Geçirme Tarihi	Gözden Geçirmenin Genel Konusu
Devlet Su İşleri – DSİ	30 May 2005	YHT güzergahı ile çakışan mevcut ve planlanan DSİ tesisleri (Proje ile paylaşılan tesis konumları)
Çevre ve Orman Bakanlığı (şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü	28 Temmuz 2005	YHT hattının üzerinden geçtiği Başkomutan Tarihi Milli Parkı (mevcut Proje tasarımına göre 217+900-219+300 ve 219+300 -223+800 arasında; bkz. ÇSED Bölüm 10, Biyoçeşitlilik; resmi görüş, güzergahın yoğunlukla milli parkın otlatma ve tarım amaçlı kullanılan bölümlerinden geçtiğini doğrulamakta ve milli parkın tarihi karakterini etkileyecek şekilde değerlendirilmemektedir.
Devlet Su İşleri – DSİ	19 Eylül 2005	YHT güzergahı ile örtüşen mevcut ve planlanmış ek DSİ tesisleri (ilgili haritalar ve tablo aracılığıyla Proje ile paylaşılan tesis konumları)
Izmir, Ankara, Eskişehir, Denizli, Kütahya Bölge Orman Müdürlükleri	2 Ağustos 2005 12 Ağustos 2005 9 Eylül 2005 12 Eylül 2005 14 Eylül 2005	YHT güzergahı ile geçilen orman arazileri (harita ve tablo ile paylaşılan muayene ve değerlendirme formu ve ilgili yerler)
Kültür ve Turizm Bakanlığı	3 Eylül 2005	Afyonkarahisar'da planlanan Ömer GECEK Turizm Alanı
Eskişehir Kültür Varlıkları Konuşma Bölge Konseyi	20 Ekim 2005	YHT güzergahı ile çakışan Kuztepe 1. Derece Doğal Sit Alanı

Kaynak: Ulusal ÇED Raporu, 2006.

2006 ulusal ÇED Raporu ayrıca, aşağıda belirtilen konular için aşağıdaki makamların resmi görüşlerine de atıfta bulunmaktadır:

- Demircevre Malzeme Temin Sahası ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi¹¹.
- YHT güzergahından geçen Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve izin süreçleri (geçiş izni) ile ilgili gereklilikler.
- Ulusal ÇED süreci sırasında yapım aşamasında olan Akdeğirmen Barajı ile ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) ve DSİ tarafından planlanan taşkın koruma tesisleri¹².

Ulusal ÇED Raporunda bildirildiği gibi YHT güzergahı, KM 131+600-131+900 arasında Seydiler I. Derece Doğal Sit Alanından geçmektedir¹³. 2006 ulusal ÇED Raporu, bu bölüm için uygulanabilir bir Proje alternatifi olmadığını ve DLH'nin buna göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Konseyi ile çalışmaya başladığını belirtmektedir. YHT'nin bu bölümündeki altyapı çalışmaları tamamlanmış ve

¹¹ Bu malzeme temin sahaları, başlangıçta ulusal ÇED Raporunda yer alan malzeme temin sahası, şehrin imar planı sınırları içinde yer alan özel mülkiyete ait bir parsel (13 özel hissedarlı) karşılık geldiğinden çıkarılmıştır (bkz. ÇSED Bölüm 3 "Proje Alternatifleri").

¹² Resmi görüş, ilgili DSİ tesislerinin Proje tasarımında halihazırda kabul edildiğini doğrulamaktadır. Akdeğirmen Barajının 2008 yılından bu yana uygulama mesafesinde faaliyette olduğu not edilmektedir. 500 m ile KM197+000 arasında ve içme suyu ve taşkın koruma amaçları için kullanılır (bkz. ÇSED Bölüm 8 "Su ve Atıksu Yönetimi").

¹³ Kültürel Miras başlıklı ÇSED Bölüm 14'te belirtildiği gibi, Demiryolu KM 131+950 -132+539'da kayıtlı bir arkeolojik alan bulunmaktadır (Seydiler 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı).

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	39 / 103

doğal sahaların ilgili bölümü toplam uzunluğu 1.900 metrenin üzerinde olan dört (4) adet viyadükle geçilmiştir.

TCDD tarafından Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun, 1983) gereği yürütülen kamulaştırma süreci kapsamında (Projeye ilişkin kamulaştırma süreci kapsamında sunulacak kamulaştırma bedeli konusunda mutabakat ve anlaşmazlık halinde izlenecek usule ilişkin bilgiler dahil) resmi bildirimler yapılmış ve etkilenen parsellerin sahipleri/hissedarları ile Madde 5.3.1.4'te açıklandığı şekilde müzakere toplantıları gerçekleştirilmiştir (etkilenen parsellerin sahiplerine/hissedarlarına gönderilen resmi tebligat mektuplarının örnekleri ÇSED kapsamında incelenmiştir).

5.4.2. ÇSED Dönemi

**KONTROLLÜ
KOPYA**

ÇSED sürecinin bir parçası olarak sosyal ekip ve ÇSED çalışmalarına paralel olarak Yüklenici tarafından yürütülen kilit paydaş katılım faaliyetleri Tablo 14'te özetlenmiştir.

Üst Yönetim Ekibi ve Yüklenici Kamulaştırma Uzmanı, Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun, 1983) ve Projenin Proje inşaat işlerini finanse etmek için kullanılacak ihracat kredisi kapsamındaki Ç&S yükümlülüğü gereğince devletin ileride yapacağı arazi edinim süreçlerinin planlanması konusunda AYGM ve TCDD de dahil olmak üzere ilgili makamlarla çalışmaktadır.

Yüklenici, Proje takvimi ve kamulaştırılan parsellerin mevcut kullanıcıları üzerindeki potansiyel etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında yetkiliyi bilgilendirmek üzere 9 Şubat 2021 tarihinde AYGM'ye resmi bir mektup göndermiştir. Yüklenicinin bu resmi yazışma yoluyla kuruma ilettiği öneri aşağıdakileri içermektedir:

- Kamulaştırma işlemi tamamlanmış parsellerin tahliyesi, devam eden herhangi bir tarımsal faaliyet veya konut binalarının önceki sahipler/kullanıcıları tarafından sürekli kullanımı Proje takvimi ve Mali Kapanışı takiben Yükleniciye sahanın teslimi üzerinde risk oluşturabileceğinden, ilgili makamlar tarafından uygulanmalıdır.
- Kamulaştırma işlemi tamamlanmış olan parsellerin mevcut kullanıcıları, bir sonraki hasat mevsimi için ekim/tohumlama faaliyetlerinin sürdürülmesini önlemek amacıyla öngörülen süreç hakkında ilgili makamlar tarafından bilgilendirilmelidir. Aksi takdirde bu durum, potansiyel ekonomik kayıplara veya anlaşmazlıklara yol açabilir (halihazırda kamulaştırılmış olan parseller için arazi ve varlıklara ilişkin kamulaştırma ödemeleri, TCDD tarafından tamamlanmıştır).

Şubat 2021'de, Yüklenici, Ankara'da (Yüklenici HİU) bir Halkla İletişim Sorumlusu (HİU) atadı ve bu kişinin, Ortak Girişim şirketlerinin lider üyesi ERG İnşaat'ın başka bir büyük ölçekli otoyol projesinde topluluk katılımıyla ilgili sorumlulukları vardı. Yüklenicinin HİU'su aşağıda özetlendiği gibi yerel topluluklarla etkileşime girmeye başlamıştır:

- Yüklenici HİU, telefon görüşmeleri veya yüz yüze görüşmeler yoluyla, ÇSED ve YYEP anketleri kapsamında yer alan yerleşim yerlerinin muhtarlarını (2021 yılı Şubat ve Mayıs aylarında ÇSED sürecine paralel olarak yapılan anketler), Yüklenicinin sorumluluğundaki faaliyetler, Projenin

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	40 / 103

mevcut durumu ve gerektiğinde ÇSED Danışmanı tarafından yürütülen sosyal anketlerin kapsamı hakkında bilgilendirmiştir.

- Yüklenici HİU, inşaat kamp alanlarının kurulması için kullanılması planlanan parsellerin sahipleri/hissedarları ile planlanan faaliyet ve gereklilikler hakkında bilgi vermek ve gerekli parsellerin edinimi (örneğin kiralınması) için gerekli müzakereleri yürütmek için çalışmıştır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	41 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Tablo 14. ÇSED Süreci Kapsamında Yürütülen Katılım Faaliyetlerinin Özeti

Katılım Faaliyeti	Katılanlar/Taraflar	Katılım Tarihi	Katılım Yöntemi	Katılımın Özeti
Kapsama Alanı Çalışması – Yerel yöneticiler ve yerleşim muhtarları ile etkileşim	- Yüklenici Temsilcisi - ÇSED Danışmanı (ÇSED Proje Yöneticisi, Kıdemli Sosyal Uzmanlar/Sosyologlar, Kıdemli S&G Uzmanı ve ÇSG Uzmanının katılımıyla)	13 -14 Ocak 2021	Yüz yüze toplantı	- Kapsama Alanı Çalışması sırasında, diğer yükleniciler tarafından yürütülen ve 2018 yılında askıya alınan önceki inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan genel sosyoekonomik koşullar, geçmiş kamulaştırma süreçleri ve geriye dönük etkiler (örn. erişim kısıtlamaları, tarım, mera ve orman arazileri üzerindeki etki, binalar ve yapılar üzerindeki etki, yerleşim yerlerindeki insanlar) hakkında aşağıdaki kilit paydaşlarla istişareler yapılmıştır: - Gözü Belediye Başkanı (Afyonkarahisar, Emirdağ) - Yüreğil Mahallesi muhtarı (önceki müteahhitlerin inşaatı 2018 yılında askıya alınmıştır) (Afyonkarahisar, Emirdağ) - Seydiler Beldesi Belediyesi'ne bağlı Hasan Basri Mahallesi Muhtarı (önceki müteahhitlerin inşaatı 2018 yılında askıya alınmıştır) (Afyonkarahisar, İscehisar, Seydiler Belde Belediyesi) - Afyonkarahisar Erenler Köyü muhtarı (inşaatı başlanmadı) (Afyonkarahisar, Merkez) - Cumhuriyet Muhtarı (Afyonkarahisar, Merkez)
TCDD ile Toplantı - Gayrimenkul Daire Başkanı	- Yüklenici Temsilcisi - ÇSED Danışmanı (ÇSED Proje Müdürü ve üst düzey sosyologların katılımıyla)	29 Ocak 2021	Yüz yüze toplantı	- Yetkili makamı ÇSED çalışmasının kapsamı, özellikle sosyal anketler hakkında bilgilendirmek ve aşağıdakiler hakkında bilgi edinmek için TCDD - Gayrimenkul Dairesi Başkanı ile bir toplantı düzenlenmiştir: - Planlama ve tasarım aşamaları, kamulaştırma planlarının hazırlanması, kamu yararı kararının verilmesi vb. dahil olmak üzere Projeye ilişkin arka plan bilgileri. - Projede Ç&S kriterlerine göre yapılan önceki güzergah değişiklikleri (örn. seralar ve konut binaları üzerindeki etkinin önlenmesi, Manisa bölgesinde üst üste binen su altyapısı projeleri) - TCDD tarafından Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülen geçmiş kamulaştırma süreçleri (irtifak haklarının oluşturulması dahil)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	42 / 103

- TCDD tarafından tutulan Kamulaştırma Güzergahı belgelerine dayanarak arazi kullanımının mevcut durumu (örneğin)
- kamulaştırma süreci tamamlanmış parsellerde tarım arazileri ve binaların kullanım potansiyeli) ve güzergah boyunca kamulaştırma
- Hızlandırılmış kamulaştırma kararları ve Projedeki uygulamalar
- Hasat tamamlanıncaya kadar tahliyenin ertelenmesinin mümkün olmaması durumunda, kalan mahsuller için hasat mevsimlerinin beklenmesi veya yapılacak mahsul ödemeleri ile ilgili şartlar da dahil olmak üzere, PEK'ler tarafından halen kullanılmakta olan kamulaştırılmış parseller için tahliye prosedürleri (Kamulaştırma Kanunu, Madde 20 uyarınca)
- Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülen kamulaştırma çalışmaları kapsamında taşınmaz değerlemesi için TCDD tarafından izlenen prosedürler ve teknik şartname
- Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülen uzlaşma sürecinde etkilenen parsellerin muhtarları ve sahipleri/hissedarları ile yapılan sözleşme
- TCDD bölge müdürlüklerinin kamulaştırma veri tabanlarında (basılı nüshalar halinde) bilgi bulunması
- Gelecekteki kamulaştırma çalışmaları için kurumsal sorumluluklar (AYGM ve TCDD arasında açıklığa kavuşturulduğu rapor edilmiştir)

- Projenin ÇSED için temel sosyoekonomik koşullar ve potansiyel sosyal etkilerine ilişkin yerleşim düzeyi verilerini toplamak ve GKRP ve YYEP çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla etkilenen yerleşimlerin muhtarları ile sosyal ekip (telefonla) tarafından toplam 128 Topluluk düzeyinde anket (CLQ) yapılmıştır:
- Proje ile ilgili arazi edinimden etkilenen ve altyapı çalışmalarının Yüklenici sorumluluğunda olduğu bölümlerde yer alan yerleşimlerin muhtarlarına sahip 108 CLQ (Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 4 Salihli-Manisa bölümü).
 - Altyapı çalışmaları Yüklenici sorumluluğunda olmayan bölümlerde yer alan yerleşim yerlerinin muhtarlarının bulunduğu 13 adet CLQ (Kesim 3 ve Kesim 4 Manisa-Menemen kısmı).
 - Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenmemekle birlikte, ocak işletmeciliği ve YHT inşaatının potansiyel

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **"KONTROLLÜ KOPYA"** ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	43 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

				etkilerinden etkilenebilecek yerleşim yerinin muhtarları ile 7 CLQ yapılmıştır. CLQ'ların uygulanmasından önce, sosyal anketörler Müteahhit hakkında muhtarları, Müteahhit işlerinin mevcut durumu ve kapsamı ile anketlerin kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirmiştir.
	PEK'ler (arazi edinimi, inşaat ve taş ocağı Şubat 2021 faaliyetlerinin potansiyel sosyal etkilerine tabidir)	Şubat 2021	Hane halkı düzeyinde anketler (telefonla)	Temel sosyoekonomik koşullar ve ÇSED için Projenin potansiyel sosyal etkileri hakkında hane halkı düzeyinde veri toplamak ve GKR ve YYEP çalışmalarına katkıda bulunmak için PEK'lerle birlikte toplam 229 Hane halkı anketi (HHA): - Etkilenen özel arazi ve arazi varlıklarının sahipleri, etkilenen özel ve kamu arazilerinin kullanıcıları (resmi-gayri resmi), etkilenen ortak mülklerin faydalanıcıları (orman ve mera) ile Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen ve altyapı çalışmaları Yüklenici kapsamındaki bölümlerde yer alan yerleşim yerlerinde bulunan 200 HHA. - Altyapı çalışmaları Yüklenici sorumluluğunda olmayan bölümlerde yer alan yerleşim yerlerinde proje sahasına yakın evlerde yaşayan PEK'ler ve etkilenen özel ve kamu arazilerinin kullanıcıları ile 26 adet HHA (Kesim 3 ve Kesim 4 Manisa-Menemen kısmı). - Taş ocağı operasyonlarından ve YHT inşaatından etkilenebilen, yerleşim yerlerinde arazi ediniminden etkilenmemesine rağmen, Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenmeyen, ancak ocak operasyonlarının ve YHT inşaatının potansiyel etkilerinden etkilenebilen PEK ile 3 HHA. Genel Merkezler, kamulaştırma planları ve CLQ'lara dayanarak tespit edilebildikleri ölçüde, etkilenen evlerin sahipleri ve sakinleri ile de anketleri kapsamıştır. HHA yapılmadan önce sosyal anketörler, haneleri Yüklenici, Yüklenici işlerinin mevcut durumu ve kapsamı ve anketlerin kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirdi.
	Hassas PEK'ler Kadın PEK'ler	Şubat 2021	Kapsamlı mülakatlar (telefonla)	Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan hassas kişi ve kadınlarla toplam 28 görüşme yapılmıştır.

(*) ÇSED kapsamında sosyal anketler, IFC'nin COVID-19 Bağlamında Güvenli Paydaş Katılımı Konusunda IFC Müşterilerine Yönelik Ara Bilgilendirmesi uyarınca sosyal ekip tarafından telefon görüşmeleri yoluyla uzaktan yürütülmüştür (2020)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **"KONTROLLÜ KOPYA"** ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	44 / 103

5.5. Proje Paydaşları

IFC tanımına göre paydaşlar, bir projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kişi veya gruplar ve de bir projede menfaati olabilecek olanlar ve/veya proje sonuçlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek olanlardır (IFC, 2007. Paydaş Katılımı: Gelişmekte Olan Piyasalarda İş Yapan Kuruluşlara Yönelik İyi Uygulama El Kitabı).

Ulusal ÇED (2006 yılında tamamlanan) ve Projeyle ilgili kamulaştırma (2012-2018), bu PKP çerçevesinde Proje paydaşlarının belirlenmesinde incelenen ve dikkate alınan temel Proje süreçleri olmuştur. TCDD'nin kamulaştırma ile ilgili dokümanlarında (Kamulaştırma Programı, Kamulaştırma Planları ve yapı belirleme raporları), Projeyle ilgili arazi ediniminden etkilenen yerleşim yerlerinin tam listesi yer almaktadır. Projenin Ç&S etkilerine maruz kalması muhtemel yerleşim yerleri, Proje kamulaştırma koridoru dışındaki Proje tesislerinin (taş ocakları, malzeme temin sahaları, inşaat kamp sahaları gibi) konum bilgilerinin yer aldığı Proje dokümanları incelenerek tespit edilmiştir.

Projeden etkilenen yerleşim yerlerinin bulunduğu il ve ilçelere ilişkin sorumlulukları olan yerel yönetim kuruluşları, ilgili kurumların veri tabanlarından belirlenmiştir. Projenin geçtiği bölgedeki altyapı hizmetlerinin yönetimine ilişkin sorumlulukları olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve kuruluşları belirlemek için sözleşmeye bakılmış ve mevcut yazışmalar gözden geçirilmiştir.

Projeyle ilgisi ve Projeden menfaati olması muhtemel başlıca sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlar, ÇSED ekibinin mesleki deneyimine, diğer büyük altyapı projelerindeki ve aynı coğrafyada yürütülen projelerdeki iş ve katılım deneyimlerine ve de paydaşların Projedeki geçmiş/mevcut ilgi, hak ve menfaatlerine dayanarak belirlenmiştir.

ÇSED sürecinde yürütülen paydaş katılım faaliyetleri, Bölüm 3'te açıklanmıştır. Etkilenen yerleşim yerlerinin muhtarları ve hassas kişiler dahil olmak üzere etkilenen hane halkıyla yapılan kapsamlı sosyal anketlerde, yerel paydaşlar yerleşim yeri düzeyinde belirlenmiş olup, bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (6698 sayılı Kanun, 2016) uygun olarak Proje veri tabanında tutulmaktadır.

Kesim 3a, Kesim 3b, Kesim 4a, ve Kesim 4d'de altyapı çalışmaları devam eden diğer yükleniciler de Proje paydaşlarıdır ve kendileriyle Projenin bu kesimlerinin altyapı işleri için Yükleniciye (ERG OG) teslim edileceği zaman IFC Performans Standartlarına (2012) uygun şekilde yürütülecek Ç&S Denetimi çerçevesinde İşveren vasıtasıyla iletişime geçilecektir.

Tablo 15'te Proje paydaşlarının listesi verilmiştir. Bu liste, Proje süresince gerektiğinde güncellenecek ve detaylandırılacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	45 / 103

Tablo 15. Proje Paydaşları

Paydaş Grubu	Kesin Paydaşlar	Özel İlgili/Alaka/Etki
İç Paydaşlar		
Kredi Alan	Hazine ve Maliye Bakanlığı	- Kredi Alan - Resmi paydaş
İşveren	- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)	- İşveren / Proje Sahibi / Kredi Alan / İcra Kurulu - İnşaat Sözleşmesi Gereğince Proje ile İlgili Kamulaştırma Sürecinden Sorumlu Makam - Resmi paydaş
İşletmeci	- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)	- AYGM'nin katılımına kadar Proje ile ilgili kamulaştırma sürecinden sorumlu makam (gelecekteki kamulaştırma işlerinin sorumluluğu AYGM ve TCDD arasında ayrıca netleştirilecektir) - Resmi paydaş
OG Şirketleri	- ERG International UK Ltd. - ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ERG İnşaat) - SSB Sauerwein & Schaefer Bau AG (SSB)	İş büyümesi ve hissedar değeri
Yüklenici	Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı (Yüklenici)	- İnşaat faaliyetlerinin yönetimi - ÇS risklerinin ve etkilerinin yönetimi
Altyüklenici	- Ana alt yükleniciler - Alt kademe alt yükleniciler	- İstihdam fırsatı - Projeye ilgili İSG dahil olmak üzere iş gücü ve çalışma koşullarından kaynaklanması muhtemel Proje riskleri/etkilerine tabi olarak
Dış Paydaşlar		
Ulusal Resmi Kuruluşlar (Yetkili Kurumlar)	- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Tarım ve Orman Bakanlığı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı	- Projeye ilgili izin süreçleri - Politika geliştirme - Kümülatif etkilerin yönetimi
Yerel Resmi Kuruluşlar (Yetkili Kurumlar)	- Valilikler: • Ankara Valiliği • Eskişehir Valiliği • Afyonkarahisar Valiliği • Kütahya Valiliği • Uşak Valiliği • Manisa Valiliği	- Projeye ilgili izin süreçleri - Proje faaliyetlerinin ve süreçlerinin koordinasyonu - Çevresel etkilerin yönetimi - Acil duruma hazırlık ve koordinasyon

KONTROLLÜ
KOPYA

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	46 / 103

- İzmir Valiliği
- Polatlı Kaymakamlığı - Ankara
- İl Müdürlükleri
 - İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
 - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 - İl Sivil Savunma Arama Kurtarma Müdürlükleri
 - Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü
 - İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğü
 - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 - İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 - İl Sağlık Müdürlüğü
 - İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü
- Kaymakamlıklar:
 - Ankara
 - Polatlı Kaymakamlığı
 - Eskişehir
 - Günyüzü Kaymakamlığı
 - Sivrihisar Kaymakamlığı
 - Afyonkarahisar
 - Emirdağ Kaymakamlığı
 - Bayat Kaymakamlığı
 - İscehisar Kaymakamlığı
 - Merkez İlçe Kaymakamlığı
 - Sinanpaşa Kaymakamlığı
 - Kütahya
 - Dumlupınar Kaymakamlığı
 - Uşak
 - Banaz Kaymakamlığı
 - Merkez İlçe Kaymakamlığı
 - Ulubey Kaymakamlığı
 - Eşme Kaymakamlığı
 - Manisa
 - Kula Kaymakamlığı
 - Alaşehir Kaymakamlığı
 - Salihli Kaymakamlığı
 - Ahmetli Kaymakamlığı
 - Turgutlu Kaymakamlığı

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	47 / 103

- o Şehzadeler Kaymakamlığı
- o Yunusemre Kaymakamlığı
- İzmir
 - o Menemen Kaymakamlığı
- Belediyeler
 - Ankara Büyükşehir Belediyesi
 - o Polatlı Belediyesi
 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 - o Günyüzü Belediyesi
 - o Sivrihisar Belediyesi
 - Afyonkarahisar Belediyesi
 - o Emirdağ Belediyesi
 - o Bayat Belediyesi
 - o Işcehisar Belediyesi
 - o Merkez İlçe Belediyesi
 - o Sinanpaşa Belediyesi
 - Kütahya Belediyesi
 - o Dumlupınar Belediyesi
 - Uşak Belediyesi
 - o Banaz Belediyesi
 - o Merkez İlçe Belediyesi
 - o Ulubey Belediyesi
 - o Eşme Belediyesi
 - Manisa Büyükşehir Belediyesi
 - o Kula Belediyesi
 - o Alaşehir Belediyesi
 - o Salihli Belediyesi
 - o Ahmetli Belediyesi
 - o Turgutlu Belediyesi
 - o Şehzadeler Belediyesi
 - İzmir Büyükşehir Belediyesi
 - o Menemen Belediyesi
- Bölge Jandarma
- Polis
- Su ve Kanalizasyon İdaresi
 - ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 - ESKİ Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

**KONTROLLÜ
KOPYA**

**Kamu İktisadi
Teşebbüsleri,
Devlet Şirketleri**

- Mevcut altyapı hizmetleri dikkate alınarak çevre yönetimi ve inşaat faaliyetlerinin koordinasyonu

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	48 / 103

- Afyonkarahisar Su ve Kanalizasyon
- İdaresi Müdürlüğü
- Kütahya Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü
- Uşak Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü
- MASKİ Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
- İZSU İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
- Elektrik Dağıtım Şirketleri
- Enerjisa / EDAŞ Ankara Elektrik Dağıtım
- Zorlu Osmangazi Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
- GDZ Manisa & İzmir Elektrik Dağıtım
- Türk Telekom Genel Merkezi

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Yörede Saygı Duyulan Kişiler

- Müftü ve İmamlar
- Öğretmenler
- Sosyal sorumluluk / Hassas grupların belirlenmesi
- Okul Müdürleri

Yerleşim Yerleri

- Proje ile ilgili Ç&S risklerinden ve Proje ÇSYS aracılığıyla yönetilecek etkilerden etkilenen/etkilenme potansiyeli olan
- Ç&S etkilerinin yönetimi
- Kamulaştırma ve yerinden etme etkilerinin yönetimi
- Faydaları en üst düzeye çıkarmak için iş birliği ve yerel istihdam ile mal ve hizmet tedariki için planlama

Yerleşim Yerleri Hassas ve Dezavantajlı Kişiler/Gruplar

- Zihinsel ve/veya fiziksel engelli kişiler
- Eve bağımlı hastaların bakıcıları
- Türkçe konuşamayan/anlayamayan yabancı (Suriyeliler dışında)
- Yalnız yaşayan yaşlılar
- Okuma yazma bilmeyen insanlar
- Hayvan sahibi olmayan çobanlar
- Sosyal yardımla yaşayan yoksullar
- Geçimini kadının sağladığı haneler
- Çocuksuz dul kadınlar
- Okul çağında olan ancak okula gitmeyen kızlar
- Proje ÇSYS ile yönetilecek Proje ÇS risklerine ve etkilerine maruz kalan/maruz kalması muhtemel olanlar
- Hassas ve dezavantajlı Kişilerin/Grupların Proje hakkında yeterli bilgiye erişmesini sağlamak, bu kişi/grupların Projenin faydalarından eşit olarak yararlanmasını sağlamak

Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

- Aşağıdaki STK'ların merkez, il ve ilçe
- Çevre, sağlık, emniyet ve sosyal etkilerin yönetimi
- Kumülatif etkilerin ve itibar risklerinin yönetimi

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	49 / 103

düzeyindeki teşkilatları:

- Hassas Gruplara Destek

- Ticaret ve Sanayi Odaları
 - Jeoloji Mühendisleri Odası (Eskişehir Şubesi ve ilgili diğer şubeler)
 - Türkiye Jeofizik Mühendisleri Odası
 - Belediye Meclisleri
 - Doğa Derneği
 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
 - Destekleme Fonu
 - TEMA
 - Türkiye Muhtarlar Birliği
 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 - Türk Demiryolları İşçileri Birliği (Demiryol-İş)
 - Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği
 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 - (TMMOB)
 - WWF Türkiye
 - Kadın birlikleri ve dernekleri
- STK'ların Proje ile ilgi ve alakalarına göre bu liste genişletilebilir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Akademik Kurumlar/Eğitim Kurumları

- Ankara
- Hacettepe Üniversitesi
 - Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Polatlı Kampüsü
- Eskişehir
- Anadolu Üniversitesi
 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 - Eskişehir Teknik Üniversitesi
- Afyonkarahisar
- Afyon Kocatepe Üniversitesi
 - Afyonkarahisar Sağlık Birimi Üniversitesi
- Kütahya
- Kütahya Sağlık Birimi Üniversitesi
 - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
- Uşak
- Uşak Üniversitesi
- Manisa
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- İzmir
- Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	50 / 103

	- Ege Üniversitesi - Bakırçay Üniversitesi Menemen Koleji	
Yerel Medya	- Ulusal ve yerel gazeteler, yerel dergiler, yerel - TV kanalları vb.	- Paydaşlarla proje bilgi paylaşımı - Reklamlar
Yerel İşletmeler, Tedarikçiler, Diğer Endüstriyel Projeler	Yerel Firmalar	- Projenin potansiyel faydalarından/fırsatlarından olumlu etkilenir - Proje ile ilgili yerel mal ve hizmet temin Altyapı hizmetlerinin koordinasyonu - Kümülatif etkilerin yönetimi
Kredi Verenler	- UK Export Finance – İngiltere'nin resmi ECA'sı - SERV - İsviçre İhracat Risk Sigortası - OeKB - Avusturya ECA - SACE – İtalyan ECA - Credit Suisse - Standard Chartered Bank	- Proje finansmanı - ÇS risk değerlendirmesi, Kamulaştırma ve Arazi edinim yönetimi ve takibi

(*) Gerektiğinde paydaş listesi güncellenecektir. Proje ile özel ilgisi ve/veya ilgisi olan diğer paydaşlar, paydaş listelerinin bir sonraki yinelenmelerine dahil edilmek üzere inşaat aşamasında İşverenle, işletme aşamasında ise İşletmeci ile iletişime geçebilir. Yüklenici bu talepleri İşverene iletecektir.

Yerleşim Yeri Bilgi Anketi (Muhtarlar-Belediye Başkanları) çalışmaları 1., 2. ve 3. bölgede toplam 84 anket yapılarak, tamamlanmıştır. Ayrıca, yine 1., 2. ve 3. bölgede kamulaştırma nedeniyle fiziki olarak yerinden edilen (edilecek) yapılarla ilgili parsel maliklerini içeren Hane halkı Anketi çalışması toplam 55 anket yapılarak, tamamlanmıştır.

5.6. Paydaş Katılım Programı

5.6.1. ÇSED Bilgilendirme Aşaması

Projenin ÇSED Bilgilendirme Paketinde aşağıdakiler bulunur:

• Aşağıdakileri içeren ÇSED Açıklama Paketi:

- ÇSED raporu
- Paydaş Katılım Planı (PKP)
- Teknik Olmayan Özet (TOÖ)
- Proje Ç&S Yönetim ve İzleme Çerçeve Planı (ÇSYİÇP) (İşveren (AYGM), İşletmeci (TCDD) ve Yüklenici arasında kararlaştırılacak inşaat ve işletme aşaması Ç&S konularının yönetimi hususunda İşverenin/İşletmecinin ve Yüklenicinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi)



Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	51 / 103

Uluslararası Ç&S standartlarına uygun olarak, Proje “Kategori A” olarak kabul edilmektedir. A Kategorisi projelerin proje ve Ç&S etki bilgileri, destek verme taahhüdünden en az 30 gün önce UKEF’in web sitesinde yayımlanır/açıklanır.

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/909200/ukef-eau-external-process-update-june-2020.pdf).

ÇSED bilgilendirme dönemi boyunca, paydaş katılım faaliyetleri PKP doğrultusunda yürütülür. ÇSED Bilgilendirme Paketi, Proje web sitesinde (ankaraizmiryht.com) (İşveren adına) yayınlanacaktır. Uluslararası standartların ilgili gereksinimleri uyarınca, TOÖ, PKP ve ÇSYİÇP uygun açıklama yöntemleri kullanılarak Türkçe olarak açıklanacaktır. TOÖ, PKP ve ÇSYİÇP’nin basılı kopyaları, paydaşların gözden geçirmesi için Proje alanında tutulacaktır.

Şubat 2021’de atanan Yüklenici HİU, yerel topluluklarla etkileşime devam edecektir. Paydaş katılım faaliyetleri Toplantı Katılım Formu ile kaydedilecektir (örnek kayıt için bkz. Ek C).

ÇSED Bilgilendirme Aşamasında yapılacak faaliyetleri kapsayan Paydaş Katılım Programı Tablo 16’da sunulmuştur.

5.6.2. ÇSED Sonrası Aşaması

ÇSED sonrası aşamada PKP, Proje süresince uygulanacaktır. ÇSED Sonrası Aşamayı kapsayan Paydaş Katılım Programı Tablo 16’da sunulmuştur. İşletme aşamasında Yüklenicinin doğrudan sorumluluğu altındaki çalışma bileşenleri için, paydaş katılım faaliyetleri ve kilit paydaşlarla iletişim araçları, ilgili olarak Genel ve Bölgesel Proje Yönetimi ÇSYS ekibi sorumluluğunda devam edecektir.

Alıcı Kredisini Verenler ile Kredi Alan iletişimi, inşaat aşaması boyunca Yüklenicinin Üst Yönetim Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

ÇSED sonrası aşama için Paydaş Katılım Programı, periyodik (en az yıllık) PKP güncellemesinin bir parçası olarak, gerektiğinde, inşaat aşaması boyunca güncellenecektir.

PKP, işletmeye başlamadan önce ve işletme aşaması boyunca da periyodik olarak İşveren/İşletmeci tarafından işletme aşaması faaliyetleriyle ilgisi olacak paydaşlar göz önünde tutularak gereken şekilde güncellenecektir. İşletme aşamasında PKP’nin uygulanması, İşverenin/İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır.



PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	52 / 103

KONTROLLÜ
KOPYA

Tablo 16. ÇSED Bilgilendirme ve ÇSED Sonrası Proje Aşamaları için Paydaş Katılım Programı

Paydaş	Katılımın Amacı	Katılım için Kullanılacak Belgeler/Malzemeler	Katılım Yöntemi (*)	Yer	Sorumlu Taraf (İşverene Yardım Etmek/İş birliği Yapmak) (Bkz. Kaynaklar ve Sorumluluklar Bölümü 5.7)	Uygulama Takvimi
ÇSED Bilgilendirme Aşaması						
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kredi Alan) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AYGM (Proje Sahibi / Alıcı) ve TCDD (İşletmeci) Yüklenici	- Proje ÇSYS, ÇSYİÇP ve YYEP dahil olmak üzere Proje ÇSED Bilgilendirme Paketi tarafından belirlenen Proje Standartları hakkında bilgi alışverişi yapmak, mutabakat sağlamak - Projenin Proje inşaat işlerini finanse etmek için kullanılacak ihracat kredisi kapsamındaki Ç&S Yükümlülükleri - Proje ÇSYS, ÇSYİÇP ve özel Ç&S yönetim - planlarının uygulanmasıyla ilgili uygulama sorumlulukları ve koordinasyon mekanizmasının oluşturulması	- ÇSED Bilgilendirme Paketi - ÇSED Raporu - PKP - TOÖ - ÇSYİÇP - YYEP	- Yüz yüze toplantılar - ÇSED Bilgilendirme Paketi ve Proje web sitesindeki ilgili Ç&S belgeleri aracılığıyla - İlgili belgelerin kopyaları aracılığıyla (yetkililerin talebi üzerine ve talep ettiği biçimde)	- Hazine ve Maliye Bakanlığı - AYGM - Yüklenici ofisleri	- Kredi Alanın temsilcileri - İşverenin temsilcileri - İşletmecinin temsilcileri - Yüklenicinin Üst Yönetim Ekibi	ÇSED Bilgilendirme Dönemi Öncesi ve/veya Sırasında
Dış Paydaşlar (hepsi ilgili)		- ÇSED Bilgilendirme Paketi - ÇSED Raporu - PKP - TOÖ - ÇSYİÇP	ÇSED dokümantasyonunun dijital kopyalarının yayımlanması	- Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - IT Müdürü	ÇSED Bilgilendirme Döneminde
Merkezi ve Yerel Yönetim Kuruluşları	Paydaşlara Proje hakkında güncel bilgiler sağlamak, ÇSED sonuçlarını açıklamak ve paydaşların Proje ile ilgili endişelerinin, yorumlarının ve sorularının, planlanan Proje tesislerinin ve faaliyetlerinin potansiyel ÇSED etkilerinin ve Proje ÇSED'inin Proje planlama ve Nihai ÇSED dokümanlarına dahil edilmesini sağlamak.	<u>Yasal olarak korunan alanların yönetiminden sorumlu kamu kuruluşları (bkz. ÇSED Bölüm 10 "Biyocoşetlilik"):</u> En son tasarıma göre proje güzergahı	- Yüz yüze toplantılar - Resmi yazışmalar	- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Tarım ve Orman Bakanlığı - İlgili/gerekli diğer hükümet makamları	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi	ÇSED Bilgilendirme Döneminde
		<u>Kültürel mirasın yönetiminden sorumlu kamu kuruluşları</u> - En son tasarıma göre proje güzergahı - ÇSED tarafından belirlenen potansiyel arkeolojik alanlar hakkında bilgi – alan araştırmaları yoluyla kültürel miras ekibi (bkz. "Kültürel Miras" başlıklı ÇSED Bölüm 14)	- Yüz yüze toplantılar - Resmi yazışmalar	- Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıklarını Koruma Bölge - Konseyları	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - PKP Uzmanı/ Yüklenici HİU	ÇSED Bilgilendirme Döneminde
		<u>Kamu kuruluşu ve STK'lar (bu form aracılığıyla danışılacak belirli paydaşlar Yüklenici tarafından tespit edilecektir):</u> İlgili devlet kuruluşları ve STK'lar için Kurumsal Paydaş Katılım (bkz Ek D.)	- Kurumsal Paydaş Katılım (Bkz Ek D.)	Dijital	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi	ÇSED Bilgilendirme Döneminde
Yerel toplulukların muhtarları (seçilmiş yöneticiler) (Proje ile İlgili Arazi Ediniminden		<u>Yerel topluluklar:</u> PKP (Türkçe)	- Yüz yüze toplantılar - Telefon görüşmeleri	YHT güzergahı boyunca Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen	Yüklenici HİS	ÇSED Bilgilendirme Döneminde

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	53 / 103

Etkilenen Yerleşim Yerleri Listesi için bkz. Ek A).		- TOÖ (Türkçe) - YHT tarafından parçalanıp/parçalanacak parseller arasında erişimi sağlamak için her yerleşimde planlanan sanat yapılarına ilişkin bilgiler		yerleşim yerleri (yerleşim listesi için bkz. Ek A)		
Yöre Halkı (Projeyle Bağlı Arazi Alımından Etkilenen Yerleşim Listesi için bkz. Ek A) (Yerel Topluluklardaki Kadınlar ve Hassas PEK'ler dahil))	- Kamulaştırma işlemi tamamlanmış parsellerin zamanında tahliyesini sağlamak ve planlanan takvime göre Projenin uygulanmasını sağlamak - Kamulaştırma işlemi tamamlanmış parsellerin mevcut kullanıcılarını (tarım ve/veya konut amaçlı) Proje takvimi hakkında bilgilendirmek	<u>Yerel topluluklar (Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen parsellerin sahipleri/kullanıcıları):</u> Kamulaştırılan parsellerin tahliye işlemleri ve Proje takvimine ilişkin bilgileri içeren AYGM Resmi Mektubu (Not: Bu husus AYGM kararına tabidir. Yüklenici, 9 Şubat 2021 tarihinde AYGM'ye Proje takvimi ve kamulaştırılan parsellerin mevcut kullanıcıları üzerindeki potansiyel etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında kurumu bilgilendirmek üzere resmi bir mektup göndermiştir)	Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen yerleşim yerlerinin seçilmiş köy muhtarlarına AYGM tarafından gönderilecek resmi yazılar (Not: Bu husus AYGM kararına tabidir. Yüklenici, 9 Şubat 2021 tarihinde AYGM'ye Proje takvimi ve kamulaştırılan parsellerin mevcut kullanıcıları üzerindeki potansiyel etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında kurumu bilgilendirmek üzere resmi bir mektup göndermiştir)	YHT güzergahı boyunca Proje ile ilgili arazi ediniminden etkilenen yerleşim yerleri (liste için bkz. Ek A)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - Kamulaştırma Müdürü - Yüklenici HİU ve şantiye HİU'ları	ÇSED Bilgilendirme Döneminde
ÇSED Sonrası Aşama						
İlgili merkezi ve yerel yönetim kuruluşu	- Proje durumu ve inşaat/işletme faaliyetleri - hakkında güncel bilgi sağlamak - Çevresel, sosyal, mesleki ve toplum sağlığı ve güvenliği risk ve etkilerinin izin verilmesi, yönetimi konusunda yetkililerle istişarede bulunmak - Gerektiğinde acil duruma hazırlık ve müdahale, kumûlatif etki yönetimi vb. için iş birliği mekanizmaları oluşturmak	Yetkililer tarafından istenen herhangi bir özel belge	- Yüz yüze toplantılar - Telefon aramaları - Resmi yazışmalar - Yetkililer tarafından tercih edilen e- posta yazışmaları veya diğer yollar	- Ankara - Eskişehir - Afyonkarahisar - Kütahya - Uşak - Manisa - İzmir - Yüklenicinin İnşaat Kamp Sahaları (inşaat aşaması boyunca) - Uygun olduğu şekilde diğer konumlar - Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) - İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - Bölge Proje Yönetim Ekibi - İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	Tüm inşaat ve işletme aşamaları boyunca gerektiği gibi
Yerel toplulukların seçtiği Köy Muhtarları	- Aşağıdakilerle ilgili olarak zamanında, şeffaf, anlaşılır ve verimli bir şekilde güncel bilgileri sağlamak/değiş tokuş etmek; - Proje durumu - Mevcut/planlı faaliyetler - Faaliyetlerin potansiyel Ç&S etkileri	- Temel güncel Proje bilgilerini teknik olmayan ve anlaşılır bir dilde/formatta özetleyen broşürler, kitapçıklar, posterler, el ilanları, haritalar dahil olmak üzere bilgi paketleri - Şikayetlerin/geri bildirimlerin sunulması ve yönetimi ile ilgili iletişim kanallarına ilişkin bilgiler	- Seçilmiş köy muhtarlarının ofislerinde veya halka açık yerlerde uygun şekilde yüz yüze toplantıları (düzenli veya talep üzerine) - Şikayetleri/geri bildirimleri haftalık olarak kontrol etmek ve PKP'de tanımlanan zaman	- Etkilenen köylerde/ mahallelerde bulunan muhtarlıklar veya diğer kamu veya özel yerler (örneğin camiler, çay evleri ve kadınlar tarafından yaygın olarak ziyaret edilen yerler) - Yüklenicinin İnşaat Kampı	- Paydaş Katılım Uzmanı Bölge Müdürleri ve İlgili Şefler - Yüklenici HİU - İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	Aylık olarak tüm inşaat aşamasında Şikayet ve geri bildirim kutuları, Projenin inşaat aşaması boyunca haftalık olarak kontrol edilecektir İşletme aşamasından önce İşletmeci tarafından belirlenecek sıklıkta

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	54 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

	- Proje Ç&S Yönetim Sistemi - Kamulaştırma süreci - Planlanan paydaş katılımı etkinlikleri - İstihdam ve tedarik olanakları, işsiz nüfus ve nitelikleri • Proje ve mevcut faaliyetlerle ilgili geri	• Şikayet ve geri bildirim formları ve ilgili rehberlik belgeleri • Etkilenen topluluklara altı ayda bir raporlama	çizelgelerine göre yönetmek	Sahaları • Uygun olduğu şekilde diğer konumlar • Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) • İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)		
Yöre halkı (Projeye Bağlı Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşim Listesi için bkz. Ek A.)	• bildirim, şikayet, öneri toplamak • Cinsel şiddet ve taciz (CŞT) de dahil olmak üzere hassas kişiler ve kadınlarla ilgili belirli endişeleri/sorunları belirlemek. - Acil durumlara hazırlık ve müdahale ile toplum sağlığı, emniyet ve güvenlik yönetimi için iş birliği mekanizmaları oluşturmak	• Teknik olmayan sunumlar, Proje haritaları vb. • Kadınlar ve hassas gruplar/PEK'ler de dahil olmak üzere yerel toplulukları temel Proje bilgileri hakkında bilgilendirmek • için tasarlanmış broşürler, el ilanları, materyaller, teknik olmayan ve anlaşılır bir dilde/formatta belirli paydaş grubuyla ilgili Ç&S konuları • Etkilenen topluluklara altı ayda bir raporlama	• Broşür, el ilanı, materyallerin basılı kopyalarının dağıtımı • Teknik olmayan sunumlar • Yüz yüze toplantılar • Odak grup tartışmaları/ ayrı bilgilendirme toplantıları • Şikayet ve geri bildirim kutuları, formlar ve halka açık yerlerde yayınlanan/yerleştirilen rehberlik belgeleri	• Etkilenen köylerde/ mahallelerde seçilen köy merkezleri veya diğer kamu veya özel yerler (örneğin camiler, çay evleri) • Yüklenicinin İnşaat Kampı • Sahaları • Uygun olduğu şekilde diğer konumlar • Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) • İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	• Paydaş Katılım Uzmanı • Bölge Müdürleri ve İlgili Şefler • Yüklenici HİU ve şantiye HİU'ları • İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	İnşaat aşaması boyunca her yerleşim yerinde aylık olarak Şikayetler ve geri bildirimler, Projenin inşaat aşaması boyunca haftalık olarak kontrol edilecektir İşletme aşamasından önce İşletmeci tarafından belirlenecek sıklıkta
Yerel topluluklar içindeki Kadınlar ve Hassas PEK'ler		• Teknik olmayan sunumlar, Proje haritaları vb. • Kadınlar ve hassas gruplar/PEK'ler de dahil olmak üzere yerel toplulukları temel Proje bilgileri hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış broşürler, el ilanları, materyaller, teknik olmayan ve anlaşılır bir dilde/formatta belirli paydaş grubuyla ilgili Ç&S konuları • Gerektiğinde diğer özel olarak tasarlanmış bilgi materyalleri • Etkilenen topluluklara altı ayda bir raporlama	• Odak grup tartışmaları/ ayrı bilgilendirme toplantıları • Şikayet ve geri bildirim kutuları, formlar ve rehberlik belgeleri kadınlar ve hassas kişiler tarafından yaygın ve rahat bir şekilde ziyaret edilen yerlere asılır/yerleştirilir	• Etkilenen köylerde/ mahallelerde kadınların sıklıkla ve rahatça ziyaret ettiği yerler • Yerel kadınların bir araya geldiği yerler • Yüklenicinin İnşaat Kampı Sahaları • Uygun olduğu şekilde diğer konumlar • Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) • İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	• Paydaş Katılım Uzmanı • Bölge Müdürleri ve İlgili Şefler • Yüklenici HİU ve şantiye HİU'ları (kadın üyeler dahil) • İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	Her yerleşim yerinde periyodik olarak inşaat aşaması boyunca Şikayetler ve geri bildirimler, Projenin inşaat aşaması boyunca haftalık olarak kontrol edilecektir İşletme aşamasından önce İşletmeci tarafından belirlenecek sıklıkta
Yerel İşletmeler	• Yerel tedarik ve hizmet gereklilikleri ve fırsatları hakkında bilgi paylaşmak/bilgi alışverişinde bulunmak	• Gerekli mal ve hizmetlere ilişkin özel olarak tasarlanmış bilgi, rapor vb. • Etkilenen topluluklara altı ayda bir raporlama	• Bölgedeki yerel işletmelerle yapılan yüz yüze görüşmeler • E-posta yazışmaları • Telefon aramaları	• Ankara • Eskişehir • Afyonkarahisar • Kütahya • Uşak • Manisa • İzmir • Yüklenicinin İnşaat Kampı Sahaları • Uygun olduğu şekilde diğer konumlar • Proje web sitesi	• Bölge Müdürleri ve İlgili Şefler • Yüklenici HİU ve şantiye HİU'ları • İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	Tüm inşaat ve işletme aşamasında gerektiği gibi

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	55 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

				(ankaraizmiryht.com) • İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)		
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası STK'lar, Üniversiteler	- Proje ile ilgili belirli endişelere yanıt vermek - Projenin teknik ve Ç&S yönlerinin yönetimi için iş birliği mekanizmaları oluşturmak	Proje ile ilgili özel endişeler veya fırsatlar göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış bilgi materyalleri, raporlar vb.	Paydaşların ilgi ve alakasına göre geliştirilecek özel katılım yöntemleri	- Dijital - STK ofisleri - Üniversitelerin kampüsleri - Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) - İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - Bölge Proje Yönetim Ekibi - İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	İnşaat ve işletme aşamaları boyunca gerektikçe ve talep üzerine
Ulusal ve Yerel Medya	Kamuya açık Proje bilgilerini daha geniş ilgili taraflara zamanında, şeffaf ve verimli bir şekilde iletmek	- Basın Bülteni - Proje ile ilgili görsel - materyaller/reklamlar - Video/ses kayıtları	Yayımlanacak görsel materyallerin/bilgilendirici metinlerin/reklamların yerel ve ulusal medya ajansları ile paylaşılması	- İnternet - Gazeteler - Televizyon - Radio – telsiz - Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) - İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi - İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	İnşaat ve işletme aşamaları boyunca gerektikçe ve talep üzerine
İç Paydaşlar (Yüklenici ve Altyüklenici çalışanları)	- Aşağıdaki konularda bilgi paylaşmak için; - Projeye özgü Ç&G politikası ve ÇSYS dokümantasyonu dahil olmak üzere Proje Standartları - Projeye ilgili haberler - İşçi hakları ve çalışma şartları, - İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri - İç ve dış şikayet ve geri bildirim mekanizmaları (dahili CŞT konularını kapsayan) dahil olmak üzere Proje PKP'sinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak	- Personel sözleşmeleri - Davranış Kuralları - Eğitim materyalleri/sunumlar - Şirket ilan panoları - Çalışanlar tarafından seçilen işçi temsilcileri aracılığıyla - Proje Ç&S dokümantasyonu aracılığıyla - Duyurular - Şikayet ve geri bildirim formları ve rehberlik belgeleri	- İlgili yazılı belgelerin Proje çalışanları ile paylaşılması (işe alım anında) - İşe giriş ve oryantasyon eğitimleri (işe alım anında) - İşbaşı eğitimleri - İşe özel eğitimler - Ç&S Yönetim Sistemi Eğitimi - Acil Duruma Hazır Olma Tatbikatları - Periyodik S&G Komite Toplantıları	- Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) - Yüklenicinin/alt yüklenicinin inşaat kamp/tesis sahaları, konaklama tesisleri (inşaat aşaması boyunca) - İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi (Paydaş Katılım Uzmanı, İK, ÇS yöneticileri, vb. dahil) - Yüklenici HİU ve şantiye HİU'ları - İşletmeci (işletme aşaması boyunca)	İşe alım anında ve her bir işe alım yöntemi için belirtilen sıklıklarda
Kredi Verenler	Projenin Ç&G Performansı hakkında Kredi Verenleri bilgilendirmek/güncellemek	- Kredi Verenlere yıllık raporlama - Periyodik Finansal Kapanış Ç&S İzleme Raporları	- Yüz yüze toplantılar - E-posta yazışmaları - Telefon aramaları - Raporlama	- Yüklenicinin İnşaat Kampı Sahaları - Proje web sitesi (ankaraizmiryht.com) - Uygun olduğu şekilde diğer konular - İşletmecinin ofisleri ve O&M tesisleri (işletme aşaması boyunca)	- Üst Yönetim Ekibi - Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi	Kredi verenler tarafından ve talep üzerine belirlenecek sıklıklarda

(*) COVID-19 salgını sırasında gerekli olan toplantı amaçları için uzaktan/telefonla katılım kullanılacaktır.

Not: Kesim 3a, Kesim 3b, Kesim 4a, and Kesim 4d'de altyapı çalışmaları devam eden diğer yükleniciler de Proje paydaşlarıdır ve kendileriyle Projenin bu kesimlerinin altyapı işleri için Yükleniciye (ERG OG) teslim edileceği zaman IFC Performans Standartlarına (2012) uygun şekilde yürütülecek Ç&S Denetimi çerçevesinde İşveren vasıtasıyla iletişime geçilecektir.

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	56 / 103

Tablo 17. ÇSED Bilgilendirme ve ÇSED Sonrası Proje Aşamaları için Paydaş Katılım Programı İnşaat çalışmaları Öncesi Paydaş Bilgilendirme Toplantı Tablosu

İL	İLÇE	TOPLANTI SAYISI	BÖLGE
AFYON	Bayat	5	2
	Beyyazı	2	2
	Çayırbağ	1	2
	Düzağaç	3	2
	Emirdağ	18	1
	Fethibey	4	2
	Gebeceler	5	2
	Güney	1	2
	İscehisar	1	2
	Merkez	10	2
	Seydiler	3	1
	Sinanpaşa	7	2
	Susuz	3	2
ANKARA	Polatlı	4	1
	Günyüzü	6	1
ESKİŞEHİR	Sivrihisar	8	1
KÜTAHYA	Dumlupınar	4	2
UŞAK	Banaz	1	2
Genel Toplam		85	

5.7. Kaynaklar ve Sorumluluklar

Projenin ÇSYS Ekibi, inşaat aşaması boyunca bu PKP'nin ve Proje şikayet ve geri bildirim mekanizmasının uygulanmasında İşverene yardımcı olacak ve İşveren ile iş birliği yapacaktır. İşletme aşaması boyunca bu PKP'nin, Proje şikâyet ve geri bildirim mekanizmasının uygulanması İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır.

İnşaat aşamasında ÇSYS Ekibinin planlanan organizasyon yapısı, Yüklenicinin ve alt yüklenicilerin Proje düzeyinde Üst Yönetimi ve ÇSYS rolleri dahil olmak üzere, Şekil 7'de sunulmuştur. İşletmeci, kurumun organizasyon yapısı altında işletme aşaması için Proje ÇSYS Ekibini kuracaktır (<https://www.tcdd.gov.tr/kurumsal/organizasyon-semasi>).

Şubat 2021'de Genel Proje Yönetim Ekibi altında Ankara'dan bir Yüklenici HİU atanmıştır. Her bölümdeki paydaş katılım faaliyetlerini kapsamaktan sorumlu Şantiye HİU'ları, dış paydaşlarla etkin iletişim sağlamak için Yüklenici tarafından atanacaktır.




Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	57 / 103

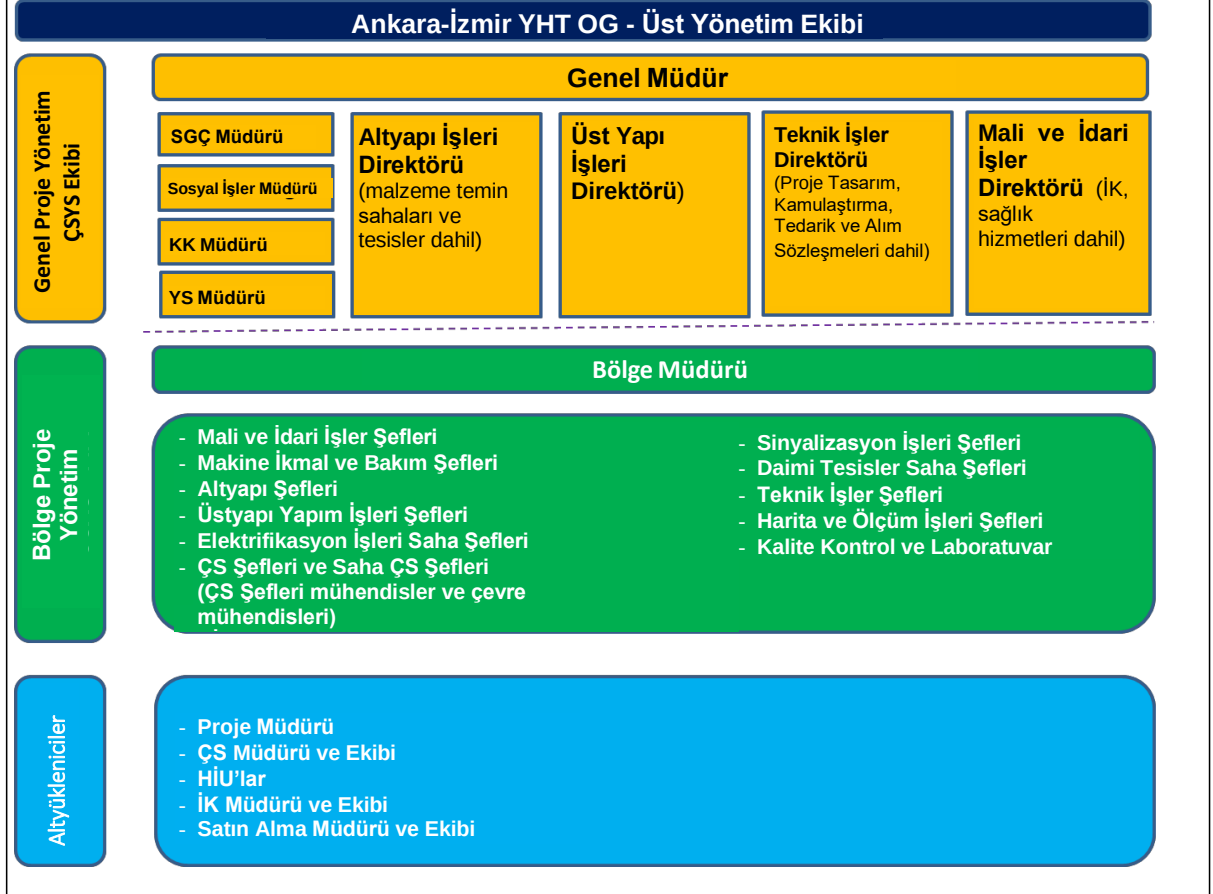

Şekil 7. Ankara-İzmir YHT Projesi - İnşaat Aşaması için OG'nin ÇSYS Ekibi

Bu PKP'nin uygulanması açısından ÇSYS Ekibinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra Proje şikayet ve geri bildirim mekanizmaları Tablo 18'de verilmiştir. Yüklenici tarafından belirlenen görev ve sorumluluklar bakımından İşletmeci, ÇSYS ekibinin işletme aşamasına yönelik görev ve sorumluluklarını tanımlayacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	58 / 103

Tablo 18. PKP ve Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizmasının Uygulanması ile ilgili Proje ÇSYS Ekibinin Görevleri ve Sorumlulukları

ÇSYS Ekip Üyesi	Ç&G ile İlgili Görev ve Sorumluluklar
Üst Yönetim	
Üst Yönetim ÇSYS Ekibi	- PKP'nin etkili bir şekilde uygulanması için İşverene yardımcı olmak ve İşverenle iş birliği yapmak - Proje Standartları doğrultusunda Proje boyunca PKP'nin etkili bir şekilde uygulanması için yeterli mali ve insan kaynağının tahsis edilmesini sağlamak. - Gerektiğinde, güncellemeler de dahil olmak üzere Ç&S politikalarını ve kilit Ç&S yönetim/eylem (örn. PKPL, YYEP) planlarını gözden geçirmek ve onaylamak. - Uygulamadan önce üst düzey/kilit paydaş katılım stratejilerini (örneğin, merkezi ve yerel hükümet paydaşları, parlamenterler, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, medya ile katılım) onaylamak - Genel Proje Yönetimi - ÇSYS ekibi tarafından sunulan raporlara dayanarak PKP uygulamasının periyodik gözden geçirmelerini yapmak.
Genel Proje Yönetimi	
ÇS Müdürü	- İç ve dış şikayetleri/geri bildirimleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin Proje PKP uyarınca şikayetleri/düzeltilici eylemleri duyarlı zaman dilimlerinde ele aldığından emin olmak/doğrulamak için Paydaş Katılım Uzmanı ve İK Müdürü ile koordineli olarak çalışmak; ÇS Saha Şefleri tarafından uygulanacak düzeltici eylemleri onaylamak - PKP uygulaması da dahil olmak üzere, Projenin SGÇ Performansı ve başlıca SGÇ hususları hakkında Üst Düzey Proje Yönetim Ekibine rapor vermek.
Paydaş Katılım Uzmanı	- Projenin sosyal performansının (paydaş katılımı, şikayet ve geri bildirim yönetimi ve geçim kaynağı restorasyonu/yeniden yerleşim ile ilgili önlemlerin/eylemlerin uygulanması dahil) Proje Standartlarına uygunluğunu denetlemek. - Proje ÇSYS'nin bir parçası olarak PKP'nin ve şikayet ve geri bildirim mekanizmasının uygulanmasına ilişkin sosyal yönetim/eylem planı güncellemelerini ve eğitim belgelerini hazırlamak. - Proje ile ilgili gelen şikayetleri/geri bildirimleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin Proje PKP'ye uygun olarak uygun süre zarfında proje ile ilgili şikayetleri/düzeltilici faaliyetleri ele aldığından emin olmak/doğrulamak için ÇS Müdürü, İK Müdürü ve diğer ilgili yönetici/direktörler ile koordineli olarak çalışmak. - PKP'nin uygulanması konusunda saha sosyal ekiplerinin/görevlilerinin kapasitesini değerlendirmek - Dış paydaşlarla etkin ve periyodik iletişim sağlamak - İç paydaşlarla etkin ve periyodik iletişimi sağlamak - Halktan gelen şikayetlerin ve geri bildirimlerin Proje PKP'ye kaydedilmesini ve yanıtlanmasını sağlamak - Halktan gelen şikayetleri ve geri bildirimleri veri tabanı olarak muhafaza etmek - Gerektiğinde alt yüklenicilerle koordineli olarak, kapalı olmayan şikayetleri çözmeyi amaçlayan önlemler de dahil olmak üzere toplumla ilgili sorunları çözmek için ek önlemler geliştirmek ve uygulamak. - Tüm taraflarca faaliyetlerle karşı karşıya kalan tüm paydaşlar arasında koordinasyon ve tutarlılığı sağlamak - Paydaş katılımı, şikayet ve geri bildirim yönetimi de dahil olmak üzere Projenin sosyal performansı ve kilit sosyal konuları hakkında Üst Düzey Yönetim Ekibine rapor vermek - Projeyle ilgili olarak halktan gelen şikayetleri ve geri bildirimleri gözden geçirmek ve saha ekiplerinin kamusal şikayetleri/düzeltilici eylemleri uygun zaman zarfında ele aldığından emin olmak

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	59 / 103

İnsan Kaynakları (İK) Müdürü	- Proje iş gücü yönetimi uygulamalarının Proje Standartlarına uygun olmasını ve buna göre Yüklenici ve alt yüklenicilere onaylanmasını sağlamak - Alt yüklenicilerin Proje çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim mekanizmasını uyguladıklarından emin olmak - PKP'nin uygulanması da dahil olmak üzere gerekli Ç&S eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesinde idari ve teknik ekipleri desteklemek. - Çalışan (iç paydaş) şikayetleri ve geri bildirimleri gözden geçirmek ve ilgili müdürlerin/yöneticilerin, Proje PKP'sine uygun olarak ilgili zaman dilimlerinde şirket çalışan (iç paydaş) şikayetleri/düzeltilici faaliyetleri ele almasını sağlamak/kontrol etmek için Paydaş Katılım Uzmanı ve ÇS Müdürü ile koordineli olarak çalışmak.
Yönetim Sistemleri Müdürü	Yönetim Sistemlerinin gereksinimlerini analiz etmek ve paydaşlarla etkileşim de dahil olmak üzere Yüklenici ve alt yükleniciler tarafından gereksinimlerin uygulanmasını sağlamak
Altyapı ve Üstyapı İşleri Direktörü	- Projedeki tüm ilgili ulusal mevzuat ve izin gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamak İnşaat aşamasında Proje PKP'sinin uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesini sağlamak - PKP'nin uygulanmasının tam mülkiyeti - Yüklenici ve alt yüklenicinin, ilgili sözleşme gereklilikleri aracılığıyla PKP ile tam olarak uyumlu olduğundan emin olmak
Teknik İşler Müdürü	- Projedeki tüm ilgili ulusal mevzuat ve izin gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamak - PKP şartlarının alt yükleniciler ve satıcılarla yapılan sözleşmelere/anlaşmalara dahil edilmesini sağlamak
Mali ve İdari İşler Müdürü	PKP'nin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli finansal kaynakların tahsis edilmiş olduğundan emin olmak
Bölge Proje Yönetimi (ÇS Pozisyonları)	
ÇS Şefi	- Proje ve Çalışan (iç paydaş) şikayetleri ve geri bildirimleri gözden geçirmek, Proje PKP uyarınca ve ÇS Müdürünün onayı ile uygun süre zarfında gerekli düzeltici eylemleri uygulamak için HİU'lar ile koordineli olarak çalışmak. - PKP uygulaması da dahil olmak üzere, Projenin ÇS Performansı ve temel ÇS sorunları hakkında ÇS Müdürüne rapor vermek
Halkla İlişkiler Sorumluları (HİU'lar)	- Projenin sosyal performansının (paydaş katılımı, şikayet ve geri bildirim yönetimi ile ilgili önlemlerin/eylemlerin uygulanması dahil) Proje Standartlarına uygunluğunu sağlamak. - İnşaat aşamasında dış paydaşlarla etkin ve periyodik iletişimi sağlamak. - İK ekibi ve ÇS şefleri ile koordineli olarak, tüm Proje personelinin (doğrudan ve sözleşmeli) istihdam anında Proje için geliştirilen Proje ve çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim mekanizmasının uygulanması (örneğin, çalışan (iç paydaş) şikayetlerin ve geri bildirimlerin nasıl sunulacağı, proje ile ilgili dış şikayetlerin ve geri bildirimlerin nasıl yönetileceği vb.) hakkında eğitim almasını sağlamak - Topluluk şikayetlerinin ve geri bildirimlerinin Proje PKP uyarınca kaydedilmesini, yanıtlanmasını ve Paydaş Katılım Uzmanına rapor edilmesini sağlamak - Gerektiğinde iç şikayetlerin ve geri bildirimlerin yönetiminde ÇS Şefi desteklemek
Altyükleniciler	

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	60 / 103

Altyükleniciler (Proje Müdürü, ÇS Müdürü ve Ekibi, HİU'lar, İK Müdürü ve Ekibi ve S/İK/Satınalma Müdürleri ve Ekipleri dahil ÇSYS Ekipleri

- Projeye özgü Ç&S politikalarına, Ç&S yönetim planlarına ve Proje Standartlarına, sözleşme gereklilikleri doğrultusunda PKP dahil olmak üzere uyulmasını sağlamak.
- PKP'yi uygulamak için yetkin ve eğitimli ÇS personelinin tahsis edildiğinden emin olmak
- PKP'nin uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesini sağlamak
- İç ve dış şikayetlerin ve geri bildirimlerin kaydedilmesini, Yükleniciye bildirilmesini ve Proje PKP gereklilikleri uyarınca Yüklenici ile mutabık kalınarak yanıtlanmasını sağlamak
- PKP uygulaması ile ilgili konular da dahil olmak üzere Yüklenici tarafından belirlenecek içerik ve sıklıklara göre periyodik SEÇ raporları hazırlamak.

5.8. Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması

Yüklenici (İş Ortaklığı şirketlerinden biri olarak ERG İnşaat aracılığıyla) Türkiye'de büyük ölçekli bir otoyol projesinin inşası için geliştirilmiş ve uygulanmakta olan iyi kurulmuş Proje ve çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim mekanizmalarına sahiptir.

İnşaat aşamasında Yüklenici, bu mevcut mekanizmaları Projeye uyarlayacak ve Projenin inşaat aşaması boyunca uygulayacaktır.

İnşaat aşaması boyunca iç ve dış şikayet mekanizmaları dahil olmak üzere PKP'nin uygulanması, kurum içi/kurumsal prosedürleri ve mekanizmaları doğrultusunda İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır.

Aşağıdaki kısımlarda hem Proje ile ilgili hem de çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim mekanizmaları açıklanmıştır (Paydaş şikayet ve geri bildirim formları için bkz. Ek E ve F). Mekanizmalar, kültürel olarak uygun, anlaşılır ve şeffaf bir danışma süreci kullanarak ve hiçbir ücret ödmeden ve sorunu veya endişeyi ortaya çıkaran dış veya iç tarafa misilleme yapmadan endişeleri derhal çözmeye çalışacaktır.

Proje ile ilgili şikayet ve geri bildirim mekanizmasının temel esasları:

**KONTROLLÜ
KOPYA**

- Tarafsızlık, gizlilik sağlama, baskı ve tehdit olmamasını temin etme
- Endişelerin Proje PKP'de belirtilen zaman dilimlerinde giderilmesini sağlama
- Anlaşılır, şeffaf, kültürel olarak uygun ve kolay erişilebilir bir danışma süreci sağlama
- İsimsiz olarak şikayette ve geri bildirimde bulunma seçeneği sunma, dile getirme ve ele alınmasına izin verilmesini sağlama
- Endişe ettiği hususu ortaya çıkaran kişi için herhangi bir masraf ve misilleme tehlikesi olmadan erişim sağlama
- Adli ve idari çözüm yollarına erişimi engellememe

Şikayet/geri bildirim sahibinin hakları şikayet ve geri bildirim sürecinin sonuçlarına itiraz etmekle sınırlı olmayıp aşağıdakileri de içerir:

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	61 / 103

- Şikayet/geri bildirim sahibi, şikayet ve geri bildirim mekanizmasına dahil olmak zorunda değildir ve başka adli, idari, hukuki çözüm yollarına başvurmayı tercih edebilir. Adli veya idari çözüm yolları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata göre uygulanacaktır.
- Şikayet/geri bildirim sahibi, şikayet yönetim sürecine dahil olmaya zorlanamaz.
- Şikayet/geri bildirim sahibi, istediği zaman Proje şikayet ve geri bildirim mekanizmasına katılımını durdurabilir ve başka yasal çözüm yollarına başvurmayı tercih edebilir.

İlgili devlet kurumu, Proje ile ilgili kamulaştırma sürecinin yürürlükteki mevzuat gereklilikleri uyarınca yürütülmesinden ve tüm kamulaştırma ödemelerinin hak sahiplerine yapılmasından sorumludur. İşveren/İşletmeci tarafından yürütülecek kamulaştırma/arazi edinimi sürecine ilişkin şikayet ve itirazlar, yürürlükteki mevzuat uyarınca doğal olarak İşverene/İşletmeciye yönlendirilmiş ve İşverene/İşletmeci tarafından yönetilmiş olup, yine İşverene/İşletmeciye yönlendirilecek ve onları tarafından yönetilecektir. İnşaat aşamasında Yüklenici, İşveren/İşletmeci tarafından yürütülen kamulaştırma/arazi edinimi sürecine ilişkin paydaşlar tarafından dile getirilen herhangi bir şikayet veya geri bildirimini yönetilmesi için yazılı olarak İşverene bildirecektir. Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun, 1983) uyarınca, talepleri ve itirazları kamulaştırma sürecinin idaresinden sorumlu devlet kuruluşu Kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde yönetir.

İnşaat aşamasında ÇSYS performansını izlemek için Yüklenici, Proje ÇSYS ekibi vasıtasıyla, periyodik iç Ç&S izleme faaliyetleri gerçekleştirecektir (İşveren adına). İç Ç&S izleme çalışmaları kapsamında PEK'ler (veya meşru temsilcileri) ve iç paydaşların Proje şikayet ve geri bildirim mekanizması ile ilgili deneyimleri ve tavsiyeleri sorulacak, böylelikle geri bildirimleri dikkate alınarak süreç sürekli iyileştirilecektir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

5.8.1. Talep Yönetim Mekanizması

Proje şikayet mekanizması Şikayet ve önerilere ek olarak, iç ve dış paydaşlardan gelen talepleri de değerlendirir.

Talep yönetimi mekanizması iç ve dış paydaşları ayrı ayrı içerecek şekilde Ek G'de detaylandırılmıştır.

5.8.2. Proje Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması

Şikayet ve geri bildirim mekanizması, Proje uygulama aşaması ile ilgili paydaş endişelerini gidermeye ve taraflar arasında güvenilir ve yapıcı bir ilişkiyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim aracıdır.

İnşaat aşaması boyunca paydaş katılım faaliyetlerinin koordinasyonundan ve şikayet ve geri bildirim mekanizmasının yönetiminden Proje HİU'ları sorumludur.

Proje şikayet ve geri bildirim mekanizmasının ilk etkinleştirme aşamasında Yüklenici HİU'ları kendilerini bilgilendirmek, geri bildirimlerini ve tavsiyelerini alıp sürece dahil etmek amacıyla PEK'ler ile iletişime geçecektir. HİU'lar, bir farkındalık yaratma süreci yürütecek ve yöre halkı dahil olmak üzere

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	62 / 103

dış paydaşları, Projenin şikayet ve geri bildirim toplama kanalları ve PKP uygulaması çerçevesindeki şikayet ve geri bildirim mekanizması hakkında bilgilendirerek, yazılı başvuruların şikayetleri gönderenleri korkutmak için kesinlikle kullanılmayacağına dair güvence vermek suretiyle şikayetlerini yazılı sunmaları yönünde teşvik edecektir .

İnşaat aşamasında kullanılacak olan Proje şikayet ve geri bildirim toplama kanalları Tablo 19'da açıklanmıştır. İşletmeci, bu kanalları gözden geçirecek ve işletme aşaması başlamadan önce güncellenip işletme aşaması boyunca uygulanacak PKP dahilinde kendi iç/kurumsal prosedürleri ve mekanizmaları ile tutarlı ve uygun şekilde uyarlayacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	63 / 103

Tablo 19. İnşaat Aşaması için Proje Şikayet ve Geri Bildirim Toplama Kanalları

Şikayet ve Geri Bildirim Toplama Kanalları	Açıklama
Proje internet sitesi	www.ankaraizmiryht.com
Adres	Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı Çankaya Cad. No : 26 06551 Çankaya Ankara
E-posta	1. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı¹⁴ : alptug.alper@aniyht.com 2. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: aydin.yasar@aniyht.com 3. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: ilknur.teksen@aniyht.com 5. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: -
Telefon	- Genel Merkez PBX: 0272 219 51 00 1. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 39 2. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 94 3. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 36 5. Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: -
Şikayet kutuları ve formları	- www.ankaraizmiryht.com/iletisimani.html - Şikayet ve geri bildirim kutuları ve formları (bkz. Ek E), Yüklenici HİU'ları tarafından Proje ile ilgili arazi edinim sürecinden etkilenen tüm yerleşim yerlerine ve ilgili şantiyelere yerleştirilecek ve muhafaza edilecektir. Şikayet ve Geri Bildirim Formu, uygun şekilde bir veya daha fazla yere koyulacaktır: - Köy/mahalle ofisleri - Köy/mahalle camileri - Yöre kadınlarının bir araya geldiği/kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri yerler - Yüklenici ve alt yüklenicinin şantiye kamp alanları - Beton santralleri - Şikayet ve geri bildirim formları mobil Proje araçlarında da mevcut olacaktır (örn. HİU'lar, ÇS şefleri, Proje alanlarında çalışan diğer toplulukla yüzleşen yöneticiler/direktörler tarafından kullanılan araçlar vb.)
Yüklenici (Şantiye) HİU'ları	- HİU'lar, kamuya açık ve münferit toplantılar sırasında, telefon görüşmeleri, e-postalar vb. yoluyla şikayetleri ve geri bildirimleri (sözlü veya yazılı) toplayacak ve Proje PKP gereğince yönetecektir. - Gerektiğinde HİU'lar, paydaşlara şikayet ve geri bildirim formlarının nasıl doldurulacağı konusunda rehberlik edecektir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

¹⁴ Projedeki 1-2-3 ve 5. Bölgelerin kilometre bilgileri aşağıda verilmiştir.

- 1. Bölge – Km 0 - 76 (Polatlı /Ankara – Emirdağ / Afyonkarahisar)
- 2. Bölge – Km 76 – 151 (Emirdağ /Afyonkarahisar – Susuz / Afyonkarahisar)
- 3. Bölge – Km 151 – 286 (Susuz / Afyonkarahisar – Banaz / Uşak)
- 5. Bölge – Km 440 – 547 (Salihli / Manisa – Menemen / İzmir)

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	64 / 103

Yüklenici ve altyüklenicilerin topluma muhatap olan diğer proje temsilcileri, müdürleri, yöneticileri vb.

- HİU'lar, diğer Yüklenici ve taşeron personeli (sözlü ve yazılı) tarafından toplanan şikayet ve geri bildirimlerin kendilerine/Yükleniciye iletilmesini, Proje PKP gereğince kayıt altına alınıp yönetilmesini sağlayacaktır.
- HİU'lar, Proje PKP'nin uygulanması konusunda Yüklenicinin ve alt yüklenicilerin topluma muhatap olan diğer Proje temsilcilerine, yöneticilerine ve müdürlerine eğitim verecektir.

Paydaşların Yüklenici ve alt yüklenicilerin şantiye kamp sahalarına ve diğer şantiye sahalarına kişisel ziyaretleri

- HİU'lar, Proje kampı ve şantiye ziyaretçilerine, mümkünse geri bildirimlerini ve şikayetlerini iletmek için şikayet ve geri bildirim formlarını doldurmaları konusunda rehberlik edecektir.
- Paydaş ziyaretleri sırasında sözlü geri bildirim ve/veya şikayetlerin alınması durumunda HİU'lar, bu geri bildirim ve şikayetlerin Proje PKP gereğince kayıt altına alınıp yönetilmesini sağlayacaktır.

Proje Sahibi ve diğer kamu yetkilileri aracılığıyla

- Paydaşlar Proje ile ilgili şikayetlerini ve geri bildirimlerini doğrudan Proje Sahibine ve/veya valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve seçilen köy muhtarları gibi diğer kamu yetkililerine iletebilirler. Yetkililer tarafından toplanan ve Yükleniciye iletilen bu tür şikayetler ve geri bildirimler, Proje şikayet ve geri bildirim veri tabanına kaydedilecek ve ilgili Proje PKP'sine göre yönetilecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Türk vatandaşları, tüzel kişiler ve yabancılar için merkezi bir şikayet sistemi sağlamaktadır. CİMER, Proje ile ilgili şikayetlerini ve geri bildirimlerini doğrudan devlet makamlarına iletmek için alternatif ve iyi bilinen bir kanal olarak Proje paydaşlarına sunulacaktır.
 - www.cimer.gov.tr
 - Çağrı Merkezi: 150
 - Telefon numarası: +90 312 525 55 55
 - Faks Numarası: +90 0312 473 64 94
 - Türkiye Cumhuriyeti İletişim Müdürlüğüne gönderilen posta
 - Valilikler, bakanlıklar ve kaymakamlıklardaki halkla ilişkiler masalarında bireysel başvurular
- CİMER aracılığıyla iletilen ve Projeye yöneltilen her şikayet ve geri bildirim, Proje şikayet ve geri bildirim veri tabanına kaydedilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun, 2016) tarafından öngörülen gereklilikler gözetilerek Proje PKP uyarınca yönetilecektir.

Proje şikayet ve geri bildirim mekanizmasının temel adımları Tablo 20'de kısaca açıklanmıştır (her adım, şikayet sahibi ile görüşülmesini ve/veya şikayet sahibinin bilgilendirilmesini içerir). İşletmeci, bu mekanizmayı gözden geçirecek ve işletme aşaması başlamadan önce güncellenip işletme aşaması boyunca uygulanacak PKP dahilinde kendi iç/kurumsal prosedürleri ve mekanizmaları ile tutarlı ve uygun şekilde uyarlayacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	65 / 103

Tablo 20. İnşaat Aşaması için Dış Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması

Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizmasının Adımları	Faaliyetlerin/Görevlerin Açıklaması (*)
Adım 1 – Alma ve kaydetme	- Şikayetler ve geri bildirimler, Tablo 7-1’de belirtilen kanallar aracılığıyla toplanır. - Şikayet ve geri bildirim kutuları haftalık bazda asgari olarak HİU’lar veya ÇS şefleri (veya şantiye İK personeli gibi atanmış diğer personel) tarafından kontrol edilir. - Tüm şikayetler ve geri bildirimler (yazılı veya sözlü) alındığı tarihten itibaren 48 saat içerisinde içinde HİU’lar tarafından Projenin şikayet ve geri bildirim veri tabanına elektronik olarak kaydedilir. Bununla birlikte köylerden toplanan yazılı şikayetler birkaç gün içerisinde (en fazla 7 gün) kayıt sistemine girilmiş olacaktır. - Şikayet ve Geri Bildirim Kaydına kaydılduktan sonra Şikayet/geri bildirim Paydaş Katılım Uzmanına iletilir. Önemine bağlı olarak Paydaş Katılım Uzmanı, Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibini ve/veya Üst Yönetim Ekibini bilgilendirir. Aksi takdirde, Üst Düzey Yönetim Ekibi periyodik iç izleme raporları aracılığıyla bilgilendirilir. - Şikayetin/geri bildirimin sahibi, isterse şikayetini/geri bildirimini isimsiz olarak gönderilebilir, ancak bu durumda doğal olarak mağdura geri bildirim verilemeyecektir. Ayrıca, şikayet/geri bildirim gönderen kişiler intikam veya misilleme/geri bildirimden muaf olacaktır ve Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizmasının kullanılması, şikayet/geri bildirim sahibinin diğer mekanizmalara (örneğin mahkemeler/yasalar aracılığıyla) erişimini engellemez.
Adım 2–Alındı onayı	- Şikayetler, alındığı tarihten itibaren 48 saat içinde kaydedilecektir. Bu 48 saat boyunca, şikayetler her seviyeden sorumlu kişiler tarafından doğruluklarının tespiti ve Proje faaliyetleriyle ilgili olup olmadıklarının belirlenmesi adına gözden geçirilecektir. Ortaya çıkan sorunlar/ihtilaflar Proje ile ilgili değilse, Şikayet Eden’e ilgili tarafla iletişime geçmesi için rehberlik edilecektir. HİU’lar veya ilgili Şantiye Şefleri, şikayetin/geri bildirimin alındığını ve doğru bir şekilde kaydedildiğini teyit etmek için şikayet sahibiyle 48 saat içinde mümkünse yazılı olarak (e-posta, kısa mesaj, yazı/dilekçe ile) ve/veya telefonla iletişime geçer. - Şikayet yönetim sürecinde kullanılacak iletişim kanalları (örn. telefon, mesajlaşma hizmeti, yazılı), şikayet/geri bildirim sahibi ile birlikte kararlaştırılacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	66 / 103

Adım 3 – Değerlendirme atama

ve

- Kaydolduktan sonra ilgili HİU, ilgili Şantiye Şeflerinin desteği ve rehberliği ile, potansiyel riskler ve öncelik, teknik karmaşıklıklar, aksiyon alternatifleri ve maliyet ve zaman etkileri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kriterlere dayanarak şikayetin/geri bildirimin niteliğini değerlendirecektir. Gerekirse HİU, şikayet ve geri bildirim mekanizmasının sonraki adımları aracılığıyla şikayet/geri bildirimin yönetiminden sorumlu olacak tarafı belirlemek için Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibinden/Paydaş Katılım Uzmanı daha fazla destek talep edecektir.
- Küçük/kolay çözülebilir şikayet olarak değerlendirilmesi durumunda¹⁵ ilgili HİU, ilgili Şantiye Şefleri ve Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi/Paydaş Katılım Uzmanı onayı ile, şikayeti alındıktan, kaydedildikten ve ilk değerlendirmeden sonra derhal (ilgili departmanlar/Şantiye Şeflerinin katılımı/eylemi yoluyla gerekirse) ele alacaktır. Küçük şikayetler için yapılan işlemler Şikayet ve Geri Bildirim Kaydında da kaydedilecektir.
- Şikayet/geri bildirim, mahiyetine bağlı olarak ilgili departman/şefler/uzmana atanacaktır. Şikayet Kaydı, atanan tarafı tanımlamak için ilgili HİU tarafından güncellenecektir.
- İnşaat aşaması boyunca Yüklenici, İşverenin/İşletmecinin yürüttüğü kamulaştırma/arazi edinim süreçleri ile ilgili olarak paydaşların ileri sürdüğü her türlü şikayet veya geri bildirimi kaydedecek ve ilgili şikayeti aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde yönetilmesi için yazılı olarak İşverene iletilecektir. Gerekmesi halinde, şikayetlerin Proje PKP doğrultusunda yönetilmesini sağlamak adına vaka bazında Yüklenici ile İşveren arasında takip toplantıları planlanacak ve düzenlenecektir.
- Şikayet/geri bildirim sahibi, şikayette ilgili bulgular/geri bildirimler hakkında yazılı olarak veya önceden kararlaştırılmış kanallar vasıtasıyla 10 iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.

Adım 4 – Diyalog soruşturma

ve

- Derhal çözülemeyen:30 takvim günü içerisinde (örneğin teknik karmaşıklıklar nedeniyle) şikayetler için, ilgili Proje tarafları (örneğin Genel ve Bölge Proje Yönetimi ekipleri, Şantiye Şefleri, uzmanlar, taşeron yöneticileri, vb.) arasındaki diyaloga dayanarak bir soruşturma süreci başlatılacaktır. Bu süreç;
 - Şikayet/geri bildirim sahibiyle görüşerek şikayetin yönetimi ile ilgili algı ve beklentilerinin anlaşılması
 - Sorunun niteliği ve karmaşıklığı nedeniyle gerekirse bir soruşturma ekibinin (örneğin teknik departmanlar) kurulması
 - Karmaşık teknik konular için dış tarafların desteğiyle gerektiğinde şikayetin araştırılması ve analizi (örneğin akredite laboratuvarlar, konu uzmanları, danışmanlar, vb.)
 - Şikayetin çözümü için uygulanacak aksiyonların/aksiyon seçeneklerinin ve sorumlu tarafların belirlenmesi (Şantiye Şeflerinin, Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibinin, gerektiğinde Üst Yönetim Ekibinin mutabakatı ve onayı ile)
- Şikayetin Yüklenici ile ilgili olmadığına karar verilmesi veya rahatsız edici/geçersiz şikayetler olması durumunda HİU Paydaş Katılım Uzmanı onayı ile soruşturmanın tamamlanmasından hemen sonra şikayetçiye bilgilendirecektir. Bu bildirim/eylem, HİU tarafından Şikayet ve Geri Bildirim Kaydında belgelenecektir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

¹⁵ Paydaş Katılım Uzmanı, diğer ilgili yöneticilerin/şeflerin girdileriyle, şikayetlerin küçük, orta veya büyük olarak tutarlı bir şekilde sınıflandırılmasına yardımcı olmak için bir değerlendirme matrisi geliştirecektir.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	67 / 103

Adım 5 – Yanıtlama	- Şikayetin araştırılması ve incelenmesi sonucuna dayanarak, Şantiye Şefleri ve/veya Genel ve Bölgesel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi/Paydaş Katılım Uzmanı desteği ile ilgili HİU tarafından Proje yanıtı ve çözüm seçenekleri/eylemleri de dahil olmak üzere zamanında, açık ve doğru bir yanıt geliştirilecektir. - Yazılı yanıt, HİU'lar veya Paydaş Katılım Uzmanı tarafından şikayet/geri bildirim sahibine iletilir (bu, uygun olduğu şekilde diğer sorumlu Proje personeline – Şantiye Şeflerine vb. - devredilebilir). - Şikayet çözüm yazısı, HİU tarafından şikayeti/geri bildirimi sunan kişiye şikayetin/geri bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde iletilir. Yanıt, mümkünse yazılı olarak verilir. Sözlü yanıtlar, varsa destekleyici materyaller/kanıtlarla birlikte uygun şekilde veri tabanına kaydedilir.
Adım 6 – Aksiyon	Çözüm ve itiraz süreçleri aşağıda belirtilen şekilde ilerleyecektir.
6.a. Başarılı Çözüm	Şikayetlerin çözümü için kararlaştırılan eylemler sorumlu departmanlar tarafından gerçekleştirilir.
6.b. İtiraz	Şikayetin çözümü Yüklenici ve şikayet sahibi arasında kararlaştırılmazsa, Şikayetçi, Anayasa ve yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca yürürlükteki Türk mevzuatı doğrultusunda resmi itiraz mekanizmalarını kullanma hakkına sahiptir.
Adım 7 – Takip ve Kapanış	- Eylemlerin tamamlanmasından ve şikayetin başarılı bir şekilde çözülmesinden sonra, şikayet sahibi, eylemin sonucu ve şikayetin başarıyla çözüldüğü konusunda, şikayetin/geri bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde düzenlenecek şikayet kapama yazısı ile bilgilendirilir. - Başarılı bir çözüm durumunda, şikayet sahibinin şikayetin çözümü konusundaki anlaşması uygun belgeler/mechanizmalar (örneğin yazışma/ımsalı belgeler, e-posta, kısa/WhatsApp mesajı vb.) aracılığıyla belgelenecek ve şikayetin kapatılması için ilgili açıklama/belgelere Şikayet Kaydında atıfta bulunulacaktır. - Büyük olarak sınıflandırılan şikayetler için HİU'lar/Paydaş Katılım Uzmanı tarafından, şikayet yönetimi sürecini iyileştirmek ve benzer şikayetlere gelecekteki yanıtları bildirmek için ilgili departmanlardan (örneğin teknik) gelen girdilerle bir kök neden analizi yapılacaktır.

(*) Yüklenicinin (Ortak Girişim şirketlerinden biri olarak ERG İnşaat aracılığıyla) Türkiye'de büyük ölçekli bir otoyol projesinin inşası için geliştirilen dış şikayet ve geri bildirim mekanizmasından alınmıştır/uyarlanmıştır.

5.8.3. Çalışan Şikayet (İç Paydaş) ve Geri Bildirim Mekanizması

**KONTROLLÜ
KOPYA**

İç paydaşlar Yüklenici ve alt yüklenici için çalışan işçiler (doğrudan ve sözleşmeli), yöneticiler, temsilciler ve tedarikçilerdir.

Yüklenici, işçilerin (ve varsa örgütlerinin) işyeri endişelerini dile getirmeleri için etkili bir şikayet ve geri bildirim mekanizması sağlayacaktır.

Tüm doğrudan ve alt yüklenici çalışanlarının işe alım süreçlerinde gerekli işe giriş ve eğitim programları sağlanacaktır. Eğitimler çevresel, sosyal, İSG, toplum sağlığı ve güvenliği konularını ve şikayet mekanizmalarını kapsayacaktır. Alt yüklenici personelinin bilgileri ve mekanizmanın Proje alt yüklenicileri tarafından etkin bir şekilde uygulanması, Yüklenici tarafından sözleşme gereklilikleri ile sağlanacaktır. (Alt Yüklenici Yönetim Planı – Alt Yüklenici Sağlık-Güvenlik – Çevre Taahhüdü (SEÇ).

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	68 / 103

Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ve Paydaş Katılım Planı (PKP) ve diğer belgelerdeki gereksinimler, iş başı eğitimi aracılığıyla netleştirilecektir.

Şantiyelerde, ortak alanlarda, yatakhanelerde ve lokallerde çalışan personelin (iç paydaş) öneri ve şikayetlerini almak için Şikayet ve Öneri Kutuları bulunmalıdır. Ayrıca bölge kamplarının ortak alanlarına şikayet süreci ile ilgili bilgilendirme afişleri ve bölgede görev yapan Halkla İlişkiler Uzmanlarının iletişim bilgileri asılacaktır.

Projede kullanılacak çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim toplama kanalları Tablo 21'de açıklanmıştır. İşletmeci, bu kanalları gözden geçirecek ve işletme aşaması başlamadan önce güncellenip işletme aşaması boyunca uygulanacak PKP dahilinde kendi iç/kurumsal prosedürleri ve mekanizmaları ile tutarlı ve uygun şekilde uyarlayacaktır.

Tablo 21. İnşaat Aşaması için Çalışan (İç Paydaş) Şikayet ve Geri Bildirim Toplama Kanalları

Şikayet ve Geri Bildirim Toplama Kanalları	Açıklama
Proje internet sitesi	• ankaraizmiryht.com
Adres	• Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı Çankaya Cad. No : 26 06551 Çankaya Ankara
Posta	• 1. Bölge ¹⁶ Halkla ilişkiler Uzmanı: alptug.alper@aniyht.com • 2. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: aydin.yasar@aniyht.com • 3. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: ilknur.teksen@aniyht.com • 5. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: -
Telefon	• Genel Merkez PBX: 0272 219 51 00 • 1. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: 0530 589 10 39 • 2. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: 0530 589 10 94 • 3. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: 0530 589 10 36 • 5. Bölge Halkla ilişkiler Uzmanı: -
Şikayet ve geri bildirim kutuları ve formları	• Şikayet ve geri bildirim kutuları ve formlar aşağıdaki yerlere yerleştirilecektir: ○ Yüklenici ve alt yüklenicilerin inşaat kamp sahaları (ofis, kafeterya, yurt, sosyal tesislerde, uygun görüldüğü şekilde) ○ Taşocakları, malzeme temin sahaları ve beton santrallerindeki ofis ve şantiyeler ○ Telefon ○ E-posta ○ Proje yöneticilerine/müdürlerine/şeflerine sunulacak dilekçeler ○ Köy/mahalle ofisleri ○ Köy/mahalle camileri ○ Yöre kadınlarının bir araya geldiği/kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri yerler

¹⁶ Projedeki 1-2-3 ve 5. Bölgelerin kilometre bilgileri aşağıda verilmiştir.

- 1. Bölge – Km 0 - 76 (Polatlı /Ankara – Emirdağ / Afyonkarahisar)
- 2. Bölge – Km 76 – 151 (Emirdağ /Afyonkarahisar – Susuz / Afyonkarahisar)
- 3. Bölge – Km 151 – 286 (Susuz / Afyonkarahisar – Banaz / Uşak)
- 5. Bölge – Km 440 – 547 (Salihli / Manisa – Menemen / İzmir)

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	69 / 103

	- Yüklenici ve alt yüklenicinin şantiye kamp alanları - Beton santralleri - Şikayet ve geri bildirim formları mobil Proje araçlarında da mevcut olacaktır (örn. ÇS Müdürü ve ÇS şefleri, HİU'lar, çalışma alanlarında atanan mobil ve sabit ÇS uzmanı tarafından kullanılan araçlar)
Sözlü olarak	- Proje müdürleri, yöneticileri, şefleri, ÇS uzmanları, HİU'lar vb. aracılığıyla. - Taşeronlar aracılığıyla (sistemik olarak Sözleşmeye aktarılacaktır) - Aylık İSG komitesi toplantıları ve çalışanlarla diğer toplantılar sırasında
Çalışan memnuniyet anketleri	Çalışan memnuniyet anketleri, İK tarafından belirlenecek frekanslarda yapılacaktır. Anketlerde isimsiz doldurma seçeneği sunulacaktır. Anketler, Proje İK Politikası ve Projenin ilgili uygulamalarında ele alınan konularla ilgili olarak çalışanların (iç paydaş) şikayetlerini ve geri bildirimlerini toplamak için tasarlanmış soruları içerecektir. Yüklenici, Alt Yüklenici çalışan memnuniyeti anketlerini kendi çalışan memnuniyeti anketlerine dahil edecektir.

Proje çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim mekanizmasının temel adımları Tablo 22'de özetlenmiştir. İşletmeci, bu mekanizmayı gözden geçirecek ve işletme aşaması başlamadan önce güncellenip işletme aşaması boyunca uygulanacak PKP dahilinde kendi iç/kurumsal prosedürleri ve mekanizmaları ile tutarlı ve uygun şekilde uyarlayacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	70 / 103

Tablo 22. İnşaat Aşaması için Çalışan Şikayet (İç Paydaş) ve Geri Bildirim Mekanizması

Şikayet Mekanizmasının Adımları	Faaliyetlerin/Görevlerin Açıklaması (*)
Adım 1 – Alma ve kaydetme	- Projede kullanılacak çalışan (iç paydaş) şikayet ve geri bildirim toplama kanalları Tablo 20’de belirtilmiştir. - Şikayet ve geri bildirim kutuları en az haftalık bazda şantiye HİU’lar ve İK personeli tarafından kontrol edilir (bu iş, İK Müdürü tarafından diğer ilgili saha personeline devredilebilir). - Tüm şikayetler/geri bildirimler (yazılı veya sözlü), alındıkları tarihten itibaren 48 saat içinde şantiye HİU’lar tarafından Projenin dahili şikayet ve geri bildirim veri tabanına elektronik olarak kaydedilir. - Elektronik veri tabanına kaydedildikten sonra şikayet/geri bildirim İK Müdürüne iletilir. Önemine göre İK Müdürü derhal Üst Yönetim Ekibine bilgi verir. Aksi takdirde, Üst Düzey Yönetim Ekibi periyodik iç izleme raporları aracılığıyla bilgilendirilir. - Şikayetin/geri bildirimin sahibi, isterse şikayetini/geri bildirimini isimsiz olarak gönderilebilir, ancak bu durumda doğal olarak mağdura geri bildirim verilemeyecektir. Ayrıca, şikayette bulunan kişiler intikam veya misillemeden muaf olacaktır ve Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizmasının kullanılması, şikayet sahibinin diğer mekanizmalara (örneğin mahkemeler/yasalar aracılığıyla) erişimini engellemez.
Adım 2 – Alındı onayı	- Şantiye İK personeli, şikayetin/geri bildirimin alındığı tarihten itibaren 48 saat içinde şikayetin/geri bildirimin alındığını teyit etmek için şikayette bulunan çalışanla (iç paydaş) (doğrudan veya sözleşmeli) e-posta veya telefonla veya şahsen iletişime geçer. - Şikayet yönetim sürecinde kullanılacak iletişim kanalları (örn. telefon, mesajlaşma hizmeti, yazılı), şikayet/geri bildirim sahibi ile kararlaştırılacaktır.
Adım 3 – Değerlendirme ve atama	- Şikayet kaydedildikten sonra ilgili şantiye İK personeli, ilgili Şantiye Şeflerinin desteği ve rehberliği ile, potansiyel riskler ve öncelik, teknik karmaşıklıklar, eylem alternatifleri ve maliyet ve zaman etkileri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kriterlere dayanarak şikayetin niteliğini değerlendirecektir. Gerekirse, şantiye İK personeli, şikayet mekanizmasının sonraki adımlarında şikayetin yönetiminden sorumlu olacak tarafı belirlemek için Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi/İK Müdüründen daha fazla destek talep edecektir. - Küçük/kolay çözülebilir şikayet olarak değerlendirilirse¹⁷, ilgili şantiye İK personeli, ilgili Şantiye Şefleri ve Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi/Paydaş Katılım Uzmanı onayı ile, şikayeti alındıktan, kaydedildikten ve ilk değerlendirmeden sonra derhal (ilgili departmanlar/Şantiye Şeflerinin katılımı/eylemi yoluyla gerekirse) ele alacaktır. Küçük şikayetler için yapılan işlemler Şikayet Kaydına da girilecektir. - Şikayet, mahiyetine göre ilgili bölüme/şefe/uzmana atanacaktır. Şikayet Kaydı, atanan tarafı tanımlamak için ilgili saha İK personeli tarafından güncellenecektir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

¹⁷ Paydaş Katılım Uzmanı diğer ilgili yöneticilerin/şeflerin girdileriyle, şikayetlerin küçük, orta veya büyük olarak tutarlı bir şekilde sınıflandırılmasına yardımcı olmak için bir değerlendirme matrisi geliştirecektir.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	71 / 103

Adım 4 – Diyalog ve soruşturma



- Derhal çözilemeyen (örneğin teknik karmaşıklıklar nedeniyle) şikayetler için, ilgili Proje tarafları (örneğin Genel ve Bölge Proje Yönetimi ekipleri, Şantiye Şefleri, uzmanlar, taşeron yöneticileri, vb.) arasındaki diyaloga dayanarak bir soruşturma süreci başlatılacaktır. Bu süreç;
 - Şikayet/geri bildirim sahipleri ile görüşerek şikayetin yönetimi ile ilgili algı ve beklentilerinin anlaşılması
 - Sorunun niteliği ve karmaşıklığı nedeniyle gerekirse bir soruşturma ekibinin (örneğin teknik departmanlar) kurulması
 - Karmaşık konular için dış tarafların desteğiyle gerektiğinde şikayetin araştırılması ve analizi (örn. hukuk müşavirleri, vb.)
 - Şikayetin çözümü için uygulanacak aksiyonların/aksiyon seçeneklerinin ve sorumlu tarafların belirlenmesi (Şantiye Şeflerinin, Genel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibinin, gerektiğinde Üst Yönetim Ekibinin mutabakatı ve onayı ile)
- Şikayetin Proje ile ilgili olmadığına karar verilirse veya rahatsız edici/geçersiz şikayetlerde bulunulması durumunda şantiye İK personeli, İK Müdürünün onayı ile soruşturma tamamlandıktan hemen sonra şikayetçiye bilgilendirecektir. Bu bildirim/eylem, Şikayet Kaydındaki şantiye İK personeli tarafından belgelenecektir.

Adım 5 – Yanıtlama

- Şikayetin araştırılması ve incelenmesi sonucuna dayanarak, Şantiye Şefleri ve/veya Genel ve Bölgesel Proje Yönetimi ÇSYS Ekibi/İK Müdürünün desteği ile ilgili şantiye İK personeli tarafından Proje yanıtı ve çözüm seçenekleri/eylemleri de dahil olmak üzere zamanında, açık ve doğru bir yanıt geliştirilecektir.
- Yazılı yanıt, şikayet sahibine şikayetin/geri bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde şantiye İK personeli veya İK Müdürü tarafından iletilir (bu, uygun olduğu şekilde diğer sorumlu Proje personeline – Şantiye Şeflerine vb. - devredilebilir).
- Yazılı veya sözlü yanıt, şantiye İK personeli tarafından şikayetin alındığı ve kaydedildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde şikayeti gönderen çalışana (iç paydaş) (doğrudan veya sözleşmeli) iletilir. Sözlü yanıtlar, uygun olan durumlarda destekleyici materyaller/kanıtlar ile veri tabanına kaydedilir.

Adım 6 – Aksiyon

- Çözüm ve itiraz süreçleri aşağıda belirtilen şekilde ilerleyecektir.

6.a. Başarılı Çözüm

- Şikayetlerin çözümü için kararlaştırılan eylemler sorumlu departmanlar tarafından gerçekleştirilir.

6.b. İtiraz

- Şikayetin çözümü şikayet sahibi ile kararlaştırılmazsa, Şikayetçi, Anayasa ve yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca yürürlükteki Türk mevzuatına uygun olarak resmi itiraz mekanizmalarını kullanma hakkına sahiptir.

Adım 7 – Takip ve Kapanış

- Eylemlerin tamamlanmasından ve şikayetin başarılı bir şekilde çözülmesinden sonra, şikayet sahibi, eylemin sonucu ve şikayetin başarıyla çözüldüğü konusunda, şikayetin/geri bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde düzenlenecek şikayet kapama yazısı ile bilgilendirilir.
- Şikayetin başarılı bir şekilde çözülmesi durumunda, şikayet sahibinin şikayetin çözümü
- konusundaki mutabakatı uygun belgeler/mechanizmalar (örneğin yazışma/ımsalı belgeler, e-posta vb.) aracılığıyla belgelenecek ve şikayetin kapatılması için ilgili açıklama/belgelere Şikayet Kaydında atıfta bulunulacaktır.
- Büyük olarak sınıflandırılan şikayetler için, şantiye İK personeli/İK Müdürü tarafından, şikayet yönetimi sürecini iyileştirmek ve benzer şikayetlere gelecekteki yanıtları bildirmek için ilgili departmanlardan (örneğin teknik) gelen girdilerle bir kök neden analizi yapılacaktır.

(*) Yüklenicinin (Ortak Girişim şirketlerinden biri olarak ERG İnşaat aracılığıyla) Türkiye'de büyük ölçekli bir otoyol projesinin yapımı için geliştirilen şikayet ve geri bildirim mekanizmasından alınmıştır/uyarlanmıştır.

5.8.4. ÇSED ve YYEP Anketleri Sırasında Topluluklar Tarafından İleri Sürülen Geriye Dönük Konular/Endişeler

ÇSED ve YYEP anketleri (ÇSED sürecine paralel olarak yürütülen anketler; geliştirilecek planlar) sırasında muhtarlar veya haneler tarafından dile getirilen ve önceki Proje faaliyetlerinden kaynaklanan

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	72 / 103

potansiyel retrospektif konular/endişeler ÇSED ekibi tarafından kaydedilmiştir. Muhtarların ve PEK'lerin dile getirdiği ana retrospektif konular/endişeler:

- Projeyle bağlı arazi ediniminin tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkileri (örn. kısmi kamulaştırma nedeniyle kullanılmayan kamulaştırılmış parsellerin kısımları; 2018 yılında inşaat işlerinin askıya alınması nedeniyle mera arazilerine erişimin kısıtlanması; Hafriyat malzemesi bertarafı nedeniyle tarım arazilerinin zarar görmesi, ödenmiş olan ürün ve arazi bedel değerlerinin yetersiz görülmesi ve inşaat çalışmaları nedeniyle bazı tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur).
- PEK'lerin yaşadığı fiziksel yeniden yerleşime bağlı etkiler (örneğin, etkilenen evler için belirlenen tazminat değerleri)
- Yaşam koşulları ve erişim kısıtlamaları üzerinde etkilere neden olan tamamlanmamış inşaat işleri (örneğin, köy yollarını kullanan inşaat trafiği nedeniyle sağlık ve güvenlik endişeleri, 2018 yılında inşaat işlerinin askıya alınması nedeniyle köy erişim yollarında hasar, viyadük ayaklarının tamamlanmaması veya tamamlanmış olan viyadüklerin çevresel/mevsimsel koşullar nedeniyle oluşan hasarların giderilmemesi nedeniyle sağlık ve güvenlik endişeleri).
- Muhtarlar, inşaat gürültüsünün en önemli sorun olduğunu belirterek, bunu inşaat tozu, inşaat trafiği ve yollarda ve erişimde kesinti izlemiştir. Muhtarların çoğunluğu, ekili tarım arazisi bulmanın zor olacağını belirtmektedir. Muhtarlar aynı zamanda projenin yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirtmiş ve özellikle istihdam ve hizmetlere daha iyi erişimle ilgili olarak, ulaşımın iyileştirilmesiyle bağlantılı sosyal faydalar olacağını belirtmişlerdir.

Geçim kaynaklarını iyileştirme planı kapsamında 1., 2.,3. bölgelerdeki tüm yerleşim yeri bilgi anketi (muhtar anketleri) Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 5. bölge yerleşim yeri bilgi anketleri 2022 Ağustos sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Hane halkı anketleri örneklem usulüyle yapılması planlanmaktadır.

Yerel makamlar ve muhtarlar, önceki yüklenicilerin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir şikayetin yönetimini sağlamak için Proje sahasına girmeden önce bilgilendirilmektedir. Yüklenici tarafından teslim alınması halinde, bu tür şikayetler yazılı olarak Yüklenici tarafından Proje Sahibine iletilecektir.

Proje Arazi Teslim, Giriş ve Çıkış Protokolü, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (ANİYHT) iş programı için AYGM ve TCDD tarafından arazi istismak işleri gerçekleştirilen bütün inşaat koridoru için aşağıdaki süreçleri açıklamaktır:

- Arazi Teslimine ilişkin süreçler
- Yüklenicinin Araziye Giriş ve Sahaya Erişim süreçleri
- Yüklenicinin Araziden Çıkışına ilişkin süreç



Bu adımlar, tümü ANİYHT için özel olarak hazırlanmış olan Yeniden Yerleştirme Politikası Çerçevesi (YYPÇ), Yeniden Yerleştirme Eylem Planı 1 (YYEP1) ve Yeniden Yerleştirme Eylem Planı 2 (YYEP2) doğrultusunda uygulanacaktır. Ayrıca, IFC PS5 gerekliliklerini de kapsar.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	73 / 103

Araziye erişim/giriş süreçleri, Projeden etkilenen arazi/hak sahipleri için arazi ediniminin bir sonucu olarak yer değiştirme ve potansiyel geçim kaybı tespit edilmektedir. İnşaat öncesi çalışmalar, mevcut risklerin ve etkilerin erken tespit edilmesini mümkün kılmakta ve riskler giderilene kadar riskli yerlerde inşaat faaliyetlerinden kaçınılmasını sağlamaktadır.

Geçim kaynaklarını iyileştirme çalışmaları, uluslararası standartlar (IFC P5 standardı) ve en iyi uygulamalar baz alınarak devam etmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında geçim kaynaklarını iyileştirme planı kapsamında uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Arazi girişi/edinimi sürecinin başlamasına ilişkin bildirimler aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

- Kamulaştırmaya rağmen halen tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde ürün yetiştirilen Kamulaştırma Koridoru'ndaki parsellerin sahipleri veya kullanıcıları, inşaat faaliyetlerine başlamadan önce bilgilendirilmektedir.
- Yüklenici, geçmişte (yapım işinin ERG iş ortaklığına devrinden önce) inşaat faaliyetlerinin başladığı, koridorun açıldığı ve üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyetin olmadığı herhangi bir ekin bulunmayan bir araziye fiziki olarak girmeden en az 3 gün önce duyurular ve/veya gerekirse muhtarlar aracılığıyla etkilenen arazi sahiplerini ve/veya kiracıları bilgilendirmektedir.
- Muhtarlara ve arazi sahiplerine görsel ve/veya işitsel olarak genel duyuru yapılacaktır.
- Trafik Yönetim Planı ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Trafik güvenliğine yönelik azaltıcı önlemleri belirlemekle birlikte, proje faaliyetlerine erişim ve mevcut yolları, bunların uzantılarını veya yeni yolları kullanırken tüm Proje personeli ve topluluk tarafından trafik güvenliğini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Proje şantiyelerine ve yan tesislere ulaşımı sağlamak için mevcut yollardan maksimum düzeyde kullanılması amaçlanmaktadır. Ancak belirli proje alanlarına ekipman, araç, ağır kamyon, malzeme ve personel nakletmek için ek yolların açılmasına ihtiyaç duyulabilir.

Geçici veya kalıcı, kullanılacak tüm güzergahlarda risk değerlendirmeleri yapılacaktır. bu risk değerlendirmeleri, periyodik olarak veya gerektiğinde gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Yeni yolların planlanması sırasında çevresel ve sosyal yönler dikkate alınacak; çevreye duyarlı alanlara, su geçişlerine, doğal kaynaklara, otlaklara, arkeolojik alanlara, kültürel açıdan önemli alanlara vb. özel olarak dikkat gösterilecektir. Yeni yollar, uzun yolların inşasına gerek kalmaması için mümkün olan yerlerde mevcut yol ağlarının yakınında planlanacak ve inşa edilecektir.

Yeni yollar, yağmur suyunu güvenli bir şekilde yol dışı drenaj kanallarına kanalizasyon etmek için yeterli eğimli ve çapraz drenajlı olarak tasarlanacak, böylece erozyon veya silt birikimi önlenecek ve yağmur suyunun yoldan güvenli bir şekilde akması sağlanacaktır.

Yeni erişim yollarının inşasından önce gerekli olduğu takdirde izin alım veya arazi kiralama sözleşmeleri tamamlanacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	74 / 103

Geçici olarak kullanılan erişim yolları yerel topluluklar tarafından artık ihtiyaç duyulmadığı belirtilmediği takdirde, kaldırılacak/eski durumuna geri döndürülecektir.

Tüm erişim yollarında hız sınırlarını ve izlenecek yolları gösteren uygun işaretlemeler bulunacaktır.

Proje kapsamında inşa edilecek köprüler, viyadükler ve tüneller; araçların, insanların, otlayan hayvanların ve yaban hayvanlarının altından veya üstünden erişimi mümkün kılan geçişleri sağlayacaktır.

5.9. İzleme ve Raporlama

Proje boyunca Proje ve Çalışan (iç paydaş)şikâyet mekanizmalarının işletilmesi de dahil olmak üzere PKP uygulaması için iç izleme gerçekleştirilecektir. Bu, alt yüklenicinin paydaş katılımının ve şikâyet yönetimi uygulamalarının izlenmesini de içerecektir.

PKP uygulamasında İşverene yardımcı olmak ve iş birliği yapmak için, PKP ve şikâyet mekanizmasının sahada uygulanması, ÇS Yöneticisi ve HİU'ları günlük sorumluluğu olacaktır. PKP uygulamasının ve şikâyet mekanizmasının periyodik iç izlemesi, ÇS Müdürünün desteğiyle (Kredi Verenlerin harici Ç&S izleme sıklığı ile uyumlu olarak) Paydaş Katılım Uzmanı tarafından yapılacaktır.

PKP'nin dahili izlemesi, dahili ve harici paydaşlarla yapılan görüşmeler, anketler, araştırmalar ve paydaş katılım günlükleri, şikâyet ve geri bildirim kayıtları vb. dahil olmak üzere belgelerin gözden geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Temel Performans Göstergeleri (KPI) de dahil olmak üzere dahili PKP izlemesinin çerçevesi Tablo 23'te sunulmuştur. Paydaş katılım faaliyetlerinin hedefi, paydaş katılım programının Tablo 16'da verilen Paydaş katılım zaman çizelgesi ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Dış ve iç şikâyet mekanizmalarının alındı onayı ve yönetim/çözüm hedefleri, bu PKP'nin belirtilen zaman çizelgelerine uygun olacaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	75 / 103

Tablo 23. PKP Uygulaması için Dahili İzleme Çerçevesi

İzleme Konusu	Temel Performans Göstergeleri (KPI)	Dahili İzleme Sıklığı	İzlemeden Sorumlu Taraflar
Paydaş katılımı	- Aşağıdakilere göre dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı: - o Paydaş grubunun türü (örneğin merkezi veya yerel hükümet makamları, kadınlar, hassas kişiler, STK'ler) - o Katılım yöntemi (örneğin yüz yüze toplantılar, telefon veya görüntülü aramalar da dahil olmak üzere uzaktan toplantılar, yazışma, Proje internet sitesi üzerinden güncellemeler, duyurular, vb.) - o Toplantı yerleri - İç paydaşlarla toplantı sayısı - Katılım faaliyetlerinde/etkinliklerde yer alan - paydaş sayısı (kişi veya kurum) Paydaşlarla paylaşılan materyal (Katılım Faaliyetlerinde kullanılacak - Dokümanlar/Materyaller için bkz. Tablo 16)	Aylık izleme (HİU'lar tarafından tutulacak Paydaş Katılım Günlüklerine ilişkin günlük kayıtlar)	Üst Yönetim Ekibi Paydaş Katılım Uzmanı HİU İşveren/İşletmeci temsilcileri (işletme aşaması boyunca)
Proje ile ilgili şikayet ve geribildirim mekanizması	- Aşağıdakilere göre Proje şikayetlerin/geri bildirimlerin sayısı - o Yerleşim yeri - o Konu (örneğin toz, gürültü, araziye zarar verme, kamulaştırma sorunları, trafik, sağlık ve güvenlik vb.) - o Şirket (Yüklenici veya Alt Yükleniciler) - o Yüklenici veya Alt Yüklenici bünyesindeki ilgili departman - o Yanıtlama süresi - o Çözüm süresi - Şikayet/geri bildirim durumu (açık, kapalı vb.) - Yanıt süresi - Çözüm süresi	Aylık izleme (Proje Şikayet Kaydındaki günlük kayıtlar HİU'lar tarafından saklanacaktır)	Üst Yönetim Ekibi Paydaş Katılım Uzmanı HİU İşveren/İşletmeci temsilcileri
Çalışan (iç paydaş) şikayet ve geribildirim mekanizması	- Şirket içi (çalışan) şikayetlerin/geri bildirimlerin - o sayısı - o Şirket - o Yüklenici veya Alt Yüklenici bünyesindeki ilgili departman - o Konu (sağlık ve güvenlik, konaklama koşulları, çalışma koşulları vb.) - Şikayet/geri bildirim durumu (açık, kapalı vb.) - Yanıt süresi - Çözüm süresi	Aylık (Proje Şikayet Kaydına ilişkin günlük kayıtlar ÇS Müdürü ve/veya Şefleri tarafından tutulacaktır)	Üst Yönetim Ekibi ÇS Müdürü ve Şefleri İK Müdürü İşveren/İşletmeci temsilcileri

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	76 / 103

PAYDAŞ KATILIM PLANI ÇERÇEVESİNDE 2022 YILI ÇALIŞMA PLANI

[illegible]

Şekil 8. Paydaş Katılım Planı 2022 Çalışma Planı

İç PKP izleme bulguları, Proje ÇSYS'sine göre (Kredi Verenlerin dış Ç&S izleme sıklığına uygun olarak) hazırlanacak periyodik Ç&S İç İzleme Raporlarına dahil edilecektir. Üst Yönetim Ekibi, Ç&S İç İzleme Raporlarının kopyalarını alacaktır.

PKP uygulaması ve şikayet/geri bildirim yönetimi de dahil olmak üzere Proje faaliyetleri ve genel ilerleme ve Ç&S performansı, etkilenen toplulukları Proje ve ilerleme hakkında düzenli olarak bilgilendirmek için Proje süresince periyodik olarak paydaşlara iletilecektir. Etkilenen topluluklara raporlama Türkçe, kolay anlaşılabilir, özlü ve teknik olmayan bir şekilde yapılacaktır.

İki yılda bir raporlamanın kapsamı aşağıdaki konulardan oluşacaktır.

- Proje ve durumu hakkında güncel bilgiler
- Proje ÇSED, ÇSEP ve ÇSYİÇP'de sağlanan ilgili taahhütlerin uygulama ilerlemesi.
- Toplulukların ilgilendiği konular için izleme sonuçları.
- Raporlama döneminde Projenin sağladığı faydalar.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Proje faaliyetleri değişirse veya yeni Ç&S riskleri ortaya çıkarsa, paydaşlara bu değişiklikler PKP’de ana hatlarıyla belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla görüşülmek üzere normal zaman çizelgesinin dışında iletilecektir.

PKP, Proje inşaatı sırasında gerektiğinde periyodik olarak (en az yılda bir kez) gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Devam eden paydaş katılım faaliyetleri ve sonuçları ile Proje ve çalışan (iç paydaş)şikayet mekanizmaları aracılığıyla belirlenen ve yönetilen kilit konular periyodik PKP güncellemelerine yansıtılacaktır.

PKP, işletmeye başlamadan önce ve işletme aşaması boyunca da periyodik olarak İşveren/İşletmeci tarafından işletme aşaması faaliyetleriyle ilgisi olacak paydaşlar göz önünde tutularak gereken şekilde güncellenecektir. İşletme aşamasında PKP'nin uygulanması, İşverenin/İşletmecinin sorumluluğunda olacaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	77 / 103

COVID-19 vb. viral hastalıklar salgını sırasında etkin bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı sürdürmek için öneriler ve değerlendirmeler geliştirilecektir. (Örn. Sosyal medya üzerinden bilgilendirme paylaşımları, Proje broşürü, telefon aracılığıyla bilgilendirme, video sunumu)

HİU'lar sanal toplantılar aracılığıyla etkilenen topluluklarla düzenli istişarelere liderlik edecektir.

İnternet sunumunun sınırlı olduğu durumlarda, HİU'lar (uygun olduğu durumlarda etkilenen paydaşlara ulaşmak için Muhtarlarla irtibat kuracak ve konum ve maksimum sayı ile ilgili mevcut salgın hastalık kısıtlamalarına uygun olarak, en az 2 metre sosyal mesafe ve maske kullanılarak, küçük odak grupları toplantıları gerçekleştirecektir.

5.10. Paydaşlar için İletişim Bilgileri

Proje Sahibi/ İşveren	T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Adres: Hakkı Turaylıç Cad. No:5 06338 Emek/Çankaya ANKARA E-posta: aygm.ozelkalem@uab.gov.tr Telefon: 0312 203 10 00
Proje internet sitesi	ankaraizmiryht.com
Yüklenicinin adı	E-posta: 1.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: alptug.alper@aniyht.com 2.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: aydin.yasar@aniyht.com 3.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: ilknur.teksen@aniyht.com 5.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı:- Telefon: - Genel Merkez PBX: 0272 219 51 00 1.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 39 2.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 94 3.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı: 0530 589 10 36 5.Bölge Halkla İlişkiler Uzmanı:-

(*) Gerektiğinde zamanında güncellenecektir.

İşletmeci bilgileri, işletme aşamasına geçilmeden önce güncellenecek PKP'ye eklenecektir.

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	78 / 103

6. İLGİLİ DOKÜMANTE BİLGİLER

- Ekvator Prensipleri (EP) 4 (2020)
- Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (PS) (2012)
- Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ortak Yaklaşımları (2016)
- UK Export Finance Çevre, Sosyal ve İnsan Hakları Politikası (2016, 2020 yılında güncellendi)

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	79 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Ek A Proje ile İlgili Arsa Ediniminden Etkilenen Yerleşim Yerlerinin Listesi

Demiryolu Hat Kesimi	İl	Demiryolu KM Noktası	İlçe	Mahalle/Köy	Yerleşim Yeri Türü	Toplam Mahalle/Köy Sayısı						
						İlçe Düzeyi	İl Düzeyi	Hat Kesimi Başına				
Kesim 1	Ankara	0+000.00-2+630.90	Polatlı	Yenice	Mahalle	4	4	47				
		2+630.90-6+521.64		Gümüşyaka	Mahalle							
		6+873.31- 11+171.30		Beşköprü	Mahalle							
		11+171.30-16+165.52		Kabakköy	Mahalle							
	Eskişehir	6+556.15-6+873.31	Günyüzü	Ayvalı	Mahalle	4	12					
		16+165.52-24+891.13		Gümüşkonak	Mahalle							
		24+891.13-29+451.25		Çakmak	Mahalle							
		29+451.25-39+201.15		Kayakent	Mahalle							
		39+201.15-45+228.35	Sivrihisar	İlyaspaşa	Mahalle	8						
		45+228.35-48+361.32		Yenidoğan	Mahalle							
		48+361.32-49+159.94		Göktepe	Mahalle							
		49+159.94-51+439.39		Ahiler	Mahalle							
		51+439.39-59+785.39		Kurtseyh	Mahalle							
		59+785.39-61+058.11		Buhara	Mahalle							
		61+058.11-66+764.12		Sığırcık	Mahalle							
		66+461.28-67+093.57		Buzlucam	Mahalle							
		Afyonkarahisar		67+093.57-72+249.30	Emirdağ				Çiftlikköy	Köy	16	66
				72+249.30-78+870.72					Eskiakören	Köy		
	78+870.72-80+215.53		Kılıçlar	Köy								
	80+215.53-83+347.30		Karayatak	Köy								
	83+347.30-86+507.58		Adayazı	Köy								

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA****PAYDAŞ KATILIM PLANI**

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	80 / 103

		86+507.58-89+271.97		Ekizce	Köy			
		89+271.97-90+163.13		Suvermez	Köy			
		90+163.13-90+543.24		Dağılgan	Köy			
		90+543.24-93.898.62		Türkmenakören	Köy			
		93+377.74-93+898.62		Elhan	Köy			
		96+678.60-98+709.97		Karaağaç	Köy			
		94+762-95+399		Yeniköy	Köy			
		95+399.43-96+678.12		İncili	Mahalle			
		98+709.97-102+960.56		Tabaklar	Köy			
		102+960.56-106+836.70		Emirin köyü	Köy			
		106+836.70-113+376.10		Yüreğil	Köy			
		113+376.10-125+922.54	Bayat	Merkez İlçe Belediyesi, Büyük	Mahalle	6		
				Merkez İlçe Belediyesi, Cumhuriyet	Mahalle			
				Merkez İlçe Belediyesi, Yeni	Mahalle			
				Merkez İlçe Belediyesi, Hürriyet	Mahalle			
				İmralı	Köy			
		125+922.54-126+216.30		İmralı	Köy			
		126+216.30 - 129+300		Sağırlı	Köy			
		129+300.86 - 137+545	İscehisar	Seydiler İlçe Belediyesi, Cumhuriyet	Mahalle	3		
				Seydiler İlçe Belediyesi, Hasan Basri	Mahalle			
				Kavak	Mahalle			
		137+545.94 - 139+237.14	Merkez	Gebeceler İlçe Belediyesi, Fatih	Mahalle	29		
				Gebeceler İlçe Belediyesi, İstiklal	Mahalle			
				Gebeceler İlçe Belediyesi, Kocatepe	Mahalle			
				Gebeceler İlçe Belediyesi, Yeni	Mahalle			
				Gebeceler İlçe Belediyesi , Zafer	Mahalle			
		145+349-148+637		Çavdarlı	Köy			
149+452.79 - 149+597.43								

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA****PAYDAŞ KATILIM PLANI**

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	81 / 103

Kesim 2		148+637-156+231		Susuz İlçe Belediyesi, Gökhan	Mahalle			
				Susuz İlçe Belediyesi, Osmanlı	Mahalle			
				Susuz İlçe Belediyesi, Sakarya	Mahalle			
				Susuz İlçe Belediyesi, Selçuklu	Mahalle			
		156+407-159+175		Beyyazı İlçe Belediyesi, Cumhuriyet	Mahalle			
				Beyyazı İlçe Belediyesi, Örnek	Mahalle			
				Beyyazı İlçe Belediyesi, Atatürk	Mahalle			
		156+722.64 - 159+231.15		Akçın	Mahalle			
		159+175-163+605		Erenler	Mahalle			
		159+231.13 - 161+885.12		Örnek	Mahalle			
		162+608-163+605		Çayırbağ İlçe Belediyesi, Aliçetinkaya	Mahalle			
				Çayırbağ İlçe Belediyesi, Fatih	Mahalle			
				Çayırbağ İlçe Belediyesi, Huzur	Mahalle			
				Çayırbağ İlçe Belediyesi, Uğur	Mahalle			
		163+605-164+777		Fethibey İlçe Belediyesi, Fatih	Mahalle			
				Fethibey İlçe Belediyesi, Yavuzselim	Mahalle			
				Fethibey İlçe Belediyesi, Yunusemre	Mahalle			
		164+777-166+195		Bayatçık	Mahalle			
		166+777-169+329		Saraydüzü	Köy			
		169+329-170+540		İsmail	Mahalle			
		170+540-171+550		Sadıkbey	Mahalle			
		171+550-174+550		İnaz (Demirçevre)	Mahalle			
		174+760-179+800		Köprülü	Köy			
		179+800-183+940		Balmahmut	Köy			
		183+940-188+420		Bulca	Köy			
		188+422.96 - 190+681.79	Sinanpaşa	Ayvalı	Köy	12		

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	82 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

		190+700-192+400		Akdeğirmen	Köy				
		192+400-199+200		Düzağaç İlçe Belediyesi, Işık	Mahalle				
				Düzağaç İlçe Belediyesi, Zafer	Mahalle				
				Düzağaç İlçe Belediyesi, Cumhuriyet	Mahalle				
				Düzağaç İlçe Belediyesi, Fatih	Mahalle				
				Karacaören	Köy				
		202+285.01 - 207+421.91		Güney	Köy				
		207+180-208+700		Elvanpaşa	Köy				
		208+700-210+980		Çalışlar	Köy				
		247+648.52 - 247+794.30		Kızılca	Köy				4
	213+740-215+560	Turgutözal	Mahalle						
	215+560-217+000	Zafer	Mahalle						
	217+000-219+900	Cumhuriyet	Mahalle						
	Uşak	210+980-213+740	Çiftlik	Köy	19	48			
		219+900-224+800	Büyükoturak	Köy					
		224+800-229+520	Halaçlar	Köy					
		229+520-229+600	Düzlüce	Köy					
		229+600-231+214	Dümenler	Köy					
	Kesim 3		269+028.65 - 272+636.85		Alaba	Köy			71
			272+395.50 - 277+772.40		Hatipler	Köy			
277+760.80 - 279+097.50			Banaz		Köy				
278+911.60 - 279+656.85			31 Ağustos		Mahalle				
279+627.05 - 283+510			İslam		Mahalle				
279+724.45 - 280+971.35			Bağkonak		Köy				
283+498.65-286+751.10			Güllüçam		Köy				
286+738.05 - 292+093.60			Öksüz		Köy				

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **"KONTROLLÜ KOPYA"** ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	83 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

		290+117.45 - 290+224.10		Gedikler	Köy				
				Kızılcasöğüt İlçe Belediyesi, Barış	Mahalle				
		292+091.05 - 296+615.85			Kızılcasöğüt İlçe Belediyesi, Cumhuriyet				Mahalle
				Kızılcasöğüt İlçe Belediyesi, Emek	Mahalle				
		295+451.90 - 297+175.20	Merkez	Derbent	Köy	10			
		296+937.15 - 299+054.70		Kızılhisar	Köy				
		298+803.60 - 301+723.05		Kırka	Köy				
		301+234.70 - 305+878.15		Kabaklar	Köy				
		305+873.30 - 311+678.90		Yapağılar	Köy				
		311+644.80 - 313+159.55		Koyunbeyli	Köy				
		313+061.10 - 316+270.90		Yavi	Köy				
		314+395.95 - 317+641.25		Hocalar	Köy				
		317+572.85 - 320+062.60		Elmacık	Köy				
		320+035.40 - 321+218.15		Selikler	Köy				
		320+178.45 - 325+365.05		Karahasan	Köy				
		325+237.45 - 326+135.30		Demirören	Köy				
		328+049.95 - 338+909.30	Ulubey	Omurca	Köy	7			
		326+109.75 - 328+891.00		Bekdemir	Köy				
		328.865.40 - 332+884.20		Köşeler	Köy				
		332+864.95 - 341+341.40		Uyukbaşı	Mahalle				
		341+315.00 - 347+264.80		İnay	Köy				
		347+270.30 - 350+712.60		Karacaahmet	Köy				
		350+641.75 - 353+133.45	Esme	Gedikler	Köy	12			
		353+077.80 - 358+604.80		Ahmetler	Köy				
		358+530.40 - 363+852.60		Elvanlar	Mahalle				
		363+852-364+949		İstasyon	Mahalle				

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **"KONTROLLÜ KOPYA"** ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	84 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

		368+894.17 - 370+513.65		Yaylaköy	Köy			
		370+513.65 - 372+962.73		Armutlu	Köy			
		372+962.73 - 374+029.10		Caberler	Köy			
		374+029.10 - 375+629.37		Güney	Köy			
		374+743.45 - 375+781.80		Balabancı	Köy			
		375+781.80 - 375+825.31		Cevizli	Köy			
		375+825.31 - 378+457.57		Manavlı	Köy			
		378+457.57 - 382+318.51		Davutlar	Köy			
		382+318.54 - 384+973.61		Narınçalı	Köy			
		Manisa		384+973.69-387+350	Kula			
	387+353.10-388+680		Çarıkballı	Mahalle				
	405+241.47 - 406+165.76		Konurca	Mahalle				
	384+527.39 - 384+800.00		Alaşehir	İsmailbey	Mahalle	18		
	388+680 – 389+880			Serinköy	Mahalle			
	389+800 – 390+960			Caberkamara	Mahalle			
	390+960.00 - 392+926.98			Aydoğdu	Mahalle			
	392+926.98 - 394+251.69			Gümüşçay	Mahalle			
	394+251.69 - 397+069.88			Serinyayla	Mahalle			
	397+069.88 - 400+166.70			Çarıktekke	Mahalle			
	398+309.38 - 398+417.20	Caberkakılı		Mahalle				
400+017.33 - 402+007.64	İşıklar	Mahalle						
402+007.64 - 403+968.87	Selce	Mahalle						
403+968.83 - 405+786.29	Tepeköy	Mahalle						
406+165.76 - 407+569.00	Türkmen	Mahalle						
407+568.90 - 409+016.95	Matarlı	Mahalle						
409+016.95 - 411+410.00	Kasaplı	Mahalle						

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	85 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

		411+401.16 - 415+369.85		Toygarlı	Mahalle					
		415+369.85 - 419+286.57			Kemaliye		Mahalle	19		
		419+286.57 - 421+088.11			İsmetiye		Mahalle			
		423+504.40 - 424+511.09			Kavaklıdere		Mahalle			
		421+088.11 - 422+734.17	Salihli	Hacılı	Mahalle					
		424+758.68 - 426+704.27		Torunlu	Mahalle					
		425+187.19 - 425+583.77		Köseali	Mahalle					
		426+704.27 - 429+792.60		Yeşilova	Mahalle					
		429+792.60 - 431+898.19		Beylikli	Mahalle					
		431+898.00 - 434+477.24		Kabazlı	Mahalle					
		432+182.78 - 436+404.80		Durasıllı	Mahalle					
		436+404.80 - 438+422.65		Karaoğlanlı	Mahalle					
		438+420.57 - 440+981.30		Kirveli	Mahalle					
440+981.50 - 441+477.24	Beşeylül	Mahalle								
441+477.24 - 441+957.19	Gaziler	Mahalle								
Kesim 4		441+955.69 - 442+628.11			Atatürk	Mahalle	4		42	
		442+623.19 - 442+985.87		Zafer	Mahalle					
		442+773.67 - 423+510.61 423+835.03 - 424+070.47 424+511.09 - 424+758.68		Mevlütü	Mahalle					
		442+986.99 - 444+128.44		Keli	Mahalle					
		444+130.70 - 446+757.99		Yılmaz	Mahalle					
		446+780.32 - 449+952.55		Hasalan	Mahalle					
		449+975.41 - 454+200.93		Kapancı	Mahalle					
		454+160.47 - 455+672.91		Mersindere	Mahalle					
		445+664.22 - 458+548.98	Ahmetli	Yaraslı	Mahalle					
		455+664.22-467+619.58		Seydiköy	Mahalle					
		462+842.28 - 463+817.29		Alahıdır	Mahalle					

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	86 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

		463+830.04 - 467+268.87		Gökkaya	Mahalle		
		467+268.35 - 469+468.00		Urganlı	Mahalle		
		468+724.96 - 470+206.42		Yeniköy	Mahalle		
		470+223.30 - 474+280.82		Derbent	Mahalle	9	
		474+284.65 - 476+534.59		Avşar (Kısmen Eski 10.Mıntıka)	Mahalle		
		475+983.69-478+978.46	Turgutlu	Şehitler (Eski 4.Mıntıka)	Mahalle		
		476+532.07 - 478+049.42		Albayrak (Eski 2. Mıntıka)	Mahalle		
		478+986.46 - 481+241.44		İstasyonaltı (Eski 2.Mıntıka)	Mahalle		
		481+265.22 - 484+126.67		Mustafa Kemal (Eski 8. Mıntıka ve Eski 11. Mıntıka)	Mahalle		
		483+980,44 - 488+740.25		Atatürk (Eski 7.Mıntıka)	Mahalle		
		487+954.09 - 489+177.01		Aşağıçobanisa	Mahalle		
		491+597.42-494+893.46		Karaoğlanlı	Mahalle		
		490+331.80-491+600		Yukarıçobanisa	Mahalle	6	
		494+200-501+056.27	Şehzadeler	Şehitler	Mahalle		
		506+331-507+916		2. Anafartalar	Mahalle		
		507+916-508+170		Kuşlubahçe	Mahalle		
		508+170-508+624		Horozköy	Mahalle		
		508+624-514+607		Evronos	Mahalle		
		521+724- 522.679		Muradiye	Mahalle		
		522.679- 526+838		Karaali	Mahalle	8	
		526+838-528+489		Gürle	Mahalle		
		528+489-529+527		Akgedik	Mahalle		
		529+527-530+162		Uzunburun	Mahalle		
		530+162.55 - 530+861.88		Şamar	Mahalle		
		531+517-533+200					

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

**KONTROLLÜ
KOPYA****PAYDAŞ KATILIM PLANI**

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	87 / 103

	İzmir	533+200-536+200	Menemen	Telekler	Mahalle			
		536+200-539+100		Süleymanlı	Mahalle			
		540+000.00 - 542+091.09		Emialem Değirmendere	Mahalle			
		544+790-547+466		Yahselli	Mahalle			
		547+466-547+648		Esatpaşa	Mahalle			
		547+648-547+687		Kasımpaşa	Mahalle			
Total						207	207	207

Ek B İnşaat Çalışmaları Öncesi Etkilenen Yerleşim Yerlerinde Yapılmış Proje Bilgilendirme Toplantıları**Tablo 24.** Paydaş Katılım Bilgilendirme Toplantıları

İL	İLÇE	TOPLANTI SAYISI	BÖLGE
AFYON	Bayat	5	2
	Beyyazı	2	2
	Çayırbağ	1	2
	Düzağaç	3	2
	Emirdağ	18	1
	Fethibey	4	2
	Gebeceler	5	2
	Güney	1	2
	İscehisar	1	2
	Merkez	10	2
	Seydiler	3	1
	Sinanpaşa	7	2

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	88 / 103

**KONTROLLÜ
KOPYA**

	Susuz	3	2
ANKARA	Polatlı	4	1
	Günyüzü	6	1
ESKİŞEHİR	Sivrihisar	8	1
KÜTAHYA	Dumlupınar	4	2
UŞAK	Banaz	1	2
Genel Toplam		85	

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,

kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	89 / 103

Ek C Örnek Toplantı Kayıt Formu

	T.C ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
	ANKARA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIM İŞİ PROJESİ			
TOPLANTI KATILIM FORMU				
PROJE ADI	Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi			
TOPLANTI KONUSU				
TOPLANTI YERİ				
EĞİTİM TARİHİ ve SAATİ				
TOPLANTI NO				
KATILIMCILAR				
SIRA NO	TARİH	ADI SOYADI	BÖLÜM/UNVAN	İMZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ANİYHT-FR-YS-003_00

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	90 / 103

Ek D Paydaş İstişare Kayıt Formu

	ANKARA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN YAPIMI PROJESİ ANKARA-İZMİR HIGH SPEED RAILWAY PROJECT	
	CONSULTATION FORM/İSTİŞARE KAYIT FORMU	
Formu Dolduran Kişi / Person filling out the form		Tarih / Date:
Toplantı Gündemi / Agenda of the Meeting		Görüşme Kayıt No/Consultation Register Number
1 - TOPLANTI BİLGİLERİ / 1 - MEETING INFO		
Kurum Yetkilisinin Adı / Name of Authorized Person:		İletişim Şekli / Form of Communication :
İstişare Edilen Kurum / Institution Consulted		☐ Telefon-Ücretsiz Hat / Phone-Free Phone Line
Telefon / Telephone:		☐ İstişare Toplantısı / Consultation Meeting
Adres / Address:		☐ Website / E-mail Web Sitesi / E-posta
Köy - İlçe - İl / Village - District - Province:		☐ Diğer (Açıklayın) / Other (Specify)
Paydaş Tipi / Consultee/Stakeholder Type		
☐ Authority Kamu Kurumu	☐ Business Association İş / Ticaret Birlikleri	☐ Chamber Ticaret / Sanayi Odası
☐ Interest Group İlgili Grupları	☐ Industry Association Sanayi Birlikleri	☐ Labour Union İşçi Sendikası
☐ NGO STK	☐ Media Medya	☐ PAP PEB
☐ University Üniversite		
2 - İSTİŞARE DETAYLARI / 2 - DETAILS OF CONSULTATION		
Projeyle İlgili Sorular / Questions regarding the project :		
Özel Notlar (Formu dolduran kişinin düşünceleri)		

ANİYHT-FR-ÇEV-003_00

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.
Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda,
kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	91 / 103

Ek E Dış Paydaş Şikayet ve Geri Bildirim Formu

			
DIŞ PAYDAŞ ŞİKAYET FORMU			
Doküman No:	ANİYHT-FR-ÇEV-004	Yayın Tarihi:	10.09.2022
Durum:	Çıktı alındığında kontrolsüzdür.	Rev. No / Tarihi:	01 / 10.01.2023
		Sayfa:	1 / 2
ANKARA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI (YHT) PROJESİ			
			
DIŞ ŞİKAYET VE GERİ BİLDİRİM KAYIT FORMU			
Referans No:			
Adı Soyadı *			
Tarih:			
İmza:			
İletişim Bilgileri *		☐ Telefonla:	
Lütfen sizinle nasıl iletişim kurulmasını istediğinizi işaretleyin (posta, telefon, e-posta).		☐ E-posta / ☐ Postayla: Lütfen posta adresinizi yazın:	
* İsteğe bağlı – bir şikâyet isimsiz olarak kaydedilirse yanıt verilmez.			
Gizli	☐ Evet ☐ Hayır		
Şikâyet/Geri Bildirim ne şekilde kaydedildi (lütfen uygun olanı seçin):			
☐ Bizzat			
☐ Telefonla			
☐ Bilgilendirme toplantısında			
☐ Şikâyet kutuları aracılığıyla			
☐ Posta ile			
☐ E-posta ile			
☐ Diğer (lütfen açıklayın) _____			
Projeye ilişkin ilk şikâyetiniz mi?		☐ ____ kez gerçekleşti:	
☐ Evet ☐ Hayır		(Kaç kez gerçekleştiğini yazın)	
Devam ediyor		(Halen yaşanan problem ise)	
Şikâyetin/Olayın Açıklaması		*Şikâyetinizi kaydedeceğimizi ve 30 iş gün içinde yanıt vereceğimizi belirtmek isteriz.	
(Lütfen neler olduğunu, nerede olduğunu, kimin başına geldiğini/kimlerin etkilendiğini yazın, problemin ne gibi sonuçlar doğurduğunu belirtin.)			
Şikâyet/Geri Bildirim Sahibi Tarafından Önerilen/Talep Edilen Çözüm/Aksiyon			
(Lütfen şikâyeti / sorunu çözmek için neler yapılmasını istediğinizi açıklayın.)			
Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir. Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.			

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	92 / 103

ANKARA İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIMI ANKARA-İZMİR YHT YAPIMI İŞ ORTAKLIĞI AYEM Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü			
DIŞ PAYDAŞ ŞİKAYET FORMU			
Doküman No:	ANİYHT-FR-ÇEV-004	Yayın Tarihi:	10.09.2022
Durum:	Çıktı alındığında kontrolsüzdür.	Rev. No / Tarihi:	01 / 10.01.2023
		Sayfa:	2 / 2
Takip işlemleri	☐ İşlem gerekiyor	☐ İşlem gerekli değil (lütfen açıklayın) _____	
	İşlemden Sorumlu Taraf	☐ Yüklenici (lütfen departman belirtin) _____	
		☐ Alt yüklenici (lütfen firma ve departman belirtin) _____	
	Durum	☐ Çözüldü -Tarih: _____	
		☐ Devam ediyor	
Şikâyet Kapatılması İçin Alınan Aksiyonlar			
Beklemede / Açıklama			
Sonuç	Adı-Soyadı:		
	İmza:		
	Tarih:		
Bu kısım Proje Ortaklığı personeli tarafından doldurulacaktır	Şikâyeti/Geri Bildirimi Alan Personelin Adı Soyadı		
	Şikâyeti/Geri Bildirimi Kaydeden Personelin Adı Soyadı		
	Şikâyeti/Geri Bildirimi Proje Veri Tabanına Kaydedilme Tarihi		
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kalan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.			
Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir. Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.			

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	93 / 103

Ek F Çalışan (İç Paydaş) Şikayet ve Geri Bildirim Kapatma Formu

ANKARA İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIMI				ANKARA-İZMİR YHT YAPIMI İŞ ORTAKLIĞI		AYEM Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	
İÇ PAYDAŞ ŞİKAYET FORMU							
Doküman No:		ANİYHT-FR-ÇEV-005		Yayın Tarihi:		10.09.2022	
Durum:		Çıktı alındığında kontrolsüzdür.		Rev. No / Tarihi:		01 / 10.01.2023	
				Sayfa:		1 / 2	
ANKARA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI (YHT) PROJESİ							
ERG İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		International Group		SSB AG			
İÇ ŞİKAYET VE GERİ BİLDİRİM KAYIT FORMU							
Referans No:							
Adı Soyadı *							
Tarih:							
İmza:							
İletişim Bilgileri *				☐ Telefonla:			
Lütfen sizinle nasıl iletişim kurulmasını istediğinizi işaretleyin (posta, telefon, e-posta).				☐ E-posta / ☐ Postayla: Lütfen posta adresinizi yazın:			
* İsteğe bağlı – bir şikâyet isimsiz olarak kaydedilirse yanıt verilmez.							
Gizli				☐ Evet ☐ Hayır			
Şikâyet/Geri Bildirim ne şekilde kaydedildi (lütfen uygun olanı seçin):							
☐ Bizzat				☐ Posta ile			
☐ Telefonla				☐ E-posta ile			
☐ Bilgilendirme toplantısında				☐ Diğer (lütfen açıklayın) _____			
☐ Şikâyet kutuları aracılığıyla							
Projeyle ilişkin ilk şikâyetiniz mi?				☐ ____ kez gerçekleşti:		☐ Devam ediyor	
☐ Evet ☐ Hayır				(Kaç kez gerçekleştiğini yazın)		(Halen yaşanan problem ise)	
Şikâyetin/Olayın Açıklaması (Lütfen neler olduğunu, nerede olduğunu, kimin başına geldiğini/kimlerin etkilendiğini yazın, problemin ne gibi sonuçlar doğurduğunu belirtin.)				*Şikâyetinizi kaydedeceğimizi ve 30 iş gün içinde yanıt vereceğimizi belirtmek isteriz.			
Şikâyet/Geri Bildirim Sahibi Taraftan Önerilen/Talep Edilen Çözüm/Aksiyon (Lütfen şikâyeti / sorunu çözmek için neler yapılmasını istediğinizi açıklayın.)							
Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir. Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.							

KONTROLLÜ
KOPYA

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	94 / 103

ANKARA İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIMI ANKARA-İZMİR YHT YAPIMI İŞ ORTAKLIĞI AYEM Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü			
İÇ PAYDAŞ ŞİKAYET FORMU			
Doküman No:	ANİYHT-FR-ÇEV-005	Yayın Tarihi:	10.09.2022
Durum:	Çıktı alındığında kontrolsüzdür.	Rev. No / Tarihi:	01 / 10.01.2023
		Sayfa:	2 / 2
Takip İşlemleri	☐ İşlem gerekiyor	☐ İşlem gerekli değil (lütfen açıklayın) _____	
	İşlemden Sorumlu Taraf	☐ Yüklenici (lütfen departman belirtin) _____	
		☐ Alt yüklenici (lütfen firma ve departman belirtin) _____	
		☐ Diğer taraflar (lütfen belirtin) _____	
Durum		☐ Çözüldü -Tarih: _____	
		☐ Devam ediyor	
Şikâyetin Kapatılması İçin Alınan Aksiyonlar			
Beklemede / Açıklama			
Sonuç	Adı-Soyadı: İmza: Tarih:		
Bu kısım Proje Ortaklığı personeli tarafından doldurulacaktır	Şikâyeti/Geri Bildirimi Alan Personelin Adı Soyadı		
	Şikâyeti/Geri Bildirimi Kaydeden Personelin Adı Soyadı		
	Şikâyeti/Geri Bildirimi Proje Veri Tabanına Kaydedilme Tarihi		
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kalan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.			
Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir. Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.			

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.


Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	95 / 103

Ek G Talep Yönetim Adımları

TALEP YÖNETİM ŞEMASI

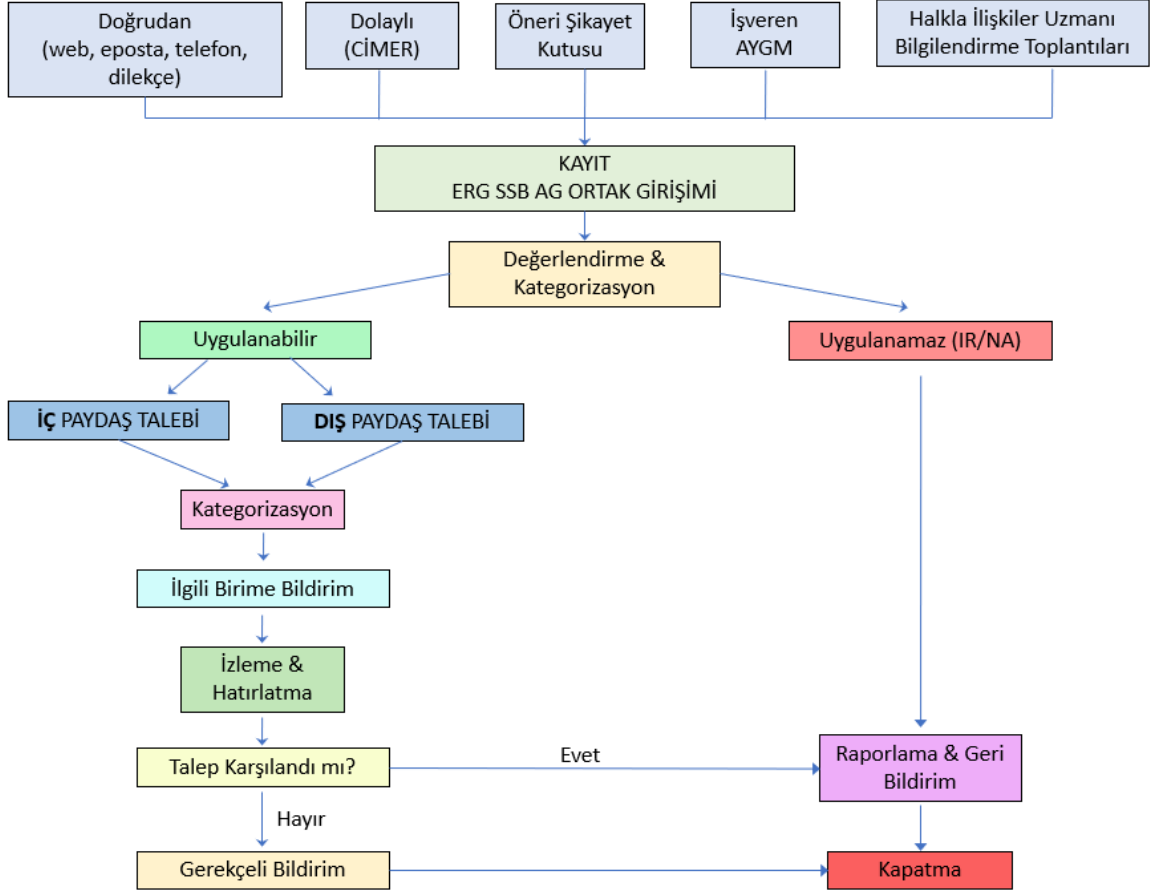

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.


Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	96 / 103

Ek G1 İç Paydaş Talep Yönetim Adımları

İÇ PAYDAŞ TALEP YÖNETİM ŞEMASI

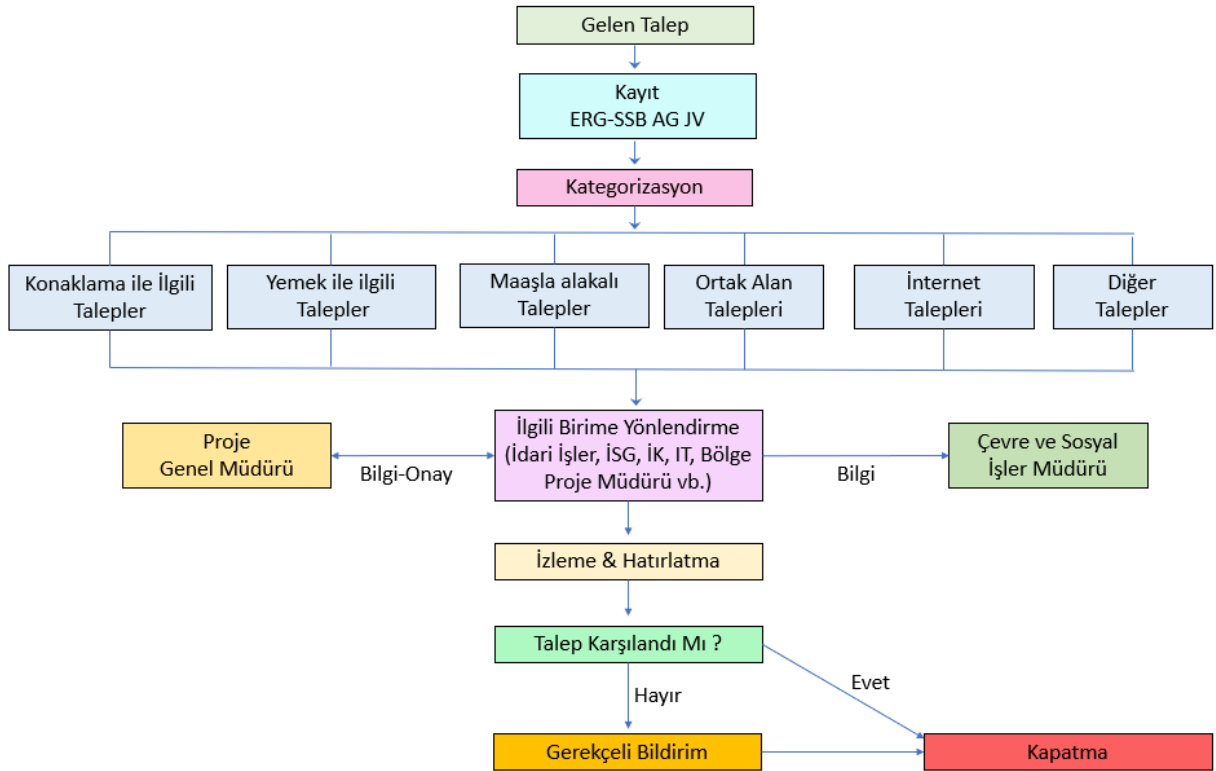

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.


Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	97 / 103

Ek G2 Dış Paydaş Talep Yönetim Adımları

DIŞ PAYDAŞ TALEP YÖNETİM ŞEMASI

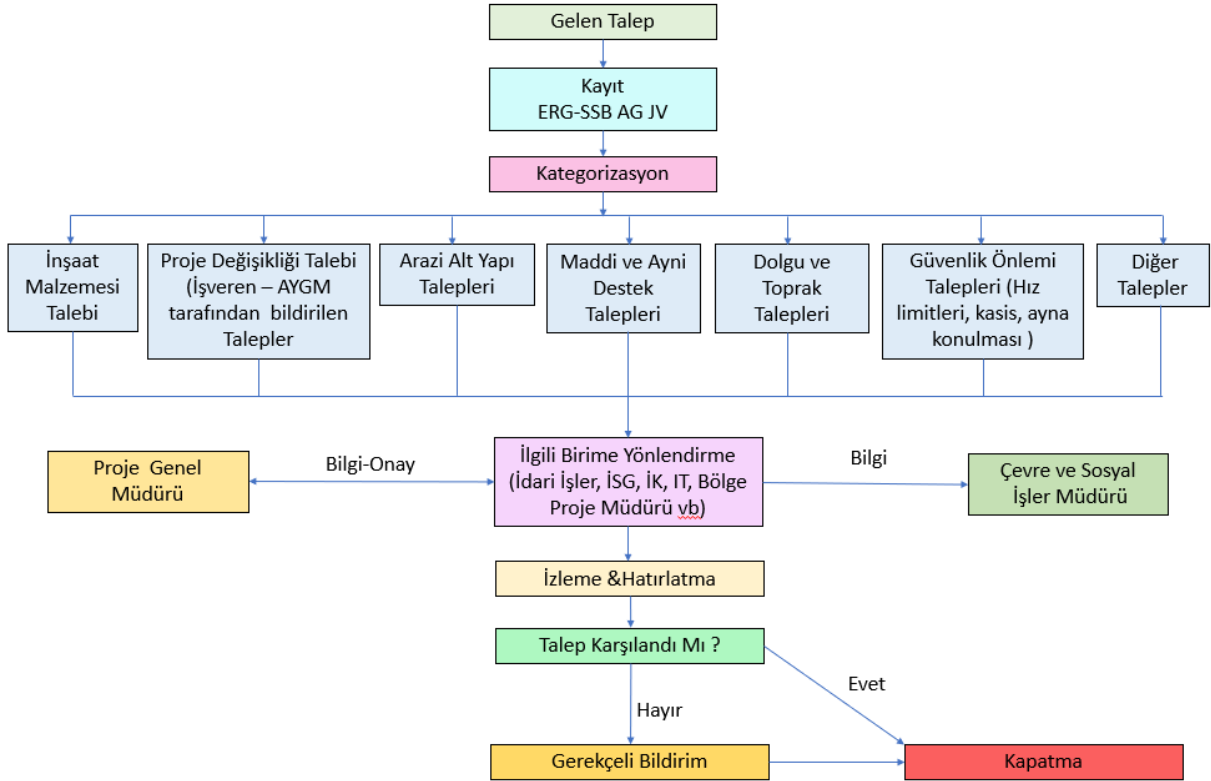

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	98 / 103

Ek H Şikayet veGeri Bildirim Kayıt Tablosu

[illegible]

**KONTROLLÜ
KOPYA**

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	99 / 103

Ek İ Proje Bilgilendirme Broşürü

Proje boyunca halkın ve çevrenin en az şekilde zarar görmesi adına çalışmalar ekipler tarafından titizlikle yürütülecektir. Projede yapılan çalışmalarda karşılaştığınız sorunlar, her türlü şikayet ve önerileriniz için ulaşabileceğiniz farklı kanallar bulunmaktadır.

Proje internet sitesi

ankaraizmiryht.com
iletisim@ankaraizmiryht.com

Telefon

+90 312 499 50 80 / 407

**Proje Süresince sizlerle irtibat
 kuracak Halkla İlişkiler
 Uzmanları aracılığıyla**

**Dilek ve Şikayet Kutuları ve
 Formları aracılığıyla**

ANKARA İZMİR
 YÜKSEK HIZLI TREN HATTI YAPIMI

SSB AG

ANKARA-İZMİR
 YHT YAPIMI İŞ ORTAKLIĞI


Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AIYHT), T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin Başkenti Ankara'yı nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'e bağlayacak önemli bir projedir.

Ana hat 547 kilometre uzunluğunda olan hızlı tren hattı Ankara Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçmektedir.

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.
Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **“KONTROLLÜ KOPYA”** ifadesinin olmaması durumunda,
kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmalıdır.
Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	100 / 103

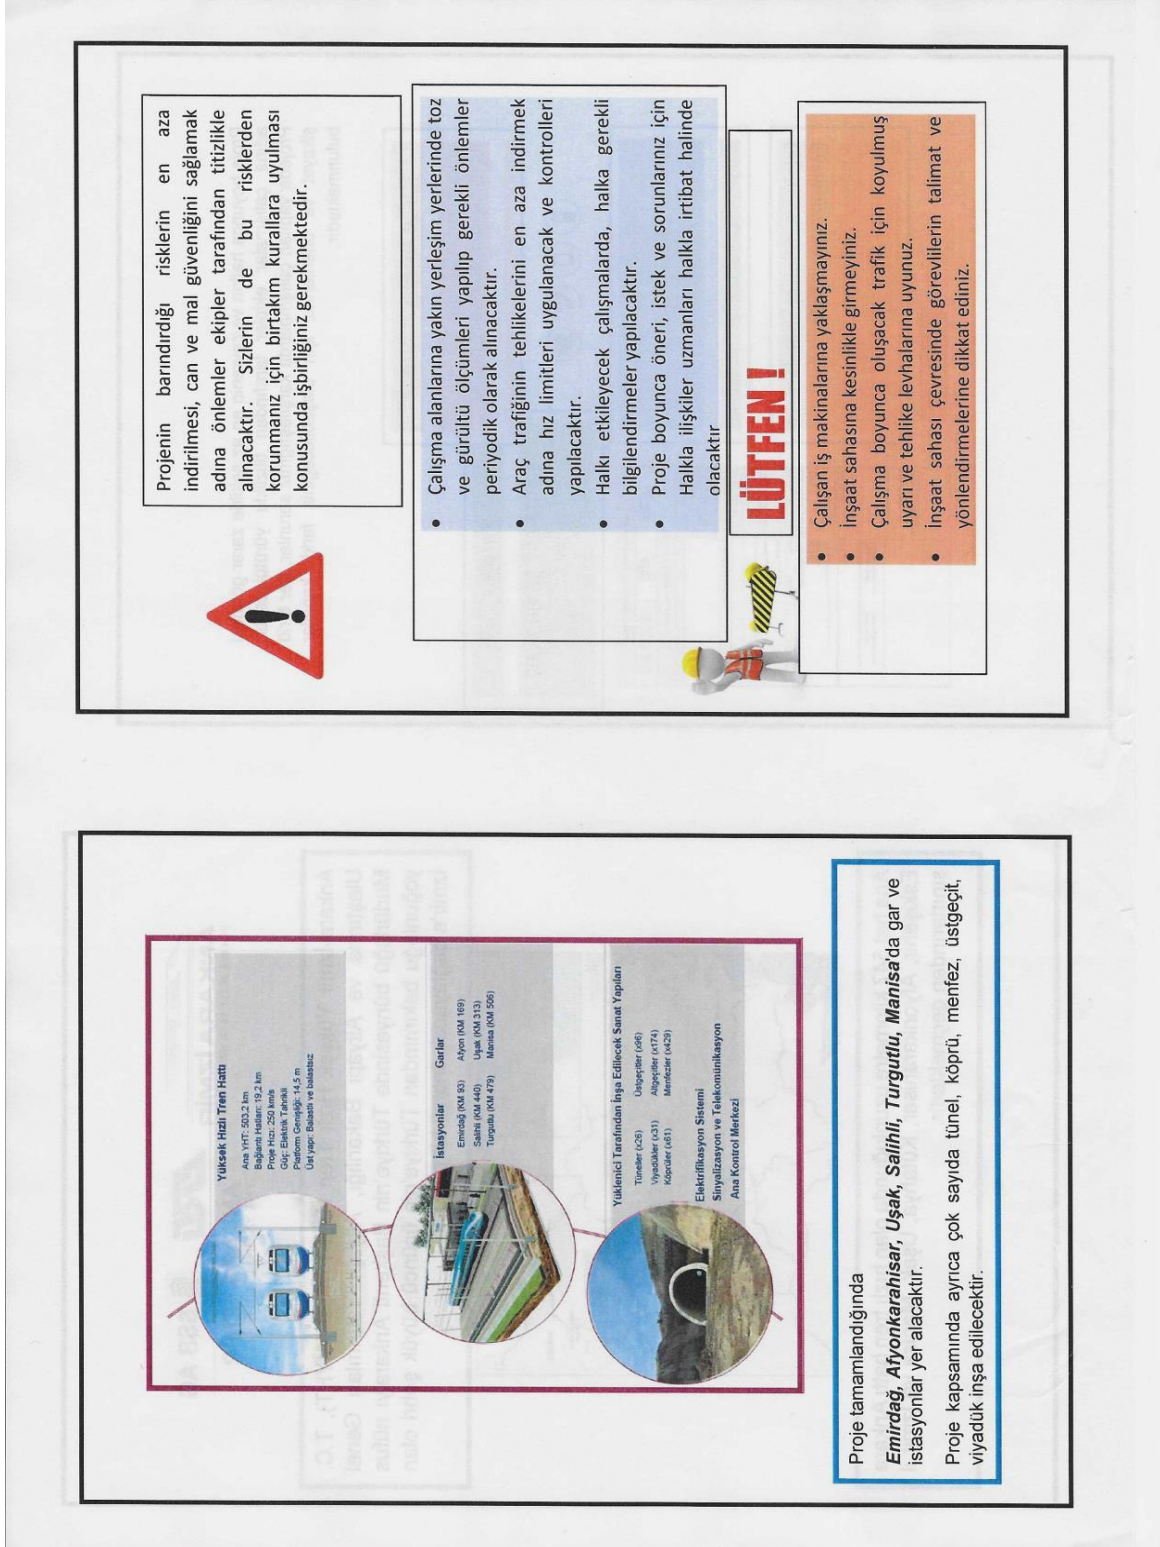


Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.
Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli **"KONTROLLÜ KOPYA"** ifadesinin olmaması durumunda,
kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	101 / 103

Ek J Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Fotoğrafları ve Şikayet Mekanizması Bilgilendirme Afiş Asılması

22.04.2022 Kurtşeyh Mahallesi - Sivrihisar / Eskişehir

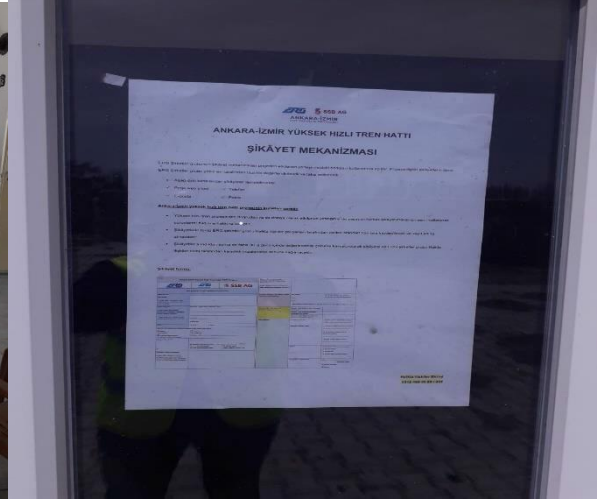

08.04.2022 Akcin Mahallesi - Merkez / Afyon



**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.
Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "**KONTROLLÜ KOPYA**" ifadesinin olmaması durumunda,
kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	102 / 103

EK K Fotoğraflar ve HİU'ların İletişim Bilgilerinin Duyurulması/Şikayet Süreci Bilgi Posterleri

Fotoğraf/Şekil	Açıklama
1.Bölge HİU İletişim Bilgilerini ve Proje Şikayet Sürecini Gösterir Afiş	Bilgilendirme Afişi
2.Bölge HİU İletişim Bilgilerini ve Proje Şikayet Sürecini Gösterir Afiş	Bilgilendirme Afişi

**KONTROLLÜ
KOPYA**

Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli "KONTROLLÜ KOPYA" ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

PAYDAŞ KATILIM PLANI

Doküman No:	ANİYHT-PL-ÇEV-014	Yayın Tarihi:	20.06.2022
Durum:	Çıktı Alındığında Kontrolsüzdür	Rev. No / Tarihi:	06 / 13.03.2023
		Sayfa:	103 / 103

3.Bölge HİU İletişim Bilgilerini ve Proje Şikayet Sürecini Gösterir Afiş



Bilgilendirme Afişi



5.Bölge HİU İletişim Bilgilerini ve Proje Şikayet Sürecini Gösterir Afiş



Bilgilendirme Afişi



Bu dokümanın elektronik ortamda Yönetim Sistemleri dokümanları için tanımlanan bölümdeki hali, güncel ve geçerlidir.

Basılı kopyaların üzerinde kırmızı renkli “**KONTROLLÜ KOPYA**” ifadesinin olmaması durumunda, kopyaların güncel ve geçerli olduğuna dair yeterli güvencenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu dokümanın Ankara-İzmir YHT Yapımı İş Ortaklığı izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.
